# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----000-----



# <u>BÁO CÁO ĐÔ ÁN MÔN HỌC</u> QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IS208.J12)

## TÊN DỰ ÁN

# CP001 - TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ WILL COFFEE

Phạm vi áp dụng: Will Coffee

Phiên bản: 1.0

Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Đức Huy

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 10

1. Đinh Minh Chí - 15520063

2. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh - 15520196

Công Ty Phần mềm VNSoft TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2018

#### LÒI CẨM ƠN

Trong suốt quá trình học môn *Quản lý dự án Công nghệ Thông tin* và hoàn thành đồ án môn học, nhóm em đã nhận được nhiều kiến thức hay và góp ý từ Thầy *Huỳnh Đức Huy*. Thầy đã cung cấp những kiến thức cần thiết cũng như hướng dẫn cho nhóm em cách tìm hiểu, nghiên cứu đề án đã đăng ký để nhóm có thể hoàn thành đồ án môn học. Bên cạnh việc vận dụng những kiến thức được học trên lớp đồng thời kết hợp với việc học hỏi và tìm hiểu những kiến thức mới. Từ đó, nhóm đã vận dụng tối đa những gì đã tiếp thu được để hoàn thành một báo cáo đồ án tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không tránh khỏi những thiếu sót. Dó đó, nhóm chúng em rất mong nhận được những sự góp ý của Thầy nhằm giúp nhóm hoàn thiện những kiến thức đã học tập và cũng là hành trang để nhóm thực hiện tiếp các đề án khác trong tương lai. Nhóm chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Thầy cùng với những kiến thức mà Thầy đã truyền đạt cho chúng em trong thời gian qua!

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2018 NHÓM THỰC HIÊN

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

| <br>                               |
|------------------------------------|
| <br>                               |
| TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 |
| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN               |

# MỤC LỤC

| 1 Giới thiệu   | 8  |
|--|----|
| 1.1 Từ ngữ viết tắt và thuật ngữ                       | 8  |
| 1.2 Tham khảo  |    |
| 1.3 Tổng quan dự án                                    |    |
| 1.3.1Tên dự án   | 9  |
| 1.3.2Người quản lý dự án                               | 9  |
| 1.3.3Danh sách tổ dự án                                | 10 |
| 1.3.4Lý do thực hiện dự án                             | 10 |
| 1.3.5Tổng chi phí đầu tư                               | 10 |
| 1.4 Phạm vi, mục tiêu dự án                            | 10 |
| 1.4.1Xác định phạm vi, mục tiêu của dự án              | 10 |
| 1.4.2Các yếu tố không thuộc phạm vi của dự án          | 11 |
| 1.4.3Các tính chất và yêu cầu của dự án                | 12 |
| 1.5 Các bên liên quan và nhân sự chính                 | 19 |
| 1.6 Điều phối dự án                                    |    |
| 2 Tổ chức dự án  | 22 |
| 2.1 Mô hình phát triển phần mềm                        | 22 |
| 2.2 Cơ cấu tổ chức dự án                               |    |
| 2.2.1  |    |
| 2.2.2Vai trò và trách nhiệm                            |    |
| 3 Quản lý dự án  | 24 |
| 3.1 Giả định, điều kiện, rủi ro                        | 24 |
| 3.1.1  |    |
| 3.1.2Các hạn chế                                       |    |
| 3.1.3Chi phí dự kiến                                   |    |
| 3.2 Khởi tạo dự án                                     |    |
| 3.2.1  |    |
| 3.2.2Yêu cầu nguồn lực                                 | 29 |
| 3.2.3Yêu cầu đào tạo nhân sự dự án (nếu có)            | 31 |
| 3.3 Kế hoạch thực hiện dự án                           | 31 |
| 3.3.1Phân rã công việc (WBS)                           |    |
| 3.3.2Lập lịch làm việc                                 | 35 |
| 3.3.3Các cột mốc (milestone) và các work product chính | 36 |
| 3.3.4Lập kế hoạch                                      | 37 |
| 3.3.5Phân tích yêu cầu                                 | 46 |

| 3.4 Kế hoạch kiểm soát dự án  |            |
|---|------------|
| 3.4.1Kiểm soát kế hoạch thực hiện   |            |
| 3.4.2Kế hoạch quản lý yêu cầu   |            |
| 3.4.3Kế hoạch quản lý quy trình phát triển phần mềm                               | 72         |
| 3.4.4Kiểm tra chất lượng sản phẩm   | 78         |
| 3.4.5Báo cáo dự án  | 81         |
| 3.5 Kế hoạch quản lý rủi ro   |            |
| 3.5.2Lập biểu phân tích rủi ro của dự án  | 82         |
| 3.6Kế hoạch chọn lựa giải pháp  |            |
| 3.6.2Các lựa chọn phương án   | 92         |
| 3.7Kế hoạch quản lý cấu hình (CM)Quy địnhQuy định                                 |            |
| 3.7.2Xác định cấu hình  | 93         |
| 3.7.3Cấu hình sản phẩm (baseline)   | 93         |
| 3.7.4Lưu trữ cấu hình   | 94         |
| 3.7.5Quyền truy xuất  | 94         |
| 3.8Kế hoạch quản lý dữ liệu   | 95         |
| 3.11 Kế hoạch kết thúc dự án  | 98         |
| 3.11.1Kế hoạch hỗ trợ dự án: hỗ trợ UAT, hỗ trợ sau golive                        | 98         |
| 3.11.2Kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật theo khoảng thời gian bảo hành được ghi hợp đồng98 | nhận trong |
| 3.11.3Kế hoạch bảo trì sau khi đóng dự án   | 98         |
| 3.11.4Giao diện chương trình  | 99         |
| 3.11.5Tổng kết dự án  | 103        |
| 3.11.6Úu điểm của dự án   | 104        |
| 3.11.7Nhược điểm của dự án  | 105        |
| 3.11.8Bài học kinh nghiệm   | 105        |
| 3.11.9Kết luận  | 105        |
| 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO  | 106        |

# Quản lý tài liệu

| Ngày tạo: 26/10/2018               | Thời gian lưu: 12/27/2018 5:17:39 PM |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Phòng ban/Bộ phận: Project Manager | Lưu bởi: Đinh Minh Chí               |

# Lịch sử thay đổi

| Người thực hiện | Ngày thực hiện Nội dung |                                 | Phiên |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-------|
|                 |                         |                                 | bản   |
| Đinh Minh Chí   | 26/10/2018              | Tạo tài liệu, cập nhật phần xác | 1.0.0 |
|                 |                         | định mục tiêu và phạm vi.       |       |
| Dương Huỳnh     | 27/10/2018              | Cập nhật phần Lập bảng mô tả    | 1.0.1 |
| Mỹ Hạnh         |                         | công việc.                      |       |
| Đinh Minh Chí   | 28/12/2018 đến          | Cập nhật phần Lập đề cương      | 1.0.2 |
|                 | 29/12/2018              | và kế hoạch chi tiết.           |       |
| Đinh Minh Chí + | 30/10/2018 đến          | Cập nhật phần Phân tích và xác  | 1.0.3 |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 09/11/2018              | định yêu cầu, lập kế hoạch      |       |
| Hạnh            |                         | thực hiện, viết báo cáo.        |       |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 10/11/2018 đến          | Thiết kế logic.                 | 1.0.4 |
| Hạnh            | 11/11/2018              |                                 |       |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 12/11/2018              | Cập nhật phần Thiết kế giao     | 1.0.5 |
| Hạnh            |                         | diện và trang chủ.              |       |
| Đinh Minh Chí   | 13/11/2018              | Cập nhật phần Thiết kế chức     | 1.0.6 |
|                 |                         | năng tìm tên đồ uống, tạo       |       |
|                 |                         | phiếu nhập kho, thêm đồ uống.   |       |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 14/11/2018 đến          | Cập nhật phần chức năng: tạo    | 1.0.7 |
| Hạnh            | 17/11/2018              | phiếu xuất kho, cập nhật và in  |       |
|                 |                         | bảng giá, lập báo cáo, xem      |       |
|                 |                         | thông tin khách hàng, xem chi   |       |

|                 |                | tiết đơn hàng, quản lý tồn kho, |        |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--------|
|                 |                | quản lý nhà cung cấp.           |        |
| Đinh Minh Chí + | 19/11/2018     | Cập nhật phần lập báo cáo thiết | 1.0.8  |
| Dương Huỳnh Mỹ  |                | kế.                             |        |
| Hạnh            |                |                                 |        |
| Đinh Minh Chí   | 20/11/2018 đến | Cập nhật phần Thiết kế cơ sở    | 1.0.9  |
|                 | 24/11/2018     | dữ liệu: tạo sơ đồ lớp, tạo các |        |
|                 |                | bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD,   |        |
|                 |                | tạo các ràng buộc, lập báo cáo  |        |
|                 |                | về CSDL.                        |        |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 25/11/2018 đến | Cập nhật phần Lập trình: cài    | 1.0.10 |
| Hạnh            | 01/12/2018     | đặt môi trường, quản trị hệ     |        |
|                 |                | thống nhân viên, khách hàng.    |        |
| Đinh Minh Chí + | 02/12/2018 đến | Cập nhật phần Lập trình: xử lý  | 1.0.11 |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 11/12/2018     | chức năng tìm tên đồ uống, tạo  |        |
| Hạnh            |                | phiếu nhập kho, thêm đồ uống,   |        |
|                 |                | tạo phiếu xuất kho, lập báo     |        |
|                 |                | cáo, xem thông tin khách hàng   |        |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 12/12/2018 đến | Cập nhật phần kiểm thử          | 1.0.12 |
| Hạnh            | 19/12/2018     |                                 |        |
| Đinh Minh Chí + | 20/12/2018 đến | Cập nhật phần nghiệm thu        | 1.0.13 |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 24/12/2018     |                                 |        |
| Hạnh            |                |                                 |        |
| Đinh Minh Chí   | 25/12/2018 đến | Cập nhật phần chuyển giao +     | 1.0.14 |
|                 | 27/12/2018     | bảo trì                         |        |
| Đinh Minh Chí + | 27/12/2018     | Cập nhật phần hỗ trợ            | 1.0.15 |
| Dương Huỳnh Mỹ  |                |                                 |        |
| Hạnh            |                |                                 |        |

# Lịch sử kiểm tra

| Người kiểm tra  | Ngày kiểm tra | Nhận xét/đánh giá             | Phiên bản |
|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| Dương Huỳnh     | 14/12/2018    | Hồ sơ sơ bộ hoàn thiện        | 1.0.0     |
| Mỹ Hạnh         |               |                               |           |
| Đinh Minh Chí   | 14/12/2018    | Báo cáo các quá trình đầy đủ  | 1.0.1     |
| Dương Huỳnh     | 26/12/2018    | Tài liệu đầy đủ và hoàn thiện | 1.0.14    |
| Mỹ Hạnh         |               |                               |           |
| Đinh Minh Chí + | 27/12/2018    | Kiểm tra trước khi bàn giao.  | 1.0.15    |
| Dương Huỳnh Mỹ  |               |                               |           |
| Hạnh            |               |                               |           |

#### 1 Giới thiệu

Báo cáo giới thiệu tổng quan về dự án, phạm vi, mục tiêu, cách tổ chức và quản lý dự án của cửa hàng cà phê Will Coffee, về hệ thống quản lý bán hàng, quản lý nhân viên cũng như hệ thống quản lý khách hàng, quản lý món ăn và quản lý nguyên liệu. Với mục đích cung cấp đầy đủ, giải thích chi tiết các chức năng có trong hệ thống cùng với các phần mềm, công cụ hỗ trợ mà nhóm đã sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, cũng như kế hoạch chi tiết, các bước cần làm để hoàn thành một hệ thống quản lý quán cà phê theo đúng yêu cầu của cửa hàng.

Ngoài ra, còn có một số thuật ngữ viết tắt, các tài liệu mà nhóm đã tham khảo để có thể hoàn thành dự án này một cách tốt nhất.

Chú ý: Tài liệu này chỉ được phép lưu hành nội bộ.

## 1.1 Từ ngữ viết tắt và thuật ngữ

| Từ viết  | Diễn giải   |
|----------|---|
| tắt      |   |
| PM       | Project Manager – Trưởng dự án  |
| Work     | Tất cả các tài liệu/source của dự án như tài liệu yêu cầu người dùng, tài |
| Products | liệu kỹ thuật, source code, hướng dẫn sử dụng                             |
| KH       | Customer – Khách hàng   |
| NV       | Nhân viên   |
| QLDA     | Quản lý dự án   |
| CM       | Quản lý cấu hình  |
| DB       | Database – Cơ sở dữ liệu  |
| QC       | Quality Control – Kiểm soát chất lượng                                    |
| BA       | Business Analyst – Chuyên viên phân tích                                  |
| SoW      | Statement of Work   |
| WBS      | Work Breakdown Statement  |
| Baseline | Cấu hình sản phẩm   |

#### 1.2 Tham khảo

| STT | Mô tả                                  | Tên tài liệu |
|-----|--|--------------|
| 1   | Tài liệu đề xuất dự án                 |              |
| 2   | Mẫu phiếu nhập nguyên liệu.            |              |
| 3   | Mẫu phiếu chi.                         |              |
| 4   | Mẫu hóa đơn bán lẻ.                    |              |
| 5   | Mẫu đơn đặt hàng.                      |              |
| 6   | Mẫu phiếu giao hàng.                   |              |
| 7   | Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo     |              |
|     | tháng.                                 |              |
| 8   | Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo     |              |
|     | quý.                                   |              |
| 9   | Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo     |              |
|     | năm.                                   |              |
| 10  | Một số tài liệu liên quan đến sản phẩm |              |
|     | của dự án như: Tài liệu thiết kế, mã   |              |
|     | nguồn phần mềm, phần cứng.             |              |

## 1.3 Tổng quan dự án

## 1.3.1 Tên dự án

# CP001 - TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ WILL COFFEE

- Chuyên pha chế, phục vụ thức uống, cà phê, trà và một số loại thức ăn nhẹ.

## 1.3.2 Người quản lý dự án

Trưởng dự án: Đinh Minh Chí

### 1.3.3 Danh sách tổ dự án

Tổ dự án gồm những thành viên sau:

- 1. Đinh Minh Chí (PM)
- 2. Trần Hoàng Luân (BA)
- 3. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh (Lập trình viên)
- 4. Huỳnh Thanh Nhàn (Lập trình viên)
- 5. Nguyễn Văn Duy (Tester 1 năm kinh nghiệm)

## 1.3.4 Lý do thực hiện dự án

Dự án nhằm tin học hóa một hệ thống quản lý quán cà phê cho cửa hàng cà phê Will Coffee, nhằm nâng cao chất lượng quản lý toàn diện của cửa hàng, qua đó có thể vận hành một cách hiệu quả về quy trình mua nguyên vật liệu, qui trình bán hàng cho khách hàng cũng như về các nghiệp vụ về thu ngân, kế toán, pha chế. Việc tin học hóa các quy trình quản lý quán giúp mọi thứ chính xác, nhanh chóng và đảm bảo hơn. Không cần phải nhập liệu và lưu trữ trên văn bản giấy dễ thất lạc. Đồng thời giúp việc quản lý nhân viên một cách hiệu quả hơn. Nhờ thế, có thể giúp quán cà phê đạt hiệu quả cao nhất trong việc kinh doanh cũng như tạo lòng tin nơi khách hàng.

## 1.3.5 Tổng chi phí đầu tư

- Chi phí dự kiến: 125000000 VND (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Chi phí tối đa: 135000000 VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

## 1.4 Phạm vi, mục tiêu dự án

## 1.4.1 Xác định phạm vi, mục tiêu của dự án

## 1.4.1.1 Phạm vi của dự án

Dựa trên những dữ liệu khảo sát đã thu được tại cửa hàng Will Coffee để phân tích, xác định yêu cầu người dùng, thiết kế và lên kế hoạch phát triển hệ thống. Các quy trình nghiệp vụ bên ngoài từ quán cà phê Will Coffee sẽ được kết nối và tích hợp vào hệ thống.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ chuyển giao cho quán cà phê Will Coffee, hệ thống chủ yếu tập trung vào các chức năng chính như: quản lý đơn hàng và quản lý nhân viên. Bên cạnh đó, hệ thống còn có các chức năng như quản lý khách hàng, quản lý đồ uống và quản lý nguyên liệu.

- Chức năng quản lý đơn hàng, bao gồm tính toán, lưu trữ và thống kê doanh thu đạt được qua từng tháng.
- Chức năng quản lý nhân viên, bao gồm việc đăng nhập, lưu trữ, sửa đổi thông tin nhân viên và đăng xuất.
- Chức năng quản lý đồ uống, bao gồm thêm/xóa/sửa một đồ uống vào cơ sở dữ liêu.
- Chức năng quản lý thông tin bàn, bao gồm quản lý trạng thái của bàn (trống/có người) và thông tin hóa đơn, quá trình gọi món tại bàn.
- Chức năng phân quyền, bao gồm phân quyền cho quản lý với những tính năng riêng biệt, giúp tối ưu và đảm bảo tính đúng đắn của phần mềm.

### 1.4.1.2 Mục tiêu của dự án

Nhằm xây dựng một hệ thống quản lý quán cà phê cho cửa hàng cà phê Will Coffee, nâng cao chất lượng quản lý toàn diện cho cửa hàng. Thông qua đó, có thể vận hành một cách hiệu quả về quy trình mua nguyên vật liệu, quy trình bán hàng cho khách hàng cũng như các nghiệp vụ về thu ngân, kế toán, pha chế. Đồng thời, giúp cho việc quản lý nhân viên một cách hiệu quả hơn. Nhờ đó, có thể giúp quán cà phê đạt hiệu quả cao nhất trong việc kinh doanh, vận hành, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như xây dựng niềm tin đối với khách hàng.

## 1.4.2 Các yếu tố không thuộc phạm vi của dự án

Hệ thống không chịu trách nhiệm quản lý các thông tin khách hàng, đặt hàng trực tuyến...

## 1.4.3 Các tính chất và yêu cầu của dự án

Phục vụ cho khách hàng ở mọi lứa tuổi cũng như giúp cho các nhân viên của quán cà phê Will Coffee có thể thuận lợi hơn trong công việc.

Thỏa mãn các yêu cầu mà quán đã đặt ra về hệ thống quản lý cũng như các chức năng cơ bản giúp quán cà phê quản lý một cách toàn diện hơn.

Cung cấp đầy đủ các tính năng như: thêm món, đặt hàng, quản lý bán hàng, quản lý nhân viên, quản lý nguyên vật liệu đến việc quản lý thu ngân và thanh toán của khách hàng.

Hệ thống có thể lưu thông tin đơn hàng, thông tin nhân viên, cũng như thực đơn của quán, có thể chỉnh sửa thông tin nhân viên, thực đơn, bàn. Ngoài ra, còn có chức năng đăng nhập, đăng xuất ra khỏi hệ thống.

#### 1.4.3.1 Các ràng buộc

#### a) Thời gian

- Thời gian thực hiện dự án dự kiến: 60 ngày
- Thời gian thực hiện dự án tối đa: 70 ngày
- Thời gian tập huấn sử dụng hệ thống: 6 ngày
- Thời gian sử dụng thử nghiệm hệ thống: 3 ngày
- Thời gian bắt đầu dự án: 26/10/2018.
- Thời gian kết thúc dự án dự kiến: 26/12/2018.

## b) Chi phí

- Chi phí dự kiến: 125000000 VND (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Chi phí tối đa: 135000000 VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn )

## c) Nhân lực

- 1. Đinh Minh Chí (PM)
- 2. Trần Hoàng Luân (BA)
- 3. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh (Lập trình viên 3 năm kinh nghiệm)
- 4. Huỳnh Thanh Nhàn (Lập trình viên 3 năm kinh nghiệm)
- 5. Nguyễn Văn Duy (Tester 1 năm kinh nghiệm)

## d) Thiết bị, công cụ và tiện ích

- Hiện có
  - + 1 Máy chủ
  - + 3 Máy khách
  - + 2 điện thoại
- Tăng cường
  - + 1 Máy đọc mã vạch (Barcode Reader).
  - + 1 Máy in hóa đơn (Bill Printer).

## 1.4.3.2 Tài nguyên sử dụng

## a) Về phía các thành viên

Công cụ làm việc của các thành viên trong nhóm: máy tính cấu hình cao, các phần mềm hỗ trợ có bản quyền đầy đủ.

## Các phần mềm công cụ:

- ✓ Visual Studio 2017 Community
- ✓ SQL Server Express 2014
- ✓ MS Office
- ✓ Trello
- ✓ GitHub

## Môi trường test:

- ✓ Máy tính dùng cho test có cấu hình tương đương với khách hàng
- ✓ Tài liệu các quy trình test, các phần mềm test trên Windows 10
- ✓ Cơ sở dữ liệu dùng SQL server

## b) Về phía quán cà phê Will Coffee

Sử dụng thông tin về quy trình nghiệp vụ của quán cà phê Will Coffee, quá trình hoạt động và công việc của các nhân viên để giúp phân tích và đưa ra các chức năng của hệ thống.

## 1.4.3.3 Tiêu chuẩn thực hiện, cam kết

a) Chi phí: Không vượt quá chi phí tối đa là 135000000 VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

## b) Lịch biểu

Đảm bảo tiến độ theo đúng các mốc thời gian và hạn mức:

- Thời gian giao bản thiết kế: không quá 30 ngày sau ngày bắt đầu dự án.
- Thời gian hoàn tất cài đặt: không quá 45 ngày sau ngày bắt đầu dự án.
- Thời gian hoàn tất dự án: không quá 70 ngày sau ngày bắt đầu dự án.

### c) Chất lượng

#### - Tính tiến hóa:

- + Dễ dàng trong lúc nâng cấp hệ thống hoặc chuyển đổi cơ sở dữ liệu.
- + Dễ dàng nâng cấp thêm tính năng giao hàng, thanh toán trực tuyến.

#### - Tính tiện dụng:

- + Hệ thống có giao diện đơn giản, trực quan, thân thiện và dễ sử dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
  - + Các đặc tả và hướng dẫn sử dụng chi tiết, rõ ràng.

## - Tính hiệu quả:

- + Hệ thống có sự hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự cố.
- + Cơ sở dữ liệu ổn định và đáng tin cậy, dễ sao lưu và bảo mật cao.
- + Hệ thống hoạt động ổn định và đáng tin cậy.

## - Tinh tương thích:

- + Hoạt động tốt với Windows 7, 8, 10.
- + Hoạt động tốt với Microsoft Office 2010 trở lên.
- + Hoạt động tốt với Microsoft SQL 2014.

## d) Yêu cầu chức năng

- Hệ thống sẽ dễ dàng tùy chỉnh, thay đổi các module, có khả năng tích hợp nhiều thành phần.
- Có hiệu quả cao.

- Có tính bảo mật cao.

## e) Yêu cầu phi chức năng

#### - Hiệu năng:

- + Lượng nhân viên truy cập đồng thời lên đến 200 người truy xuất CSDL trung tâm bất cứ lúc nào, và đến 300 người cùng truy xuất các server cục bộ.
- + Hệ thống cho phép truy xuất CSDL danh mục các loại thức uống, món ăn và thông tin khách hàng, nhân viên với độ trễ không quá 4 giây.
  - + Hệ thống có khả năng hoàn tất 80% giao dịch trong vòng 2 phút.

## - Tính sẵn sàng:

- + Hỗ trợ kỹ thuật 24/24h bởi đội ngũ bảo trì sự cố.
- + Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự cố.
- + Khôi phục hệ thống và khắc phục sự cố trong vòng 48 giờ.

## - Tính ổn định:

+ Hệ thống phải hoạt động liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, với thời gian ngừng hoạt động không quá 10%.

### - Bảo mật:

- + Hệ thống có tính bảo mật cao, đảm bảo thông tin khách hàng, các hóa đơn, cũng như quá trình tính toán và thu ngân của kế toán và nhân viên thu ngân. Chỉ có người quản lý mới được phép sửa dữ liệu thông tin của quán.
- + Phần mềm sẽ phân quyền cho các nhân viên rõ ràng. Đi kèm theo đó là kiểm tra thông tin đăng nhập của người dùng. Nhân viên chỉ thao tác được với phần mềm sau khi đăng nhập thành công.
- + Mọi thao tác trên cơ sở dữ liệu khi dùng phần mềm đều được lưu lại trong Log file.

## f) Các module yêu cầu cho phần mềm

- Module quản lý mua hàng.
- Module quản lý bán hàng.
- Module quản lý nhân viên.
- Module quản lý nguyên liệu.

- Module quản lý menu.
- Module thống kê.
- Module quản lý đăng nhập, đăng xuất.

## 1.4.3.4 Nhiệm vụ, quyền lợi

#### \* Khách hàng và người dùng

- Nhiệm vụ:
- Quán có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ thông tin về các quy trình nghiệp vụ, các món trong thực đơn, nguyên liệu, giá thành, cũng như các tài liệu liên quan, hiện trạng và yêu cầu cho nhóm dự án.
- Thanh toán đủ và đúng các mốc thời gian đã hẹn trước.
- Ngoài ra, chính các nhân viên sẽ là người trực tiếp thực hiện quá trình kiểm thử người dùng, trực tiếp sử dụng hệ thống. Vì thế, phía cửa hàng cần phải có các buổi tập huấn cho nhân viên về chuyên môn nhằm giúp cho việc tiếp cận, sử dụng hệ thống được dễ dàng, thuận tiện.

## - Quyền lợi:

- O Được quyền sử dụng hệ thống sau khi dự án hoàn thành.
- o Hệ thống quản lý hóa đơn, phiếu chi nhanh chóng, chính xác và đầy đủ.
- O Quản lý thông tin đăng nhập, thông tin nhân viên đầy đủ và nhanh chóng.
- o Báo cáo và thống kê chính xác, chi tiết, rõ ràng.
- Thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu có độ bảo mật cao, giúp truy xuất, sao lưu và khôi phục dễ dàng, đồng bộ nhanh chóng và đáng tin cậy.
- Giao diện đẹp, thân thiện và phù hợp với yêu cầu của chủ quán cà phê giúp nhân viên quán có thể sử dụng và thao tác dễ dàng.
- Dễ sử dụng với các đối tượng nhân viên: thu ngân, bán hàng, pha chế, phục vụ, kế toán và người quản lý.
- Hệ thống vẫn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của quán trong 3 đến 5 năm tiếp theo.

#### \* Nhóm dự án

#### - Nhiệm vụ:

- Công ty hay đơn vị thực hiện dự án phải chịu trách nhiệm chính về kết quả của dự án, phải đảm bảo xác định đúng mục tiêu, đúng các yêu cầu của phía khách hàng.
- Cần phải đảm bảo đúng tiến độ dự án cũng như đảm bảo sao cho dự án thực hiện hiệu quả và đúng thời hạn mà khách hàng đã yêu cầu.
- Cần đảm bảo quản lý dự án một cách hiệu quả cả về nhân sự, kế hoạch,
   nguồn vốn và thời gian, phải theo dõi sát sao tiến độ của dự án về mọi mặt.
- Cần phải cung cấp các tài liệu hướng dẫn về hệ thống, cách sử dụng để có thể bàn giao đúng cho cửa hàng.
- Oự án sẽ không vượt quá chi phí đã dự trù mà quán và bên công ty đã thỏa thuận, sẽ đúng ngày giao nộp và được đảm bảo đúng hạn các cột mốc và những ngày quan trọng đã báo bên quán, các dịch vụ và những biên bản đặc biệt sẽ được chú trọng.

## - Quyền lợi:

- O Đơn vị thực hiện dự án sẽ được hưởng mọi chế độ chăm sóc cũng như quyền lợi khi làm việc, được cửa hàng đón tiếp và cung cấp thông tin chính xác, hiệu quả cũng như các tài liệu cần thiết để phục vụ dự án.
- O Được thanh toán đủ và đúng theo các mốc thời gian đã hẹn trước.

## 1.4.3.5 Trách nhiệm chính

## ❖ Nhóm dư án:

- O Khảo sát hiện trạng và các yêu cầu của khách hàng.
- Lên kế hoạch và ước lượng chi phí.
- o Lên kế hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên.
- o Thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu.
- O Hiện thực phần mềm.
- Báo cáo tình hình triển khai dự án.

- O Kiểm thử phần mềm.
- O Bàn giao hệ thống hoàn chỉnh cùng các bản đặc tả chi tiết.

#### \* Khách hàng:

- O Cung cấp đầy đủ thông tin về hiện trạng và các yêu cầu cho dự án.
- Cung cấp và huy động đầy đủ các nguồn tài nguyên đúng thời hạn cho nhóm dư án.
- O Thanh toán đầy đủ và đúng hạn thời gian cho nhóm dự án.

### ❖ Người dùng:

- O Đọc và nắm các tài liệu đặc tả hệ thống.
- O Tham gia tập huấn sử dụng hệ thống.

### \* Lập trình viên:

- Lập trình ứng dụng trên nền tảng C# .Net phục vụ các dự án lớn của công ty.
- Quản trị hệ thống mạng windows gồm Active Directory, DHCP,
   DNS, IIS, ISA.

## **❖** BA (Business Analyst):

Vị trí Chuyên viên phân tích nghiệp vụ chịu trách nhiệm phân tích nhu cầu của bên khách hàng là quán cà phê Will Coffee, và các đối tác liên quan để tìm hiểu và đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề phát sinh về việc quản lý thông tin quán. Viết tài liệu phân tích hệ thống.

## \* Tester:

- o Lập Test plan, Test case.
- Thực hiện việc kiểm tra hệ thống xem có lỗi hay không.
- Lập báo cáo các lỗi đã tìm thấy cho lập trình viên khắc phục kịp thời.
- Chịu trách nhiệm lập báo cáo tiến độ công việc, quá trình thực hiện dư án.
- O Tạo các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống.

# **1.4.3.6** Sửa đổi, bổ sung

Bản phát biểu công việc này được chỉnh sửa theo từng thời gian cụ thể, các thay đổi được bổ sung và được chấp nhận. Các sửa đổi bổ sung sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình thực hiện dự án.

#### 1.4.3.7 Chữ ký

Đại diện phía quán cà phê là chủ quán và các thành viên trong nhóm phát triển dự án gồm quản lý dự án, lập trình viên, chuyên viên phân tích đã thảo luận và lắng nghe các yêu cầu từ phía quán, hai bên đã thống nhất cho việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee được thực hiện. Hai bên đã có buổi kí kết hợp đồng thành công tốt đẹp.

### 1.4.3.8 Các yêu cầu để đánh giá sự thành công của dự án

Các cuộc khảo sát phải trung thực, quá trình xác định yêu cầu người dùng phải dựa trên tình hình thực tế; Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhóm và phía bên quán; Cần có sự hỗ trợ và ra quyết định kịp thời từ Trưởng dự án.

## 1.5 Các bên liên quan và nhân sự chính

Bảng 1.1 Các bên liên quan và nhân sự chính

| STT | Họ Tên    | Bộ phận      | Vai trò & trách nh  | iệm  | Liên lạc     |
|-----|-----------|--------------|---------------------|------|--------------|
| 1   | Đinh Minh | Phòng        | - Trưởng dự án      | chid | m@gmail.com  |
|     | Chí       | QLDA -       | - Chịu trách nhiệm  | ĐT:  | 0394430048   |
|     |           | Công ty phần | điều phối dự án.    |      |              |
|     |           | mềm          |                     |      |              |
|     |           | VNSoft.      |                     |      |              |
| 2   | Trần      | Phòng        | - Chuyên viên phân  | luan | th@gmail.com |
|     | Hoàng     | QLDA -       | tích (BA)           | ĐT:  | 0394452688   |
|     | Luân      | Công ty phần | - Phân tích các yêu |      |              |
|     |           |              | cầu khách hàng      |      |              |

|   |           | mềm          |                      |                        |
|---|-----------|--------------|----------------------|------------------------|
|   |           | VNSoft.      |                      |                        |
| 3 | Dương     | Developer -  | - Lập trình viên.    | hanhdhm@gmail.com.vn   |
|   | Huỳnh Mỹ  | Công ty phần | - Thiết kế và lập    | ĐT: 0357512987         |
|   | Hạnh      | mềm          | trình hệ thống phần  |                        |
|   |           | VNSoft.      | mềm theo yêu cầu     |                        |
|   |           |              | và các tài liệu được |                        |
|   |           |              | giao.                |                        |
|   |           |              | - Hoàn thành công    |                        |
|   |           |              | việc đúng thời hạn.  |                        |
| 4 | Huỳnh     | Developer    | - Lập trình viên.    | nhanht@gmail.com.vn    |
|   | Thanh     | - Công ty    | - Thiết kế và hoàn   | DT: 0928452882         |
|   | Nhàn      | phần mềm     | thành phần mềm.      |                        |
|   |           | VNSoft.      | - Hoàn thành công    |                        |
|   |           |              | việc đúng thời hạn.  |                        |
| 5 | Nguyễn    | Phòng        | - Tester.            | duynv@gmail.com        |
|   | Văn Duy   | QLDA         | - Báo cáo các lỗi    | DT: 0939562456         |
|   |           | - Công ty    | phát sinh để khắc    |                        |
|   |           | phần mềm     | phục kịp thời.       |                        |
|   |           | VNSoft.      |                      |                        |
| 5 | Tập thể   | Phòng kinh   | - Nhân viên kinh     | nvwillcoffee@gmail.com |
|   | nhân viên | doanh - Cửa  | doanh.               | ÐT: 18009563           |
|   | cửa hàng  | hàng Will    | - Phục vụ khách      | Ext: 40063             |
|   | Will      | Coffee.      | hàng tận tâm, nhiệt  |                        |
|   | Coffee    |              | tình, giải quyết các |                        |
|   |           |              | thắc mắc của khách   |                        |
|   |           |              | hàng một cách        |                        |
|   |           |              | nhanh chóng.         |                        |

## 1.6 Điều phối dự án

Đơn vị thực hiện sẽ bàn giao các sản phẩm cho cửa hàng cụ thể như sau:

Bảng 1.2. Danh sách sản phẩm bàn giao

| STT | Hạng mục                | Thời gian Dịa điểm |             | Ghi chú    |
|-----|-------------------------|--------------------|-------------|------------|
|     |                         | chuyển giao        | chuyển giao |            |
| 1   | Tài liệu phân tích và   | 10/11/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | thiết kế hệ thống       |                    | Coffee      | email      |
| 2   | Tài liệu danh sách giao | 18/11/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | diện                    |                    | Coffee      | email      |
| 3   | Tài liệu đặc tả yêu cầu | 9/11/2018          | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | SRS                     |                    | Coffee      | email      |
| 4   | Tài liệu thư viện dữ    | 24/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | liệu                    |                    | Coffee      | email      |
| 5   | Tài liệu hướng dẫn sử   | 25/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | dụng                    |                    | Coffee      | email      |
| 6   | Tài liệu hướng dẫn cài  | 25/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | đặt                     |                    | Coffee      | email      |
| 7   | Tài liệu kỹ thuật       | 25/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     |                         |                    | Coffee      | email      |
| 8   | Biên bản nghiệm thu     | 24/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     |                         |                    | Coffee      | email      |
| 9   | Phần mềm, hệ thống      | 26/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | ứng dụng hoàn thiện     |                    | Coffee      | email      |

## \* Các dịch vụ mà sản phẩm cung cấp:

- + Quản lý đăng nhập, đăng xuất.
- + Quản lý mua hàng.

- + Quản lý bán hàng.
- + Quản lý nhân viên.
- + Quản lý khách hàng.
- + Quản lý nguyên liệu.
- + Quản lý menu.
- + Thống kê, báo cáo doanh thu.


## 2 Tổ chức dự án

## 2.1 Mô hình phát triển phần mềm

Dự án này sử dụng mô hình Thác nước (Waterfall Model). Các giai đoạn sẽ được thực hiện tuần tự.

Mô hình thác nước đơn giản, dễ sử dụng, với các giai đoạn được xử lý và hoàn thành tuần tự, không trùng lặp, không quay lại.


Mô hình phù hợp với dự án ngắn hạn và khi đã xác định các yêu cầu rõ ràng và cố định. Vì vậy, việc áp dụng mô hình này vào dự án lần này là phù hợp.

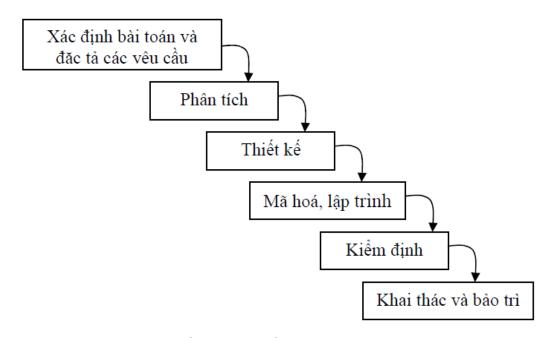

Hình 2.1. Mô hình thác nước

## 2.2 Cơ cấu tổ chức dự án

## 2.2.1 Tổ chức dự án

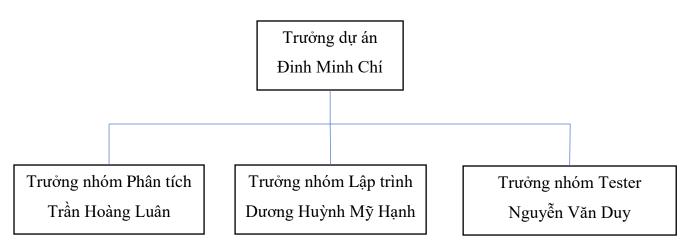

Hình 2.2. Sơ đồ quản lý tổ chức dự án

## 2.2.2 Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.1 Vai trò và trách nhiệm

| Nhóm   | Họ Tên              | Vai trò      | Trách nhiệm chính                |
|--------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| PM     | Đinh Minh Chí       | Trưởng dự án | - Chịu trách nhiệm quản lý, điều |
|        | Email:              |              | phối toàn bộ dự án.              |
|        | chidm@gmail.com     |              | - Đảm bảo dự án đúng tiến độ và  |
|        |                     |              | chất lượng sản phẩm.             |
| BA     | Trần Hoàng Luân     | Trưởng nhóm  | - Điều phối công việc.           |
|        | Email:              | phân tích    | - Review và approve work         |
|        | luanth@gmail.com    |              | product nhóm BA.                 |
| Tester | Nguyễn Văn Duy      | Trưởng nhóm  | - Kiểm tra lỗi phần mềm.         |
|        | Email:              | Tester       | - Viết báo cáo.                  |
|        | duynv@gmail.com     |              |                                  |
| LTV    | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh | Trưởng nhóm  | - Lấy yêu cầu                    |
|        | Email:              | lập trình    | - Thiết kế                       |

| hanhdhm@gmail.com   |               | - Lập trình  |
|---------------------|---------------|--------------|
| Huỳnh Thanh Nhàn    | Nhân viên lập | - Thiết kế   |
| Email:              | trình         | - Lập trình. |
| nhanht@gmail.com.vn |               |              |
|                     |               |              |

#### 3 Quản lý dự án

## 3.1 Giả định, điều kiện, rủi ro

#### 3.1.1 Giả định

- Các thành viên trong dự án không bị điều động sang thực hiện các đội dự án khác.
- Các tác nhân trong hệ thống thực hiện các thao tác đúng với vai trò, chức năng đã quy định.
- Có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và đều hoạt động ổn định, tin cậy.
- Không gặp khó khăn với khách hàng trong quá trình tìm hiểu, thu thập yêu cầu và xây dựng sản phẩm.
- Cơ sở dữ liệu hiện tại (văn bản, các file dữ liệu...) được chuyển đổi sang cơ sở dữ liệu mới của hệ thống thành công và không sai sót, hoặc sai sót trong mức độ cho phép và kiểm soát được.

## 3.1.2 Các hạn chế

- Dữ liệu không realtime, cần thời gian để đồng bộ lên hệ thống.
- Cần nhiều thời gian để có thể kiểm soát các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống.
- Hạn chế việc các thành viên không thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ đã được giao.
- Hạn chế việc điều động nhân viên giữa các dự án, tránh tình trạng nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## 3.1.3 Chi phí dự kiến

- Chi phí dự kiến: 125000000 VND (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Chi phí tối đa: 135000000 VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn )

#### 3.2 Khởi tạo dự án

#### 3.2.1 Uớc lượng

- ❖ Các phương pháp, kỹ thuật được sử dụng để ước lượng chi phí dự án:
  - Kỹ thuật tương tự hay ước lượng từ trên xuống (Top-down estimating): sử dụng chi phí thực tế trước đó của các dự án tương tự làm nền tảng cơ bản để làm ước tính cho dư án hiện tai.
  - Ước lượng từ dưới lên (Bottom-up estimating): ước tính riêng từng nhóm và tính toán con số tổng cộng.

### 3.2.1.1 Ước lượng chi phí, thời gian

- Chi phí thực hiện dự án không được vượt quá chi phí tối đa là 135000000
   VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Thời gian thực hiện dự án dự kiến: 60 ngày
- Thời gian thực hiện dự án tối đa: 70 ngày
- Thời gian tập huấn sử dụng hệ thống: 6 ngày
- Thời gian sử dụng thử nghiệm hệ thống: 3 ngày
- Thời gian bắt đầu dự án: 26/10/2018.
- Thời gian kết thúc dự án dự kiến: 26/12/2018.

## 3.2.1.2 Chi phí tổng quan

Bảng 3.1. Các chi phí tổng quan trong dự án

| STT | Nội dung công việc | Chi Phí | Ghi chú |
|-----|--------------------|---------|---------|
| 1   | Khởi động DA       | 500.000 |         |

| 2  | Khảo sát thực tế                       | 100.000     |
|----|--|-------------|
| 3  | Phân tích và xác định yêu cầu hệ thống | 150.000     |
| 4  | Thiết kế CSDL                          | 20.000.000  |
| 5  | Thiết kế giao diện                     | 30.000.000  |
| 6  | Lập trình                              | 68.000.000  |
| 7  | Kiểm thử và chuẩn bị tài liệu          | 9.000.000   |
| 8  | Cài đặt và hướng dẫn sử dụng           | 1.000.000   |
| 10 | Chi phí dự phòng                       | 4.000.000   |
| 12 | Chi phí đầu tư thiết bị, máy móc       | 1.000.000   |
| 13 | Chi phí cho hội họp, tiếp khách        | 400.000     |
|    | Tổng                                   | 134.000.000 |

# 3.2.1.3 Chi phí chi tiết

Bảng 3.2. Chi phí chi tiết trong dự án

| STT | Chi tiết         | Đơn giá<br>(VNĐ) | Thời gian<br>(Giờ) | Thành tiền<br>(VNĐ) |
|-----|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | Khảo sát         | 25.000           | 20                 | 500.000             |
|     | Quan sát         |                  |                    | 100.000             |
|     | Phỏng vấn        |                  |                    | 300.000             |
|     | Điều tra thăm dò |                  |                    | 200.000             |

| 2 | Phân tích chức năng      | 500.000 | 48 | 24.000.000 |
|---|--------------------------|---------|----|------------|
|   | Quản lý mua hàng         |         |    | 3.000.000  |
|   | Quản lý bán hàng         |         |    | 3.000.000  |
|   | Quản lý nhân viên        |         |    | 3.000.000  |
|   | Quản lý khách hàng       |         |    | 3.000.000  |
|   | Quản lý nguyên liệu      |         |    | 3.000.000  |
|   | Quản lý món              |         |    | 3.000.000  |
|   | Thống kê – báo cáo       |         |    | 3.000.000  |
|   | Quản lý đăng nhập        |         |    | 3.000.000  |
| 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu   | 625.000 | 32 | 20.000.000 |
|   | Bảng thực đơn            |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng mua hàng            |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng chọn món            |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng mức giá             |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng hóa đơn             |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng đồ uống             |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng chức vụ             |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng hóa đơn             |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng chi tiết hóa đơn    |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng phân quyền          |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng nhân viên           |         |    | 1.333.000  |
|   | Bảng thông tin nhân viên |         |    | 1.333.000  |

| 7 | Kết thúc dự án                         | 250.000   | 8  | 1.000.000  |
|---|--|-----------|----|------------|
|   | Kiểm thử giao diện                     |           |    | 2.000.000  |
|   | Kiểm thử mức hệ thống                  |           |    | 2.000.000  |
|   | Kiểm thử mức tích hợp                  |           |    | 3.000.000  |
|   | Kiểm thử mức đơn vị                    |           |    | 2.000.000  |
| 6 | Kiểm thử và sửa lỗi                    | 1.125.000 | 8  | 9.000.000  |
|   | Tích hợp hệ thống                      |           |    | 10.000.000 |
|   | Lập trình module liên hệ               |           |    | 10.000.000 |
|   | Lập trình module liên kết              |           |    | 10.000.000 |
|   | Lập Trình Module Thông tin             |           |    | 10.000.000 |
|   | Lập Trình Module Quản Trị<br>Hệ Thống  |           |    | 18.000.000 |
|   | Xây dựng chức năng quản trị người dùng |           |    | 10.000.000 |
| 5 | Lập trình và tích hợp hệ<br>thống      | 1.133.000 | 60 | 68.000.000 |
|   | Module Báo cáo-Thống kê                |           |    | 300.000    |
|   | Module quản lý                         |           |    | 400.000    |
|   | Module hệ thống                        |           |    | 300.000    |
| 4 | Thiết kế giao diện                     | 416.000   | 72 | 1.000.000  |
|   | Thiết kế Sơ đồ lớp                     |           |    | 1.333.000  |
|   | Bảng đặt món                           |           |    | 1.333.000  |
|   | Bảng hàng nhập                         |           |    | 1.333.000  |

|   | Bàn giao sản phẩm              |      | 250.000     |
|---|--------------------------------|------|-------------|
|   | Làm tài liệu hướng dẫn sử dụng |      | 250.000     |
|   | Đào tạo                        |      | 250.000     |
|   | Bảo trì                        |      | 250.000     |
| 8 | Chi phí khác                   |      | 10.000.000  |
|   | Đi lại                         |      | 2.000.000   |
|   | Hội họp                        |      | 8.000.000   |
|   |                                | Tổng | 123.500.000 |

## 3.2.2 Yêu cầu nguồn lực

## ❖ Gồm có 5 người:

- + 1 Trưởng dự án
- + 1 Nhân viên phân tích (BA)
- + 2 Lập trình viên
- + 1 Tester
- Thời gian sử dụng nhân sự tối thiểu: 2 tháng

## ❖ Giới thiệu về nhân sự:

## 1. Đinh Minh Chí (Project Manager)

- Ngày sinh: 05/03/1997

- Địa chỉ: Củ Chi - TP.HCM

- Email: <a href="mailto:chidm@gmail.com">chidm@gmail.com</a>

- Bằng cấp: Đại học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Kinh nghiệm chuyên môn: Khoa Hệ thống Thông tin tại trường UIT

## 2. Trần Hoàng Luân (BA)

- Ngày sinh: 19/01/1997

- Địa chỉ: Hòa Thành - Tây Ninh

- Email: <u>luanth@gmail.com</u>

Bằng cấp: Đại học

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nhật

- Kinh nghiệm chuyên môn: Khoa Hệ thống Thông tin tại trường UIT

## 3. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh (Lập trình viên)

- Ngày sinh: 12/09/1997

- Địa chỉ: Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

- Email: hanhdhm@gmail.com

- Bằng cấp: Đại học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Kinh nghiệm chuyên môn: Khoa Công nghệ phần mềm tại trường UIT

#### 4. Huỳnh Thanh Nhàn (Lập trình viên)

Ngày sinh: 28/11/1997

- Địa chỉ: Cái Bè - Tiền Giang

- Email: <a href="mailto:nhanht@gmail.com">nhanht@gmail.com</a>

Bằng cấp: Đại học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Kinh nghiệm chuyên môn: Khoa Hệ thống Thông tin tại trường UIT.

## 5. Nguyễn Văn Duy (Tester)

- Ngày sinh: 01/09/1997

- Địa chỉ: Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

- Email: <u>duynv@gmail.com</u>

Bằng cấp: Đại học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Kinh nghiệm chuyên môn: Khoa Hệ thống Thông tin tại trường UIT.

## 3.2.3 Yêu cầu đào tạo nhân sự dự án (nếu có)

Việc lựa chọn hình thức đào tạo để mang lại hiệu quả cao nhất phụ thuộc vào các yêu cầu về quy mô đào tạo, mức độ phức tạp, nội dung cần đào tạo và điều kiện trang bị kỹ thuật, năng lực tài chính cụ thể của từng doanh nghiệp.

Đối với công ty, sẽ đào tạo theo định hướng công việc: nó là hình thức đào tạo về kỹ năng thực hiện một loại công việc nhất định, nhân viên có thể sử dụng kỹ năng sau khi được đào tạo để làm việc trong các dự án khác nhau.

Tất cả các nhân viên của công ty đều được đào tạo thường xuyên thông qua các buổi training kiến thức để cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất liên quan đến từng phòng ban trong công ty để phục vụ cho công việc một cách tốt nhất.

Lý do tại sao cần yêu cầu đào tạo nhân sự dự án? Trong thực tế, một doanh nghiệp khi mới thành lập thì nhu cầu đào tạo nhân viên là một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. Bởi vì cho dù doanh nghiệp có một hệ thống thiết bị, máy móc, kỹ thuật tinh vi mà không có người biết điều khiển cũng trở nên vô ích. Đó là chưa kể đến các nghiệp vụ có tính chất vô hình như các kỹ năng quản trị. Đối với một doanh nghiệp đã có nhiều năm hoạt động, qua kinh nghiệm doanh nghiệp đã xây dựng được bản mô tả công việc. Dựa vào những bản mô tả chi tiết công việc mà khi tuyển nhân viên mới, doanh nghiệp biết rõ nhân viên mới còn thiếu các kỹ năng nào. Ít khi, một công ty nào tuyển được người có đầy đủ trình độ phù hợp theo bản mô tả công việc bởi dù nhanh hay chậm, những người mới được tuyển thường phải qua một giai đoạn đào tạo.

## 3.3 Kế hoạch thực hiện dự án

## 3.3.1 Phân rã công việc (WBS)

Xem chi tiết WBS theo file đính kèm:


 $WBS\_15520063\_15520196\_DinhMinhChi\_DuongHuynhMyHanh.xlsx$ 

| Công việc   | Thời gian (giờ) | Ngày bắt đầu             | Ngày kết thúc            | Người thực hiện       | Chi Phí (VNĐ)      |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| lệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee                    | 334             | 26/10/2018               | 26/12/2018               |                       | 134,000,000        |
| I. Công tác chuẩn bị  | 10              | 26/10/2018               | 30/10/2018               | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy  | 500,000            |
| 1.1. Xác định mục tiêu và phạm vi                           | 2               | 26/10/2018               | 26/10/2018               | Đinh Minh Chí         | 0                  |
| 1.2. Lập bảng mô tả công việc                               | 2               | 27/10/2018               | 27/10/2018               | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh   | 0                  |
| 1.3. Lập đề cương & Bảo vệ đề cương dự án                   | 2               | 28/10/2018               | 28/10/2018               | - Đinh Minh Chí       | 0                  |
| 1.4. Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết                | 2               | 29/10/2018               | 29/10/2018               |                       | 100,000            |
| 1.5. Rà soát công tác chuẩn bị & Họp khởi động dụ           | 2               | 30/10/2018               | 30/10/2018               | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy  | 400,000            |
| Phân tích   | 42              | 31/10/2018               | 9-11-2018                |                       | 500,000<br>100,000 |
| 2.1. Thu thập yêu cầu                                       | 8               | 31/10/2018               | 1-11-2018                | _                     | 50,000             |
| 2.2. Xác định yêu cầu 2.3. Tổng hợp yêu cầu                 | 2 2             | 2-11-2018                | 2-11-2018                |                       | 50,000             |
| 2.4. Phân tích yêu cầu                                      | 8               | 3-11-2018<br>4-11-2018   | 3-11-2018<br>4-11-2018   | Định Minh Chí         | 50,000             |
| 2.5. Viết đặc tả  | 8               | 5-11-2018                | 5-11-2018                | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh   | 50,000             |
| 2.6. Rà soát khảo sát phân tích                             | 8               | 6-11-2018                | 6-11-2018                |                       | 50,000             |
| 2.7. Xác định nguồn lực                                     | 2               | 7-11-2018                | 7-11-2018                |                       | 50,000             |
| 2.8. Lập kế hoạch thực hiện                                 | 2               | 8-11-2018                | 8-11-2018                |                       | 50,000             |
| 2.9. Viết báo cáo phân tích                                 | 2               | 9-11-2018                | 9-11-2018                |                       | 50,000             |
| Phát triển hệ thống   | 180             | 10-11-2018               | 9-12-2018                | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy  | 119,000,000        |
| 3.1. Thiết kế hệ thống tổng thể                             | 8               | 10-11-2018               | 11-11-2018               |                       | 800000             |
| 3.1.1. Thiết kế logic                                       | 8               | 10-11-2018               | 11-11-2018               | Nguyễn Văn Duy        | 800000             |
| 3.2. Thiết kế chi tiết các thành phần                       | 72              | 12-11-2018               | 18/11/2018               | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy  | 30,000,000         |
| 3.2.1. Thiết kế giao diện                                   | 8               |                          |                          |                       |                    |
| 3.2.2. Trang chủ  | 8               | 12-11-2018               | 12-12-2018               | Nguyễn Văn Duy        | 1,000,000          |
| 3.2.3. Chức năng  | 48              | 13/11/2018               | 17/11/2018               | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy  | 24,000,000         |
| 3.2.3.1. Tîm tên đồ uống                                    |                 |                          | 2., 22, 2020             |                       | ,,                 |
| 3.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho                                 | 8               | 13/11/2018               | 13/11/2018               | Đinh Minh Chí         | 5,000,000          |
| 3.2.3.3. Thêm đồ uống                                       |                 |                          |                          |                       | •                  |
| 3.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá                            |                 |                          |                          |                       |                    |
| 3.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho                                 | 8               | 14/11/2018               | 14/11/2018               |                       | 5,000,000          |
| 3.2.3.6. Lập báo cáo  |                 |                          |                          | Dutate a 11-2-1-1-20  |                    |
| 3.2.3.7. Xem thông tin khách hàng                           |                 | 45/44/0040               | 45/44/0040               | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh   |                    |
| 3.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng                              | 8               | 15/11/2018               | 15/11/2018               |                       | 4,000,000          |
| 3.2.3.9. Quản lý  | 16              | 16/11/2018               | 17/11/2018               |                       | 10,000,000         |
| 3.2.3.9.1. Quản lý tồn kho                                  | 8               | 16/11/2018               | 16/11/2018               |                       | 5,000,000          |
| 3.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp                             | 8               | 17/11/2018               | 17/11/2018               |                       | 5,000,000          |
| 3.2.4. Hướng dẫn  |                 |                          |                          | Huỳnh Thanh Nhàn      |                    |
| 3.2.5. Liên hệ  | 8               | 18/11/2018               | 18/11/2018               |                       | 5,000,000          |
| 3.2.6. Tin tức  |                 |                          |                          |                       |                    |
| 3.3. Lập báo cáo thiết kế                                   | 8               | 19/11/2018               | 19/11/2018               | Duy, Hạnh, Nhàn, Chí  | 200,000            |
| 3.4. Xây dựng   | 92              | 20/11/2018               | 11-12-2018               | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy  | 88,000,000         |
| 3.4.1. Thiết kế CSDL  | 32              | 20/11/2018               | 24/11/2018               |                       |                    |
| 3.4.1.1. Tạo sơ đồ lớp                                      |                 | 20/11/2018               | 20/11/2018               |                       |                    |
| 3.4.1.2. Tạo các bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD               |                 | 21/11/2018               | 22/11/2018               | Đinh Minh Chí         | 20,000,000         |
| 3.4.1.3. Tạo các ràng buộc                                  |                 | 23/11/2018               | 23/11/2018               |                       |                    |
| 3.4.1.4. Lập báo cáo về CSDL                                | 32              | 24/11/2018               | 24/11/2018               |                       |                    |
| 3.4.2. Lập trình  | 60              | 25/11/2018               | 11-12-2018               |                       | 68,000,000         |
| 3.4.2.1. Cài đặt môi trường                                 | 4               | 25/11/2018               | 25/11/2018               | Huymi mani whan       | 400,000            |
| 3.4.2.2. Quản trị hệ thống                                  | 16              | 26/11/2018               | 01/12/2018               | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh   | 27,600,000         |
| 3.4.2.2.1. Quản lý nhân viên                                | 8               | 26/11/2018               | 28/11/2018               |                       | 13,000,000         |
| 3.4.2.2.2. Quản lý khách hàng                               | 8               | 29/11/2018               | 01/12/2018               |                       | 14,600,000         |
| 3.4.2.3. Xử lý chức năng                                    | 40              | 2-12-2018                | 11-12-2018               | Chí, Hạnh, Nhàn       | 40,000,000         |
| 3.4.2.3.1. Tìm tên đồ uống                                  | 8               | 2-12-2018                | 3-12-2018                |                       |                    |
| 3.4.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho                               |                 | 2 12 2020                |                          |                       |                    |
| 3.4.2.3.3. Thêm đồ uống                                     | 8               | 4-12-2018                | 4-12-2018                | Đinh Minh Chí         | 10,000,000         |
| 3.4.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá thực đơn                 |                 |                          |                          |                       | ,,                 |
| 3.4.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho                               | 8               | 5-12-2018                | 5-12-2018                |                       |                    |
| 3.4.2.3.6. Lập báo cáo                                      |                 |                          |                          |                       |                    |
| 3.4.2.3.7. Xem thông tin khách hàng                         | 4               | 6-12-2018                | 6-12-2018                | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh   | 5,000,000          |
| 3.4.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng                            | 4               | 7-12-2018                | 7-12-2018                | 3 //                  | , ,                |
| 3.4.2.3.9. Xử lý quản lý                                    | 8               | 8-12-2018                | 11-12-2018               |                       | 05 000             |
| 3.4.2.3.9.1. Quản lý tồn kho                                | 4               | 8-12-2018                | 9-12-2018                | Huỳnh Thanh Nhàn      | 25,000,000         |
| 3.4.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp                           | 4               | 10-12-2018               | 11-12-2018               |                       | 0.000              |
| Kiểm thử  | 52              | 12-12-2018               | 19/12/2018               |                       | 9,000,000          |
| 4.1. Lập kế hoạch test                                      | 2               | 12-12-2018               | 12-12-2018               | Nguyễn Văn Duy        | 1,000,000          |
| 4.2. Viết test case theo yêu cầu                            | 2               | 13/12/2018               | 13/12/2018               |                       | 1,000,000          |
| 4.3. Test tổng thể  | 16              | 14/12/2018               | 15/12/2018               | Dong Heath 2012       | 6 000 000          |
| 4.4. Test từng thành phần                                   | 16              | 16/12/2018               | 17/12/2018               | Duy, Hạnh, Nhàn       | 6,000,000          |
| 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê             | 8               | 18/12/2018               | 18/12/2018               | * *                   | 4.000.000          |
| 4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử                             | 8               | 19/12/2018               | 19/12/2018               | Nguyễn Văn Duy        | 1,000,000          |
| Nghiệm thu  | 40              | 20/12/2018               | 24/12/2018               |                       | 4,000,000          |
| 5.1. Lắp đặt phần cứng                                      | 8               | 20/12/2018               | 20/12/2018               | $\dashv$              | 1,000,000          |
| 5.2. Cài đặt phần mềm                                       | 8               | 21/12/2018               | 21/12/2018               | uỳnh Mỹ HạnhHuỳnh Tha | 1,000,000          |
| 5.3. Đưa vào hoạt động                                      | 8               | 22/12/2018               | 22/12/2018               | <b>⊣</b> '            | 0 000 000          |
| 5.4. Sửa lỗi phát sinh                                      | 8               | 23/12/2018               | 23/12/2018               | $\dashv$              | 2,000,000          |
| 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu                                 | 8               | 24/12/2018               | 24/12/2018               |                       | 0                  |
| Chuyển giao   | 10              | 25/12/2018               | 26/12/2018               |                       | 1,000,000          |
| 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn                                | 2               | 25/12/2018               | 25/12/2018               | Đinh Minh Chí         | 0                  |
| 6.2. Đào tạo  | 8               | 26/12/2018               | 26/12/2018               |                       | 1,000,000          |
| Bảo trì   | 0               | 27/12/2018               | 27/12/2018               | <b>–</b> –            | 0                  |
| 7.1. Bảo hành định kỳ                                       | 0               | 27/12/2018               | 27/12/2018               | Huỳnh Thanh Nhàn      | 0                  |
| -   |                 |                          |                          |                       |                    |
| 7.2. Nâng cấp chương trình khi có phiên bản mới<br>. Hỗ trợ | 0               | 27/12/2018<br>27/12/2018 | 27/12/2018<br>27/12/2018 | Đinh Minh Chí         | 0                  |


## 3.3.1.1 Bảng cấu trúc

- WBS trong dự án triển khai phần mềm quản lý quán cà phê Will Coffee

Hình 3.3. WBS trong xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee

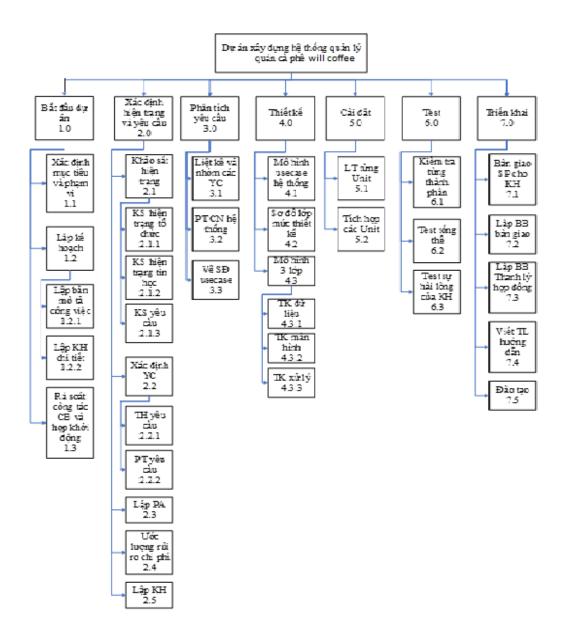


## 3.3.1.2 Danh sách các sản phẩm

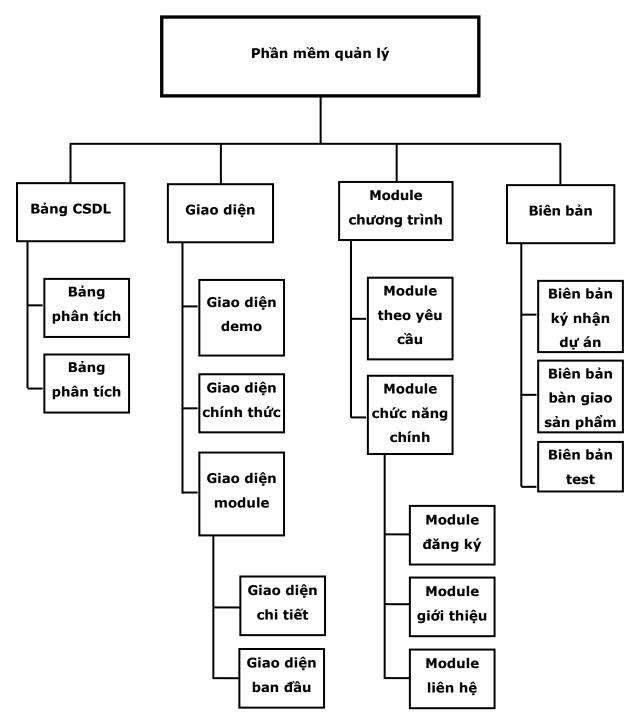

Hình 3.4. Danh sách các sản phẩm của hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee


#### 3.3.2 Lập lịch làm việc

Quản lý công việc bằng Trello

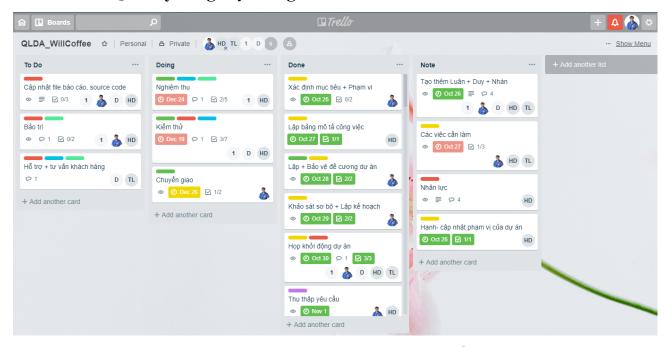

Hình 3.5 Quản lý công việc bằng Trello

- Quản lý source code bằng Github



Hình 3.6 Quản lý source code bằng Github

- Link Github: https://github.com/ChiDinh97/QLDA-CNTT

### \* Thời gian tổng thể

Tổng thời gian dự kiến là 62 ngày được phân chia như sau:

- Khảo sát, phân tích và viết báo cáo: 15 ngày
- Lập trình, kiểm thử các phân hệ, bàn giao từng phân hệ cho khách hàng,
   nhận yêu cầu sửa lỗi của khách hàng và tiến hành sửa lỗi: 47 ngày.
- Thanh lý hợp đồng.

### \* Thời gian chi tiết

Xem chi tiết WBS theo file đính kèm:

 $WBS\_15520063\_15520196\_DinhMinhChi\_DuongHuynhMyHanh.xlsx.$ 

#### 3.3.3 Các cột mốc (milestone) và các work product chính

Bảng 3.7. Danh sách các cột mốc của dự án

| STT | Giai đoạn    | Ngày báo<br>cáo | Tài liệu                          | Ghi chú |
|-----|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------|
| 1   | Khởi động    | 26/10/2018      | Nhận dự án và quyết định khởi     | PM      |
| 1   | dự án        |                 | động dự án (văn bản kèm theo)     |         |
|     |              | 27/10/2018      | - Ước lượng dự án.                | PM      |
| 2   | Lập kế hoạch |                 | - Bản kế hoạch thực hiện dự       |         |
|     | dự án        |                 | án.                               |         |
|     |              | 27/10/2018      | - Bản báo cáo khảo sát.           | BA      |
| 3   | Lấy yêu cầu  |                 | - Bản đặc tả yêu cầu khách        |         |
| 3   | khách hàng   |                 | KH.                               |         |
|     |              |                 | - Báo cáo tiến độ.                |         |
|     |              | 01/11/2018      | - Bản phân tích hệ thống dựa      | BA      |
| 4   | Phân tích    |                 | trên yêu cầu KH.                  |         |
| 4   | và thiết kế  |                 | - Bản đặc tả thiết kế (giao diện, |         |
|     |              |                 | module,).                         |         |

|   |                 |            | - Hoàn thành bản phân tích      |           |  |
|---|-----------------|------------|---------------------------------|-----------|--|
|   |                 |            | thiết kế hệ thống và giao diện  |           |  |
|   |                 |            | theo yêu cầu KH.                |           |  |
|   |                 |            | - Báo cáo tiến độ.              |           |  |
|   |                 | 15/11/2018 | - Báo cáo tiến độ lập trình.    | Trưởng    |  |
| 5 | Lập trình       |            | - Bàn giao module chương        | nhóm      |  |
|   |                 |            | trình.                          | lập trình |  |
|   |                 |            | - Kế hoạch kiểm thử             | Nhóm      |  |
|   | TZ: 2 .1 2      | 20/11/2010 | - Các kịch bản kiểm thử         | Tester    |  |
| 6 | Kiểm thử        | 30/11/2018 | - Các biên bản kiểm thử         |           |  |
|   |                 |            | - Báo cáo tiến độ.              |           |  |
| 7 | Chuyển giao     | 18/12/2018 | - Source code                   | PM        |  |
| / | sản phẩm        |            | - Checklist kỹ thuật            |           |  |
|   | 117             | 19/12/2018 | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng    | Nhóm      |  |
| 8 | Hỗ trợ kỹ thuật |            | sản phẩm                        | Tester    |  |
| 9 | Dána durá:      | 27/12/2018 | - Biên bản bàn giao và thanh lý | Nhóm      |  |
| 9 | Đóng dự án      |            | hợp đồng.                       | Tester    |  |

## 3.3.4 Lập kế hoạch

## 3.3.4.1 Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.8. Các công việc cần làm trong kế hoạch

| Giai đoạn            | Thời<br>gian | Kết quả   | Ghi<br>chú |
|----------------------|--------------|---|------------|
| Công tác<br>chuẩn bị | 5 ngày       | <ul><li>Xác định mục tiêu và phạm vi.</li><li>Lập bảng mô tả công việc.</li></ul> |            |

| Xác định hiện<br>trạng và yêu                  | 10<br>ngày | <ul> <li>Lập đề cương và bảo vệ đề cương dự án.</li> <li>Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết.</li> <li>Rà soát công tác chuẩn bị và họp khởi động dự án.</li> <li>Khảo sát hiện trạng và thu thập yêu cầu.</li> <li>Tổng hợp và phân tích yêu cầu.</li> <li>Lập phương án, kế hoạch.</li> </ul>  |  |
|--|------------|--|--|
| cầu  |            | <ul> <li>Viết báo cáo phân tích.</li> </ul>  |  |
| Phân tích và<br>thiết kế                       | 10<br>ngày | <ul> <li>Xác định Stackeholder, customer.</li> <li>Xây dựng mô hình usecase nghiệp vụ.</li> <li>Xây dựng activity diagram.</li> <li>Xây dựng sequence diagram.</li> <li>Xây dựng mô hình business object.</li> <li>Xây dựng sơ đồ lớp mức phân tích.</li> <li>Mô hình usecase hệ thống.</li> <li>Thiết kế theo mô hình 3 lớp: dữ liệu, màn hình, xử lý.</li> </ul> |  |
| Cài đặt  | 22<br>ngày | <ul> <li>Cài đặt gói chức năng hỗ trợ actor.</li> <li>Chuẩn bị và tích hợp các gói chức năng unit.</li> </ul>  |  |
| Kiểm thử                                       | 8 ngày     | <ul> <li>Kiểm tra thành phần: dữ liệu, xử lý và giao diện người dùng.</li> <li>Kiểm tra tổng thể.</li> <li>Kiểm tra sự hài lòng của khách hàng.</li> </ul>   |  |
| Hướng dẫn<br>cài đặt và sử<br>dụng phần<br>mềm | 7 ngày     | <ul> <li>Viết tài liệu hướng dẫn và đào tạo.</li> </ul>  |  |


### 3.3.4.2 Kế hoạch chi tiết

### 3.3.4.2.1 Công tác chuẩn bị

Bảng 3.9. Danh sách các công việc trong công tác chuẩn bị

| STT | Công việc   | Thời<br>gian<br>(giờ) | Công việc<br>kết thúc<br>trước đó | Chi<br>phí/Ngày<br>rút ngắn |
|-----|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Xác định mục tiêu và phạm vi (A)                                    | 2                     |                                   |                             |
| 2   | Lập bảng mô tả công việc + Lập đề cương & Bảo vệ đề cương dự án (B) | 2                     | A                                 |                             |
| 4   | Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết (C)                         | 2                     | A                                 |                             |
| 5   | Rà soát công tác chuẩn bị và họp khởi động dự án (D)                | 2                     | С                                 |                             |

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn công tác chuẩn bị




Hình 3.10. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn công tác chuẩn bị

### 3.3.4.2.2 Giai đoạn xác định hiện trạng và yêu cầu

Bảng 3.11. Danh sách công việc trong giai đoạn xác định hiện trạng và yêu cầu

| STT | Công việc                       | Thời<br>gian<br>(giờ) | Công việc<br>kết thúc<br>trước đó | Chi<br>phí/Ngày<br>rút ngắn |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Khảo sát hiện trạng tổ chức (A) | 2                     |                                   |                             |
| 2   | Khảo sát hiện trạng tin học (B) | 4                     |                                   |                             |
| 3   | Khảo sát yêu cầu (C)            | 8                     | A, B                              |                             |
| 4   | Tổng hợp yêu cầu (D)            | 2                     | С                                 |                             |
| 5   | Phân tích yêu cầu (E)           | 8                     | С                                 |                             |
| 6   | Lập phương án (F)               | 4                     | Е                                 |                             |
| 7   | Ước lượng rủi ro, chi phí (G)   | 8                     | F                                 |                             |
| 8   | Lập kế hoạch (H)                | 8                     | Е                                 |                             |

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn xác định hiện trạng và yêu cầu



Hình 3.12. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn xác định hiện trạng và yêu cầu


### 3.3.4.2.3 Giai đoạn phân tích

Bảng 3.13. Danh sách các công việc trong giai đoạn phân tích

| STT | Công việc                                 | Thời gian<br>(giờ) | Công việc<br>kết thúc<br>trước đó | Chi<br>phí/Ngày<br>rút ngắn |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Xác định stackeholder,<br>customer (A)    | 8                  |                                   |                             |
| 2   | Xây dựng mô hình usecase<br>nghiệp vụ (B) | 8                  | A                                 |                             |
| 3   | Xây dựng activity diagram (C)             | 8                  | В                                 |                             |
| 4   | Xây dựng sequence diagram (D)             | 8                  | ٥                                 |                             |
| 5   | Xây dựng mô hình business<br>object (E)   | 8                  | В                                 |                             |

| 6 | Xây dựng sơ đồ lớp mức phân<br>tích (F) | 8 |  |  |
|---|---|---|--|--|
|---|---|---|--|--|

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn phân tích



Hình 3.14. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn phân tích


### 3.3.4.2.4 Giai đoạn thiết kế

Bảng 3.15. Các công việc cần làm trong giai đoạn thiết kế

| STT | Công việc                                       | Thời<br>gian<br>(giờ) | Công việc kết<br>thúc trước đó | Chi phí/<br>Ngày rút<br>ngắn |
|-----|---|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1   | Mô hình usecase hệ thống (A)                    | 2                     |                                |                              |
| 2   | Sơ đồ lớp mức thiết kế (B)                      | 2                     | A                              |                              |
| 3   | Thiết kế hệ thống tổng thể (C)                  | 8                     | В                              |                              |
| 4   | Thiết kế chi tiết các thành phần (D)            | 8                     | С                              |                              |
| 5   | Thiết kế màn hình - tiện dụng<br>- hiệu quả (E) | 2                     | D                              |                              |
| 6   | Thiết kế màn hình tra cứu (F)                   | 2                     | Е                              |                              |

| 7 | Thiết kế màn hình thực đơn (G) | 2 | F |  |
|---|--------------------------------|---|---|--|
| 8 | Minh họa thiết kế xử lý (H)    | 2 | G |  |
| 9 | Thiết kế xử lý (I)             | 2 | Н |  |

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn thiết kế



Hình 3.16. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn thiết kế


### **3.3.4.2.5** Giai đoạn cài đặt

Bảng 3.17. Danh sách các công việc trong giai đoạn cài đặt

| STT | Công việc                                   | Thời<br>gian<br>(giờ) | Công việc kết<br>thúc trước<br>đó | Chi phí/Ngày<br>rút ngắn |
|-----|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1   | Cài đặt gói chức năng hỗ trợ phân quyền (A) | 8                     |                                   |                          |
| 2   | Cài đặt gói chức năng hỗ trợ quản lý (B)    | 8                     | A                                 |                          |

| 3 | Cài đặt gói chức năng hỗ trợ thu ngân (C)          | 8  | A |  |
|---|--|----|---|--|
| 4 | Cài đặt gói chức năng hỗ trợ nhân viên pha chế (D) | 8  | A |  |
| 5 | Cài đặt gói chức năng hỗ trợ nhân viên phục vụ (E) | 8  | A |  |
| 6 | Cài đặt gói chức năng hỗ trợ kế toán (F)           | 8  | A |  |
| 7 | Chuẩn bị unit (G)                                  | 2  | F |  |
| 8 | Tích hợp unit (H)                                  | 16 | G |  |

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn cài đặt

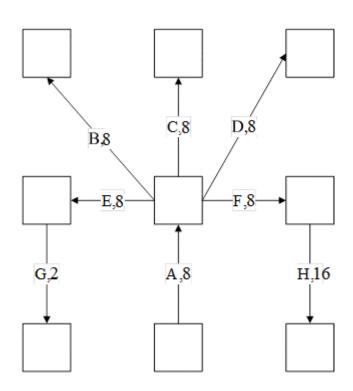


Hình 3.18. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn cài đặt

### **3.3.4.2.6** Giai đoạn kiểm thử

Bảng 3.19. Danh sách các công việc trong giai đoạn kiểm thử

| STT | Công việc                                  | Thời<br>gian<br>(giờ) | Công việc<br>kết thúc<br>trước đó | Chi phí/Ngày<br>rút ngắn |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1   | Kiểm tra các thành phần dữ liệu (A)        | 8                     |                                   |                          |
| 2   | Kiểm tra các thành phần xử lý (B)          | 8                     | A                                 |                          |
| 3   | Kiểm tra các thành phần giao diện (C)      | 16                    | В                                 |                          |
| 4   | Kiểm tra tổng thể (D)                      | 16                    | С                                 |                          |
| 5   | Kiểm tra sự hài lòng của<br>khách hàng (E) | 8                     | D                                 |                          |

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn kiểm thử




Hình 3.20. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn kiểm thử

### 3.3.4.2.7 Giai đoạn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

Bảng 3.21. Danh sách các công việc trong giai đoạn cài hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

| STT | Công việc                   | Thời<br>gian<br>(giờ) | Công việc kết<br>thúc trước đó | Chi phí/Ngày<br>rút ngắn |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1   | Viết tài liệu hướng dẫn (A) | 2                     |                                |                          |
| 2   | Đào tạo (B)                 | 8                     | A                              |                          |

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm



Hình 3.22. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

### 3.3.5 Phân tích yêu cầu

#### 3.3.5.1 Khảo sát hiện trạng

### 3.3.5.1.1 Phỏng vấn

Bảng 3.23. Danh sách câu hỏi phỏng vấn

| Người được phỏng vấn: Trần Sang | Ngày: 31/10/2018 |
|---------------------------------|------------------|
| Chức vụ: Quản lý                |                  |
| Câu hỏi                         | Ghi nhận         |


| Câu hỏi 1: Anh có thể cho biết quá trình | - Ban đầu chúng tôi kiểm tra hàng trong  |
|--|--|
| nhập hàng diễn ra như thế nào không?     | kho xem thiếu những nguyên liệu gì, rồi  |
|  | sẽ đặt hàng cho nhà cung cấp, khi hàng   |
|  | được giao tới chúng tôi kiểm tra số      |
|  | lượng, chất lượng của hàng hóa rồi ghi   |
|  | chép vào sổ sách.                        |
|  | - Thái độ trả lời: chắc chắn.            |
| Câu hỏi 2: Anh sẽ lưu trữ những thông    | - Vì cửa hàng chúng tôi nhập các loại    |
| tin gì khi đặt hoặc nhận hàng? Và anh    | nguyên liệu đa dạng nên có nhiều nhà     |
| đặt hàng của một nhà cung cấp hay        | cung cấp khác nhau. Tôi sẽ ghi lại thông |
| nhiều nhà cung cấp khác nhau?            | tin sản phẩm, số lượng, ngày giao, nhà   |
|  | cung cấp, nguồn cung cấp                 |
|  | - Thái độ trả lời: chắc chắn.            |
| Câu hỏi 3: Cửa hàng của mình là một      | - Có, khách hàng sẽ thanh toán 1/3 số    |
| cửa hàng lớn. Vậy cửa hàng có dịch vụ    | tiền bàn mình đã đặt, thông tin khách    |
| đặt bàn trước không? Nếu muốn thay       | hàng và bản được đặ sẽ được ghi chú      |
| đổi hoặc hủy bàn thì cửa hàng sẽ xử lý   | trên máy tính. Nếu có thay đổi yêu cầu   |
| như thế nào?                             | khách hàng thông báo cho chúng tôi biết  |
|  | trước 1 ngày.                            |
|  | - Thái độ trả lời: chắc chắn.            |
| Câu hỏi 4: Nếu có một phần mềm quản      | - Tôi muốn có một phần mềm tiện lợi,     |
| lý cửa hàng thì anh muốn phần mềm đó     | đơn giản và dễ quản lý, dễ bảo trì và có |
| như thế nào?                             | thể mở rộng chức năng nếu cần thiết.     |
|  | - Thái độ trả lời: chắc chắn.            |
| Câu hỏi 5: Hóa đơn sau khi thanh toán    | - Có, hóa đơn sau khi trên toán sẽ luôn  |
| cho khách có được lưu lại trên máy hay   | được lưu trên máy tính. Cuối mỗi ca,     |
| không và làm thế nào để kiểm tra lại?    | nhân viên thu ngân giữ ca trực đó sẽ     |
|  | phải sắp xếp theo trình tự: toàn bộ bill |

|  | bán hàng, và cuối ngày chúng tôi sẽ       |
|--|---|
|  | kiểm tra lại doanh thu thực tế xem có     |
|  | trùng khớp với hóa đơn đã bán hàng hay    |
|  | không.                                    |
|  | - Thái độ trả lời: chắc chắn.             |
| Câu hỏi 6: Thông thương trên hóa đơn     | - Thông thường trên hóa đơn sẽ được in    |
| sẽ được in những thông tin gì?           | thông tin: loại nước uống, số lượng, số   |
|  | tiền của từng loại nước và tổng tiền, tên |
|  | nhân viên lập hóa đơn, thông tin cửa      |
|  | hàng, password wifi.                      |
|  | - Thái độ trả lời: chắc chắn.             |
| Câu hỏi 7: Hiện nay cửa hàng có hệ       | - Hiện tại cửa hàng sử dụng phần mềm      |
| thống quản lý bằng tin học nào không?    | quản lý quán cà phê áp dụng công nghệ     |
|  | C#.                                       |
|  | - Thái độ trả lời: chắc chắn.             |
| Câu hỏi 8: Cho biết hệ thống quản lý cửa | - Hiện tại cửa hàng có 3 chi nhánh.       |
| hàng cà phê và số lượng máy tại mỗi chi  | - Trong đó mỗi chi nhánh có 2 máy để      |
| nhánh như thế nào?                       | quản lý cửa hàng.                         |
|  | - Các máy được kết nối mạng LAN.          |
|  | - Nhân viên có thể truy cập internet từ   |
|  | client.                                   |
|  | - Thái độ trả lời: chắc chắn.             |
| Câu hỏi 9: Cho biết các phần mềm cài     | - Hiện tại các máy đều khởi động thông    |
| đặt trên máy?                            | qua máy chủ.                              |
|  | - Các máy đơn cài windows 7.              |
|  | - Máy chủ cài windows 10.                 |
|  | - Hiện tại toàn bộ hệ thống được kết nối  |
|  | cơ sở dữ liệu bằng SQL Server 2016.       |

|   | - Thái độ trả lời: chắc chắn.             |
|---|---|
| Câu hỏi 10: Máy chủ có quản lý toàn bộ  | - Máy chủ quản lý toàn bộ hệ thống và     |
| hệ thống không hay mỗi chi nhánh sử     | toàn bộ cơ sở dữ liệu được lưu vào máy    |
| dụng một cơ sở dữ liệu khác nhau?       | chủ vận hành.                             |
|   | - Thái độ trả lời: không chắc chắn.       |
| Câu hỏi 11: Khách hàng sẽ thanh toán    | - Nếu là khách hàng mới thì làm thẻ       |
| như thế nào?                            | thành viên mới cho khách hàng (nếu        |
|   | khách hàng có nhu cầu) hoặc thanh toán    |
|   | bằng tiền mặt và nhận hóa đơn từ cửa      |
|   | hàng.                                     |
|   | - Nếu đã là thành viên của cửa hàng thì   |
|   | hệ thống sẽ quản lý điểm tích lũy(khách   |
|   | hàng thân thiện), được thanh toán tiền,   |
|   | nhận hóa đơn từ cửa hàng.                 |
|   | - Thái độ trả lời: chắc chắn.             |
| Câu hỏi 12: Quản lý có vai trò gì trong | - Quản lý là người trực tiếp quản lý quán |
| cửa hàng?                               | cà phê, mọi vấn đề của quán đều thông     |
|   | qua quản lý và quản lý có quyền quyết     |
|   | định mọi thông tin trong cửa hàng. Là     |
|   | người nắm được tình hình mua bán,         |
|   | doanh thu của cửa hàng, quản lý nhân      |
|   | viên.                                     |
|   | - Thái độ trả lời: chắc chắn.             |
| Câu hỏi 13: Nhân viên thu ngân có vai   | - Nhân viên sẽ là người đứng ở quầy thu   |
| trò như thế nào với hệ thống?           | tiền và tính tiền cho khách hàng thông    |
|   | qua hệ thống.                             |

|   | -Nhân viên sẽ kiểm tra mã món, thanh    |
|---|---|
|   | toán trực tiếp và gửi hóa đơn cho khách |
|   | hàng.                                   |
|   | - Thái độ trả lời: chắc chắn.           |
| Câu hỏi 14: Phục vụ có vai trò gì trong | - Phục vụ sẽ ghi danh sách món theo yêu |
| cửa hàng?                               | cầu của khách hàng tại bàn và bưng món  |
|   | lên cho khách hàng.                     |
|   | - Thái độ trả lời: chắc chắn.           |
| Câu hỏi 15: Pha chế có vai trò gì trong | - Khi nhân viên phục vụ ghi danh sách   |
| cửa hàng?                               | món trong thực đơn thì pha chế sẽ dựa   |
|   | vào thực đơn đó và tạo ra các món mà    |
|   | khách hàng yêu cầu.                     |
|   | - Thái độ trả lời: chắc chắn.           |
| Câu hỏi 16: Kế toán có vai trò gì trong | - Tính lương cho nhân viên.             |
| cửa hàng?                               | - Báo cáo doanh thu theo tháng, quý     |
|   | hoặc cũng có khi báo cáo đột xuất.      |
|   | - Thái độ trả lời: chắc chắn.           |
| Câu hỏi 17: Tạp vụ có vai trò gì trong  | - Tạp vụ làm công việc quét dọn.        |
| cửa hàng?                               | - Thái độ trả lời: chắc chắn.           |
| Câu hỏi 18: Bảo vệ có vai trò gì trong  | - Bảo vệ là người quản lý bãi giữ xe và |
| cửa hàng?                               | trật tự an ninh tại cửa hàng.           |
|   | - Thái độ trả lời: chắc chắn.           |

#### 3.3.5.1.2 Hiện trạng tổ chức



Hình 2.24. Hiện trạng tổ chức của quán cà phê Will Coffee

- Mô tả: Người quản lý sẽ là người chịu trách nhiệm quản lý tất cả các nhân viên trong cửa hàng.
- Ở mỗi bộ phận, tùy theo khối lượng công việc sẽ được phân chia với số lượng nhân viên khác nhau.

#### 3.3.5.1.3 Hiện trạng tin học

#### ❖ Phần cứng

- Hiện tại quán có 5 máy tính để bàn, các máy hiện tại có cấu hình Intel ® Core ™ i5, bên cạnh đó quán có 2 máy in, 1 máy đọc mã vạch.
- Các máy tính đều được kết nối mạng LAN và có sử dụng đường truyền ADSL để kết nối Internet.

#### ❖ Phần mềm

- Phần mềm đang sử dụng: Word 2013, Ecxel 2013, Microsoft SQL Server 2012.
- Hệ điều hành: Windows 10
- Hệ quản trị CSDL: SQL Server.
- Các phần mềm tiện ích khác như đã cài đặt sẵn Unikey, ...

#### ❖ Con người

Nhân viên trong quán đều hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản như:

- Sử dụng máy tính cơ bản.

- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản như có thể gõ văn bản, trình bày, và lập công thức và tính toán các hàm trong excel.

### Khối lượng

- Số nhân viên kể cả quản lý trong quán hiện tại có 9 người (trừ nhân viên bảo vệ và nhân viên tạp vụ).
- Nhân viên thu ngân và pha chế xem và tra cứu và hóa đơn và đơn hàng.

#### ❖ Tần suất

- Số lượng khách hàng đến quán mỗi ngày ước tính khoảng: 150 khách và tăng lên vào các ngày lễ.
- Nhân viên thu ngân và nhân viên pha chế một ngày phải xử lý và pha chế hơn 300 đơn hàng và các loại thức uống.

#### 3.3.5.1.4 Nghiệp vụ và quy trình

Mua hàng: Sau khi kiểm tra định kì để biết số lượng còn lại của các sản phẩm thì cửa hàng sẽ tiến hành mua các nguyên liệu về để trong kho, các nguyên liệu gồm có như bột cà phê, sữa đặc, sữa không đường, kem, bột bánh mì, các bột pha chế các nước trái cây, cũng như các nguyên liệu để trong tử lạnh như các lọa trái cây, kem, ... Mỗi ngày, nhân viên sẽ lấy ra các sản phẩm để bán trong ngày thông qua các dự đoán đã lập sẵn về sức bán trong ngày.

Bán hàng: Mỗi khi có khách đặt món sẽ thông qua phục vụ, phục vụ sẽ báo lại với thu ngân để thu ngân lập món cho nhân viên pha chế. Khách hàng sẽ thanh toán trước khi rời khỏi quán.

#### 3.3.5.2 Khảo sát về yêu cầu

### 3.3.5.2.1 Yêu cầu phi chức năng

- + Yêu cầu về giao diện:
  - o Giao diện quản lý hợp lý, đơn giản, tiện dụng.
  - Giao diện dùng cho khách hàng yêu cầu thân thiện, sinh động, dễ sử dụng và tương tác cao vs khách hàng.

- + Yêu cầu chất lượng:
  - Hệ thống giao diện trực quan, thân thiện, dễ dành sử dụng, mang tính hiệu quả cao.
  - O Các đặc tả và hướng dẫn sử dụng dõ ràng.
- + Yêu cầu hoạt động:
  - o Tính hiệu quả:
    - Hệ thống tính toán chuẩn xác hóa đơn và tự động nâng cấp khách hàng thân thiết.
    - Hệ thống hoạt động ổn định và đáng tin cậy.
  - o Tính tương thích:
    - Hoạt động tốt trên các hệ điều hành: Windows, Mac OS, Linux...
    - Hoạt động tốt với máy tính có cấu hình yếu

#### 3.3.5.2.2 Yêu cầu chức năng

- + Quản lý mua hàng
- + Quản lý bán hàng
- + Quản lý nhân viên
- + Quản lý khách hàng
- + Quản lý nguyên liệu
- + Quản lý món
- + Quản lý thống kê
- + Quản lý đăng nhập

### 3.3.5.2.3 Danh sách các tác nhân nghiệp vụ của hệ thống

Bảng 3.25. Danh sách Actor trong hệ thống

| STT | ACTOR        | Ý Nghĩa  |  |
|-----|--------------|--|--|
| 1   | AT01_ThuNgan | Là thu ngân trong quán cà phê. Thu ngân đứng ở quầy      |  |
|     |              | thu tiền và thanh toán hóa đơn tạm tính. Thu ngân là tác |  |
|     |              | nhân tác động trực tiếp và được phân quyền sử dụng hệ    |  |
|     |              | thống để hỗ trợ cho việc thanh toán hóa đơn bán hàng.    |  |
|     |              | Không được xóa hóa đơn tạm tính, hóa đơn bán hàng và     |  |
|     |              | hóa đơn tạm tính khi thanh toán thành hóa đơn bán hàng   |  |
|     |              | chỉ được in một lần.                                     |  |
| 2   | AT02_PhaChe  | Là nhân viên pha chế trong phòng pha chế. Được phân      |  |
|     |              | quyền sử dụng hệ thống hỗ trợ cho việc cập tình trạng    |  |
|     |              | đơn đặt món và tình trạng nguyên liệu.                   |  |
| 3   | AT03_PhucVu  | Là nhân viên phục vụ trong quán. Nhân viên phục vụ có    |  |
|     |              | nhiệm vụ order món cho khách hàng, giúp khách hàng       |  |
|     |              | thanh toán hóa đơn tại khu vực quầy thu tiền. Phục vụ    |  |
|     |              | cũng được phân quyền sử dụng hệ thống để order món       |  |
|     |              | tạo hóa đơn tạm tính.                                    |  |
|     |              | Không được xóa hóa đơn tạm tính.                         |  |
| 4   | AT04_KeToan  | Là nhân viên kế toán trong quán. Chịu trách nhiệm trong  |  |
|     |              | việc nhập nguyên liệu, cập nhật hóa đơn mua hàng, tính   |  |
|     |              | trạng nguyên liệu và thống kê các doanh số trong quán.   |  |
|     |              | Kế toán được phân quyền sử dụng hệ thống thực hiện       |  |
|     |              | các nghiệp vụ cá nhân.                                   |  |
| 5   | AT05_QuanLy  | Là quản lý trong quán cà phê. Có trách nhiệm kiểm kê,    |  |
|     |              | quản lý chung mọi họa động trong quán. Ngoài các chức    |  |
|     |              | năng của nhân viên, Quản lý có quyền thêm món, bàn,      |  |
|     |              | nhân viên, khách hàng và xóa món, bàn, nhân viên.        |  |

|  | Không được xóa khách hàng. Quản lý còn được cung |
|--|--|
|  | cấp chức năng phân quyền cho các actor.          |

### 3.3.5.2.4 Danh sách Usecase nghiệp vụ

Bảng 3.26. Danh sách các Usecase nghiệp vụ của hệ thống

| STT  | Tên usecase           | Ghi chú   | Người thực                     |
|------|-----------------------|---|--------------------------------|
| 311  | Ten usecase           | Gill Citu   | hiện                           |
| AT01 | _ThuNgan              | ,   |                                |
| 1    | u001_TCKhachHang      | Nhân viên tra cứu và xem  | Thu Ngân                       |
|      | uoo1_1Cixilaciii iang | thông tin khách hàng  | Quản lý                        |
| 2    | u002_TCBan            | Nhân viên tra cứu và tình   | Thu ngân                       |
|      | uooz_1cban            | trạng bàn   | NV phục vụ                     |
| 3    | u003_CNHDTamTinh      | Nhân viên cập nhật thêm món mới vào hóa đơn tạm tính                                  | Thu ngân<br>NV phục vụ         |
| 4    | u004_InHDTamTinh      | Nhân viên in hóa đơn tạm tính   | Thu ngân                       |
| 5    | u005_ThanhToanHD      | Nhân viên thanh toán hóa đơn tạm tính   | Thu ngân                       |
| 6    | u006_InHDThanhToan    | Nhân viên in hóa đơn sau khi<br>thanh toán hóa đơn tạm tính<br>và chỉ được in một lần | Thu ngân                       |
| 7    | u007_TCHDBH           | Nhân viên tra cứu và xem hóa đơn bán hàng   | Thu ngân<br>Kế toán<br>Quản lý |
| 8    | u008_TCMenu           | Nhân viên tra cứu menu và xem thông tin món   | Thu ngân<br>NV phục vụ         |


| AT02 | AT02_PhaChe           |                              |            |  |  |
|------|-----------------------|------------------------------|------------|--|--|
|      |                       | Nhân viên tra cứu nguyên     | Quản lý    |  |  |
| 1    | u009_TCNL             | liệu và xem thông tin nguyên | Kế toán    |  |  |
|      |                       | liệu                         | Pha chế    |  |  |
| 2    | u010_CNTinhTrangNL    | Nhân viên cập nhật tình      | NV pha chế |  |  |
| 2    | doto_civiniiiTrangivL | trạng nguyên liệu            | iv pha che |  |  |
| 3    | u011_CNDatMon         | Nhân viên cập nhật tình      | NV pha chế |  |  |
|      | dol1_crvbanvion       | trạng đơn đặt món            | iv pha ene |  |  |
| AT03 | _PhucVu               |                              |            |  |  |
| 1    | u012_TCMenu           | Nhân viên tra cứu menu,      | Thu ngân   |  |  |
|      | do12_1 Civiciid       | xem thông tin món            | NV phục vụ |  |  |
| 2    | u013_TCBan            | Nhân viên tra cứu bàn và     | Thu ngân   |  |  |
|      | u013_1Cban            | xem tình trạng bàn           | NV phục vụ |  |  |
| 3    | u014_TaoHDTamTinh     | Nhân viên chọn món và đặt    | NV phục vụ |  |  |
|      |                       | order                        | iv phác vá |  |  |
| 4    | u015_CNHDTamTinh      | Nhân viên thêm món trong     | NV phục vụ |  |  |
| -    |                       | hóa đơn tạm tính             | Thu ngân   |  |  |
| AT04 | _KeToan               |                              |            |  |  |
| 1    | u016_TCNhanVien       | Nhân viên tra cứu và xem     | Kế toán    |  |  |
| 1    |                       | thông tin nhân viên tra cứu  | Quản lý    |  |  |
| 2    | u017_TKLuong          | Nhân viên thống kê lương     | Kế toán    |  |  |
| 2    |                       | nhân viên theo tháng         | Quản lý    |  |  |
| 3    | u018_InBangLuong      | Nhân viên in bảng lương      | Kế toán    |  |  |
|      | do 10_mbangbaong      | nhân viên                    | IXC toall  |  |  |
|      |                       | Nhân viên tra cứu hóa đơn    | Kế toán    |  |  |
| 4    | u019_TCHDBH           | bán hàng và xem chi tiết hóa | Quản lý    |  |  |
|      |                       | đơn bán hàng                 | Zumi iy    |  |  |

| Nhân viên thông kê doanh thu của quán theo ngày hoặc theo tháng   Nhân viên in thống kê doanh thu   |      | Г                  | T   | 1       |  |  |
|---|------|--------------------|---|---------|--|--|
| thu  10   | 5    | u020_TKDoanhThu    |   |         |  |  |
| theo ngày hoặc theo tháng  u022_TKBanHang  theo ngày hoặc theo tháng  Nhân viên in thống kê bán hàng  Nhân viên tra cứu hóa đơn mua hàng và xem chi tiết hóa đơn mua hàng và xem chi tiết hóa đơn mua hàng bằng cách nhập trực tiếp hoặc import file excel  Nhân viên thống kê mua hàng  Nhân viên thống kê mua hàng  Nhân viên thống kê mua hàng  Vế toán  10  u026_TKMuaHang  Nhân viên thống kê mua hàng  Nhân viên in thống kê mua hàng  Vế toán  Nhân viên in thống kê mua hàng  U027_InTKMuaHang  Nhân viên tra cứu và xem chi tiết thông tin nguyên liệu  Nhân viên cập nhật tình kế toán  NV Pha chế  AT05_QuanLy  Tra cứu và xem thông tin chi  Quản lý  Kế toán  NV Pha chế | 6    | u021_InTKDoanhThu  |   | Kế toán |  |  |
| theo ngày hoặc theo tháng    10   10   10   10   10   10   10   1   | 7    | u022 TKRanHang     | Nhân viên thống kê bán hàng                           | Kế toán |  |  |
| 8   | ,    | uozz_TRDumiang     | theo ngày hoặc theo tháng                             | Quản lý |  |  |
| 9   | 8    | u023_InTKBanHang   | _   | Kế toán |  |  |
| mua hàng bằng cách nhập trực tiếp hoặc import file excel  11 u026_TKMuaHang  Nhân viên thống kê mua hàng bằng cách nhập trực tiếp hoặc import file excel  Nhân viên thống kê mua hàng  12 u027_InTKMuaHang  Nhân viên in thống kê mua hàng  Nhân viên in thống kê mua hàng  Kế toán  Nhân viên tra cứu và xem chi tiết thông tin nguyên liệu  Nhân viên cập nhật tình trạng nguyên liệu  Tra cứu và xem thông tin chi Quản lý  | 9    | u024_TCHDMH        | mua hàng và xem chi tiết hóa                          |         |  |  |
| 11 u026_TKMuaHang hàng Quản lý  12 u027_InTKMuaHang Nhân viên in thống kê mua hàng  13 u028_ TCNL Nhân viên tra cứu và xem chi tiết thông tin nguyên liệu Kế toán NV Pha chế  14 u029_CNTinhTrangNL Nhân viên cập nhật tình trạng nguyên liệu NV pha chế  AT05_QuanLy  Tra cứu và xem thông tin chi Quản lý   | 10   | u025_ThemHDMH      | mua hàng bằng cách nhập<br>trực tiếp hoặc import file | Kế toán |  |  |
| 12 u027_InTKMuaHang  Nhân viên in thống kê mua hàng  Kế toán  Nhân viên tra cứu và xem chi tiết thông tin nguyên liệu  Nhân viên cập nhật tình trạng nguyên liệu  Nhân viên cập nhật tình trạng nguyên liệu  NV Pha chế  AT05_QuanLy  Tra cứu và xem thông tin chi Quản lý  | 11   | u026_TKMuaHang     |   |         |  |  |
| 12 u027_InTKMuaHang hàng Kê toán  13 u028_ TCNL  Nhân viên tra cứu và xem chi tiết thông tin nguyên liệu  Nhân viên cập nhật tình trạng nguyên liệu  Nhân viên cập nhật tình trạng nguyên liệu  NV Pha chế  AT05_QuanLy  Tra cứu và xem thông tin chi Quản lý   |      |                    | ,   | Quản lý |  |  |
| Nhân viên tra cứu và xem chi tiết thông tin nguyên liệu  Nhân viên tra cứu và xem chi tiết thông tin nguyên liệu  NV Pha chế  Nhân viên cập nhật tình Kế toán trạng nguyên liệu  NV pha chế  AT05_QuanLy  Tra cứu và xem thông tin chi Quản lý  | 12   | u027_InTKMuaHang   |   | Kế toán |  |  |
| 14 u029_CNTinhTrangNL trạng nguyên liệu NV pha chế  AT05_QuanLy  Tra cứu và xem thông tin chi Quản lý  1 u030 TCNL  | 13   | u028_ TCNL         |   | Kế toán |  |  |
| Tra cứu và xem thông tin chi Quản lý  | 14   | u029_CNTinhTrangNL |   | _       |  |  |
| 1   u030 TCNL   | AT05 | AT05_QuanLy        |   |         |  |  |
|   | 1    | u030_TCNL          |   |         |  |  |


|     |  |   | NV Pha chế         |
|-----|--|---|--------------------|
| 2   | u031_XoaNL                                     | Xóa nguyên liệu                             | Quản lý            |
| 3   | u032_ThemNL                                    | Thêm nguyên liệu                            | Quản lý            |
| 4   | u033_TCMon                                     | Tra cứu và xem thông tin chi<br>tiết món    | Quản lý            |
| 5   | u034_CNMon                                     | Cập nhật thông tin món                      | Quản lý            |
| 6   | u035_XoaMon                                    | Xóa món                                     | Quản lý            |
| 7   | u036_ThemMon                                   | Thêm món                                    | Quản lý            |
| 8   | u037_XoaBan                                    | Xóa bàn                                     | Quản lý            |
| 9   | u038_TCBan                                     | Tra cứu bàn                                 | Quản lý            |
| 10  | u039_ThemBan                                   | Thêm bàn                                    | Quản lý            |
| 11  | u040_TCKhachHang                               | Tra cứu thông tin khách                     | Quản lý            |
| 11  | u040_1CKnachriang                              | hàng  | Thu ngân           |
| 12  | u041_CNKhachHang Cập nhật thông tin khách hàng |   | Quản lý            |
| 13  | u042_ThemKhachHang Thêm khách hàng mới         |   | Quản lý            |
| 14  | u043_TCNhanVien                                | Tra cứu và xem thông tin nhân viên chi tiết | Quản lý<br>Kế toán |
| 15  | u044_CNNhanVien                                | Cập nhật thông tin nhân viên                | Quản lý            |
| 16  | u045_XoaNhanVien                               | Xóa nhân viên                               | Quản lý            |
| 17  | u046_ThemNhanVien Thêm nhân viên mới           |   | Quản lý            |
| 18  | u047_TKBanHang                                 | Thống kê bán hàng theo                      | Quản lý            |
|     | do-t/_1 KDaii11aiig                            | ngày hoặc theo thàng                        | Kế toán            |
| 19  | u048_TKDoanhThu                                | Thống kê doanh thu theo                     | Quản lý            |
|     | _ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =        | ngày hoặc theo tháng                        | Kế toán            |
| 20  | u049_TKMuaHang                                 | Thống kê mua hàng theo                      | Quản lý            |
| _ 5 |  | thàng hoặc theo ngày                        | Kế toán            |

| 21                      | u050 TVI uong             | Thống kê lương nhân viên | Quản lý |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|
| 21                      | u050_TKLuong              | theo tháng               | Kế toán |
| 22                      | u051 PhanQuyanSuDung      | Phân quyên các chức năng | O 2 1/- |
| 22 u051_PhanQuyenSuDung | sử dụng cho từng tác nhân | Quản lý                  |         |
|                         |                           |                          | Quản lý |
| 23                      | u052_TCHDBH               | Tra cứu hóa đơn bán hàng | Kế toán |
|                         |                           | Thu ngân                 |         |
| 24                      | u053_TCHDMH               | Tra cứu hóa đơn mua hàng | Quản lý |
| 24                      |                           | Tra cuu noa don mua nang | Kế toán |


#### 3.3.5.2.5 So đồ Usecase

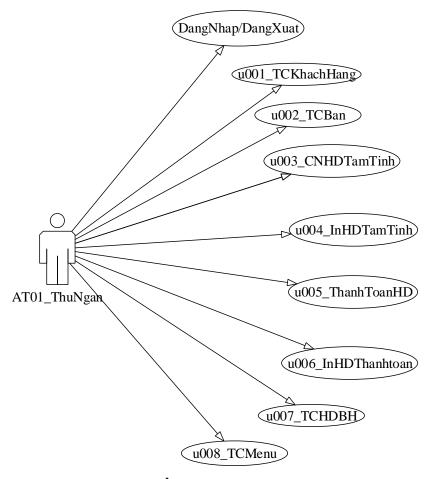


Hình 3.27. Sơ đồ Usecase phân hệ thu ngân

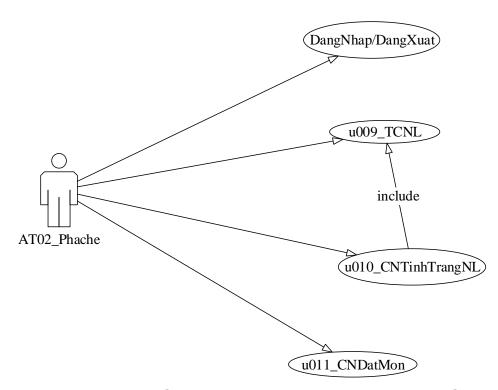


Hình 3.28. Sơ đồ Usecase phân hệ nhân viên pha chế



Hình 3.29. Sơ đồ Usecase phân hệ nhân viên phục vụ

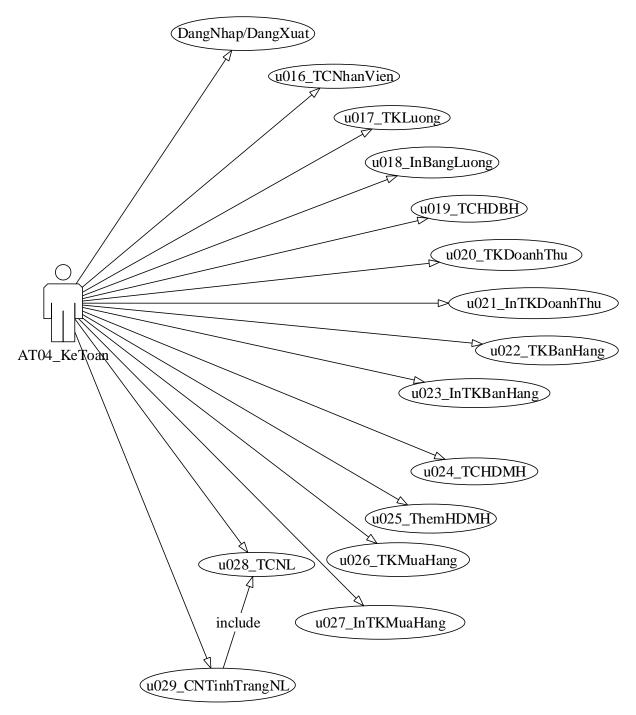


Hình 3.30. Sơ đồ Usecase phân hệ kế toán

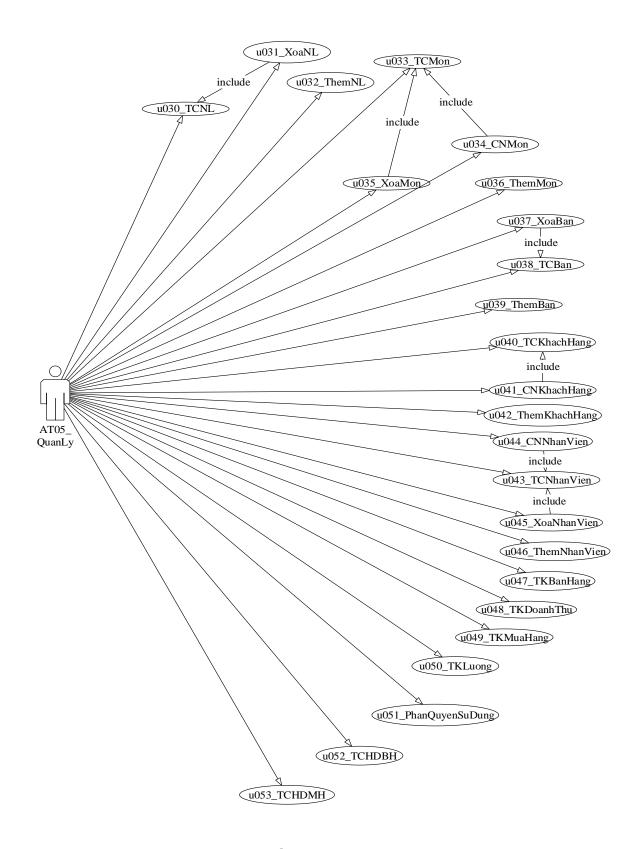

Hình 3.31. Sơ đồ Usecase phân hệ quản lý

#### 3.3.5.2.6 Sơ đồ ERD

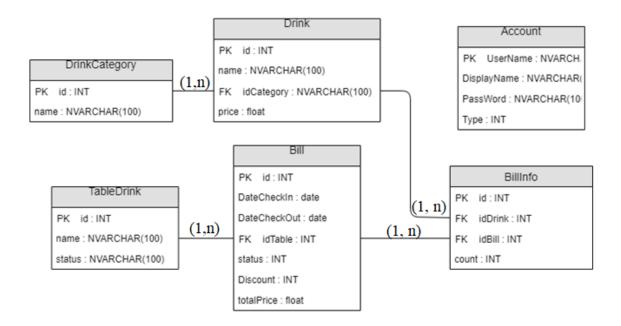

Hình 3.32 Sơ đồ ERD

#### 3.3.5.2.7 Quy trình nghiệp vụ

Đầu tiên, nhân viên phục vụ sẽ order món cho khách hàng trực tiếp trên phần mềm và tạo hóa đơn tạm tính. Lúc này kế toán sẽ nhận được đơn tạm tính và nhân viên pha chế sẽ nhận được đơn đặt món. Khi đơn đặt món đã hoàn thành, nhân viên pha chế cập nhật tình trạng đơn đặt món và nhân viên phục vụ mang ra cho khách hàng.

Khi khách hàng thanh toán hóa đơn có thể trực tiếp tới quầy thu ngân hoặc thanh toán qua nhân viên phục vụ. Khi thanh toán qua nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ sẽ yêu cầu in hóa đơn tạm tính để thanh toán cho khách hàng. Thu ngân thanh toán hóa đơn tạm tính sẽ in hóa đơn mua hàng sau khi thanh toán và đưa lại khách hàng.

Trong quá trình pha chế, nếu nhận thấy cần bổ sung nguyên liệu, pha chế sẽ cập nhật tình trạng nguyên liệu để kế toán bổ sung nguyên liệu.

Kế toán bổ sung đơn mua hàng vào hệ thống đồng thời cập nhật lại tình trạng nguyên liệu, thống kê doanh số ngày và tháng.

### 3.4 Kế hoạch kiểm soát dự án

#### 3.4.1 Kiểm soát kế hoạch thực hiện

#### 3.4.1.1 Quy trình kiểm soát

Người quản lý dự án kiểm soát tiến trình thực hiện dự án tại các mốc kiểm soát, dùng mọi phương pháp để xác định xem các công việc (nói riêng) và toàn bộ dự án (nói chung) hiện đang tiến triển như thế nào.

Người quản lý dự án phải luôn luôn theo dõi sát sao với từng giai đoạn của dự án, tại các thời điểm của các giai đoạn nhất định, các trưởng nhóm sẽ phải báo cáo tiến độ công việc của nhóm mình hoặc của từng cá nhân với người quản lý dự án, trong đó phải nêu bật những điều đã làm được và những điều chưa làm được để người quản lý dự án có một sự điều chỉnh nhất định sao cho hợp lý.

#### - Các mốc kiểm soát

Bảng 3.33. Danh sách các mốc kiểm soát của dự án

| STT | Giai đoạn kết<br>thúc | Ngày báo<br>cáo | Tài liệu                      | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Khởi động             | 26/10/2018      | Nhận dự án và quyết định khởi | PM      |
| 1   | dự án                 |                 | động dự án (văn bản kèm theo) |         |
|     |                       | 30/10/2018      | - Ước lượng dự án.            | PM      |
| 2   | Lập kế hoạch          |                 | - Bản kế hoạch thực hiện dự   |         |
|     | dự án                 |                 | án.                           |         |
|     |                       | 09/11/2018      | - Bản báo cáo khảo sát.       | BA      |
| 3   | Lấy yêu cầu           |                 | - Bản đặc tả yêu cầu khách    |         |
| 3   | khách hàng            |                 | KH.                           |         |
|     |                       |                 | - Báo cáo tiến độ.            |         |
| 1   | Phân tích             | 19/11/2018      | - Bản phân tích hệ thống dựa  | BA      |
| 4   | và thiết kế           |                 | trên yêu cầu KH.              |         |

|   |                         |            | <ul> <li>Bản đặc tả thiết kế (giao diện, module,).</li> <li>Hoàn thành bản phân tích</li> </ul>                               |                             |
|---|-------------------------|------------|---|-----------------------------|
|   |                         |            | thiết kế hệ thống và giao diện theo yêu cầu KH Báo cáo tiến độ.   |                             |
| 5 | Lập trình               | 11/12/2018 | <ul> <li>Báo cáo tiến độ lập trình.</li> <li>Bàn giao module chương trình.</li> </ul>   | Trưởng<br>nhóm<br>lập trình |
| 6 | Kiểm thử                | 19/12/2018 | <ul> <li>Kế hoạch kiểm thử</li> <li>Các kịch bản kiểm thử</li> <li>Các biên bản kiểm thử</li> <li>Báo cáo tiến độ.</li> </ul> | Nhóm<br>Tester              |
| 7 | Chuyển giao<br>sản phẩm | 26/12/2018 | - Source code<br>- Checklist kỹ thuật.  | PM                          |
| 8 | Hỗ trợ kỹ thuật         | 27/12/2018 | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng<br>sản phẩm.   | Nhóm<br>Tester              |
| 9 | Đóng dự án              | 27/12/2018 | - Biên bản bàn giao và thanh lý hợp đồng.   | Nhóm<br>Tester              |

## 3.4.1.2 Diễn biến quá trình thực hiện dự án

Diễn biến quá trình thực hiện dự án được mô tả thông qua các mốc dự án đã xác định. Tại sao mốc kiểm soát sẽ diễn ra các cuộc họp, nhằm xem xét tiến độ thực hiện, các khó khăn cần khắc phục và kế hoạch tiếp theo.

Để theo dõi tiến trình dự án, chúng ta xem xét các biên bản họp dự án tương ứng với các mốc kiểm soát đã chọn.

## - Khởi động dự án:

| Biên bản họp dự án   |   |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|
| Tên Dự án            | Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee   |  |  |  |
| Mã dự án             | CP001   |  |  |  |
| Nội dung công việc   | Quyết định khởi động dự án                          |  |  |  |
| Chủ trì cuộc họp     | Đinh Minh Chí                                       |  |  |  |
| Thư ký               | Trần Hoàng Luân                                     |  |  |  |
|                      | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh                                 |  |  |  |
| Những người tham gia | Huỳnh Thanh Nhàn                                    |  |  |  |
|                      | Nguyễn Văn Duy                                      |  |  |  |
| Thời gian            | 30/10/2018  |  |  |  |
| Địa điểm             | 256 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ    |  |  |  |
| _ ;.v                | Đức, Tp. Hồ Chí Minh.                               |  |  |  |
| Mục đích             | Công bố việc khởi động dự án, dự kiến các công việc |  |  |  |
| 1120 01011           | cần làm, bàn giao kế hoạch tiếp theo.               |  |  |  |

# - Tiến độ hiện tại

| STT | Công việc      | Thực<br>hiện | Kết quả      | Lý do không<br>hoàn thành | Hướng<br>giải quyết |
|-----|----------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------|
|     | Bản phân tích  | Đội phân     | Bản kế hoạch |                           |                     |
| 1   | và thiết kế hệ | tích và      | thực hiện dự |                           |                     |
|     | thống          | thiết kế     | án           |                           |                     |

# - Kế hoạch tiếp theo

| STT | Công việc | Nhóm thực<br>hiện | Kết quả cần đạt   | Thời hạn                   |
|-----|-----------|-------------------|---|----------------------------|
| 1   | Lập trình | Đội lập trình     | - Hoàn thành module chức<br>năng sản phẩm theo yêu<br>cầu khách hàng. | Từ 25/11 đến<br>11/12/2018 |

## - Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu  |  |  |
|-----|-----------|---|--|--|
| 1   | KH/NT01-3 | Bản phân tích chi tiết mô tả hệ thống chức năng và giao diện. |  |  |
| 2   | QÐ/NT01-5 | Biên bản cuộc họp   |  |  |

## - Lập trình:

| Biên bản họp dự án |   |  |  |  |
|--------------------|---|--|--|--|
| Tên Dự án          | Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee |  |  |  |
| Mã dự án           | CP001   |  |  |  |
| Nội dung công việc | Lập trình   |  |  |  |
| Chủ trì cuộc họp   | Đinh Minh Chí                                     |  |  |  |
| Thư ký             | Trần Hoàng Luân                                   |  |  |  |
| Những người tham   | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh                               |  |  |  |
| gia                | Huỳnh Thanh Nhàn                                  |  |  |  |
|                    | Nguyễn Văn Duy                                    |  |  |  |

| Thời gian | 25/11/2018  |
|-----------|---|
| Địa điểm  | 9/7/9, khu phố 5, đường số 7, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. |
| Mục đích  | Hoàn thành chức năng sản phẩm   |

## - Tiến độ hiện tại

| STT | Công việc                        | Thực<br>hiện     | Kết<br>quả | Lý do không<br>hoàn thành | Hướng giải<br>quyết |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------|
| 1   | Module các chức<br>năng sản phẩm | Đội lập<br>trình |            |                           |                     |

# - Kế hoạch tiếp theo

| STT | Công việc                       | Nhóm<br>thực hiện | Kết quả cần đạt  | Thời hạn |
|-----|---------------------------------|-------------------|--|----------|
| 1   | Kiểm thử<br>và khắc<br>phục lỗi | Đội kiểm<br>thử   | Hoàn thiện lại các chức năng<br>sản phẩm đảm bảo chạy ổn<br>định theo yêu cầu khách<br>hàng. |          |

### - Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu               |  |
|-----|-----------|------------------------|--|
| 1   | KH/NT01-4 | Các chức năng sản phẩm |  |
| 2   | QÐ/NT01-6 | Biên bản cuộc họp      |  |

# - Kiểm thử và khắc phục lỗi:

| Biên bản họp dự án   |   |  |
|----------------------|---|--|
| Tên Dự án            | Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee     |  |
| Mã dự án             | CP001   |  |
| Nội dung công việc   | Kiểm thử  |  |
| Chủ trì cuộc họp     | Đinh Minh Chí   |  |
| Thư ký               | Trần Hoàng Luân                                       |  |
|                      | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh                                   |  |
| Những người tham gia | Huỳnh Thanh Nhàn                                      |  |
|                      | Nguyễn Văn Duy  |  |
| Thời gian            | 19/12/2018  |  |
| Đia điểm             | 9/7/9, khu phố 5, đường số 7, phường Linh Chiểu, quận |  |
| Dia alom             | Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.                       |  |
| Mục đích             | Kiểm thử và khắc phục lỗi                             |  |

# - Tiến độ hiện tại

| STT | Công việc                    | Thực hiện       | Kết<br>quả | Lý do<br>không hoàn<br>thành | Hướng giải<br>quyết |
|-----|------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|---------------------|
| 1   | Kiểm thử toàn<br>bộ hệ thống | Đội kiểm<br>thử |            |                              |                     |

# - Kế hoạch tiếp theo

| STT | Công việc                       | Nhóm<br>thực hiện | Kết quả cần đạt  | Thời hạn                           |
|-----|---------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| 1   | Kiểm thử<br>và khắc<br>phục lỗi | Đội kiểm<br>thử   | Hoàn thiện lại các chức năng<br>sản phẩm đảm bảo chạy ổn<br>định theo yêu cầu khách<br>hàng. | Từ 20/12/2018<br>đến<br>24/12/2018 |

## - Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu               |  |
|-----|-----------|------------------------|--|
| 1   | KH/NT01-5 | Các chức năng sản phẩm |  |
| 2   | QÐ/NT01/7 | Biên bản cuộc họp      |  |

## - Tổng kết dự án:

| Biên bản họp dự án   |  |  |
|----------------------|--|--|
| Tên Dự án            | Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee    |  |
| Mã dự án             | CP001  |  |
| Nội dung công việc   | Tổng kết dự án                                       |  |
| Chủ trì cuộc họp     | Đinh Minh Chí  |  |
| Thư ký               | Trần Hoàng Luân                                      |  |
|                      | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh                                  |  |
| Những người tham gia | Huỳnh Thanh Nhàn                                     |  |
|                      | Nguyễn Văn Duy                                       |  |
| Thời gian            | 27/12/2018   |  |
| Địa điểm             | 9/7/9/, khu phố 5, đường số 7, phường Linh Chiểu,    |  |
| 2.55 5.611           | quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.                 |  |
| Mục đích             | Thông qua các báo cáo tổng kết dự và kết thúc dự án. |  |

### Các tài liệu

| STT | Mã số     | Tài liệu               |
|-----|-----------|------------------------|
| 1   | KH/NT01-6 | Báo cáo tổng kết dự án |
| 2   | QÐ/NT01-8 | Biên bản cuộc họp      |

## 3.4.2 Kế hoạch quản lý yêu cầu

 Khi tiếp nhận dự án (mới bắt đầu một dự án hoặc khi bắt đầu một giai đoạn mới của dự án), BA khởi tạo tài liệu quản lý yêu cầu.

- BA ghi nhận lại danh sách các phân hệ và danh sách yêu cầu ngay từ khi mới bắt đầu dự án. Các danh sách này sẽ được BA cập nhật trong suốt quá trình lấy yêu cầu từ khách hàng.
- BA ghi nhận lại danh sách các yêu cầu sau cùng (được khách hàng xác nhận sẽ thực hiện) cùng các thông tin do BA phụ trách (Yêu cầu liên quan, Mã chức năng, Mã quy tắc nghiệp vụ) sau khi hoàn tất giai đoạn lấy yêu cầu. Khi được duyệt baseline tài liệu lần đầu, BA chuyển giao tài liệu này lại cho PM quản lý.
- Mỗi khi baseline tài liệu, người viết tài liệu (tất cả các bộ phận tham gia dự án) phải lấy bản baseline mới nhất của tài liệu này về, cập nhật các phần thay đổi của mình vào và gửi lại cho PM review và cập nhật bản baseline thông qua task Trello.

## 3.4.3 Kế hoạch quản lý quy trình phát triển phần mềm

- Lên schedule tasks.
- Tạo task Trello để phân công Task cho các thành viên.
- Tạo tài khoản Github, cấp quyền cho các thành viên.

## 3.4.3.1 Quy trình mẫu

- Đầu tiên, mô tả các luồng thông tin và các sản phẩm công việc giữa các hoạt động và chức năng.
- Sau đó, xác định thời gian làm việc để sản phẩm được tạo ra.
- Xác định đánh giá được tiến hành.
- O Xác định các cột mốc quan trọng để đạt được.
- Xác định cách tạo và quản lý tài liệu baseline.
- O Xác định các sản phẩm (tài liệu, source code...) của dự án được hoàn thành.
- Xác định phê chuẩn cần thiết trong thời hạn của dự án.
- O Xác định mô hình để phát triển hệ thống.

## 3.4.3.2 Phương pháp, công cụ, công nghệ

## **3.4.3.2.1** Công cụ MS Excel

- Bảng kế hoạch chi tiết dự án

| Công việc  | Thời gian (giờ) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
|--|-----------------|--------------|---------------|
| lệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee                 | 310             | 26/10/2018   | 26/12/2018    |
| . Công tác chuẩn bị                                      | 10              | 26/10/2018   | 30/10/2018    |
| 1.1. Xác định mục tiêu và phạm vi                        | 2               | 26/10/2018   | 26/10/2018    |
| 1.2. Lập bảng mô tả công việc                            | 2               | 27/10/2018   | 27/10/2018    |
| 1.3. Lập đề cương & Bảo vệ đề cương dự án                | 2               | 28/10/2018   | 28/10/2018    |
| 1.4. Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết             | 2               | 29/10/2018   | 29/10/2018    |
| 1.5. Rà soát công tác chuẩn bị & Họp khởi động dụ        | 2               | 30/10/2018   | 30/10/2018    |
| . Phân tích  | 42              | 31/10/2018   | 9-11-2018     |
| 2.1. Thu thập yêu cầu                                    | 8               | 31/10/2018   | 1-11-2018     |
|  | 2               |              |               |
| 2.2. Xác định yêu cầu                                    |                 | 2-11-2018    | 2-11-2018     |
| 2.3. Tổng hợp yêu cầu                                    | 2               | 3-11-2018    | 3-11-2018     |
| 2.4. Phân tích yêu cầu                                   | 8               | 4-11-2018    | 4-11-2018     |
| 2.5. Viết đặc tả   | 8               | 5-11-2018    | 5-11-2018     |
| 2.6. Rà soát khảo sát phân tích                          | 8               | 6-11-2018    | 6-11-2018     |
| 2.7. Xác định nguồn lực                                  | 2               | 7-11-2018    | 7-11-2018     |
| 2.8. Lập kế hoạch thực hiện                              | 2               | 8-11-2018    | 8-11-2018     |
| 2.9. Viết báo cáo phân tích                              | 2               | 9-11-2018    | 9-11-2018     |
| . Phát triển hệ thống                                    | 156             | 10-11-2018   | 9-12-2018     |
| 3.1. Thiết kế hệ thống tổng thế                          | 8               | 10-11-2018   | 11-11-2018    |
| 3.1.1. Thiết kế logic                                    | 8               | 10-11-2018   | 11-11-2018    |
| 3.2. Thiết kế chi tiết các thành phần                    | 72              |              |               |
|  |                 | 12-11-2018   | 18/11/2018    |
| 3.2.1. Thiết kế giao diện                                | 8               | 12-11-2018   | 12-12-2018    |
| 3.2.2. Trang chủ   | 8               |              |               |
| 3.2.3. Chức năng   | 48              | 13/11/2018   | 17/11/2018    |
| 3.2.3.1. Tîm tên đồ uống                                 |                 |              |               |
| 3.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho                              | 8               | 13/11/2018   | 13/11/2018    |
| 3.2.3.3. Thêm đồ uống                                    |                 |              |               |
| 3.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá                         |                 |              |               |
| 3.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho                              | 8               | 14/11/2018   | 14/11/2018    |
| 3.2.3.6. Lập báo cáo                                     |                 |              |               |
| 3.2.3.7. Xem thông tin khách hàng                        |                 |              |               |
| 3.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng                           | 8               | 15/11/2018   | 15/11/2018    |
|  | 16              | 15/11/2010   | 47/44/2040    |
| 3.2.3.9. Quản lý   | 16              | 16/11/2018   | 17/11/2018    |
| 3.2.3.9.1. Quản lý tồn kho                               | 8               | 16/11/2018   | 16/11/2018    |
| 3.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp                          | 8               | 17/11/2018   | 17/11/2018    |
| 3.2.4. Hướng dẫn   |                 |              |               |
| 3.2.5. Liên hệ   | 8               | 18/11/2018   | 18/11/2018    |
| 3.2.6. Tin tức   |                 |              |               |
| 3.3. Lập báo cáo thiết kế                                | 8               | 19/11/2018   | 19/11/2018    |
| 3.4. Xây dựng  | 68              | 20/11/2018   | 11-12-2018    |
| 3.4.1. Thiết kế CSDL                                     | 8               | 20/11/2018   | 24/11/2018    |
| 3.4.1.1 Tạo sơ đồ lớp                                    |                 | 20/11/2018   | 20/11/2018    |
|  | -               |              |               |
| 3.4.1.2. Tạo các bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD            | -               | 21/11/2018   | 22/11/2018    |
| 3.4.1.3. Tạo các ràng buộc                               | _               | 23/11/2018   | 23/11/2018    |
| 3.4.1.4. Lập báo cáo về CSDL                             | 8               | 24/11/2018   | 24/11/2018    |
| 3.4.2. Lập trình   | 60              | 25/11/2018   | 11-12-2018    |
| 3.4.2.1. Cài đặt môi trường                              | 4               | 25/11/2018   | 25/11/2018    |
| 3.4.2.2. Quản trị hệ thống                               | 16              | 26/11/2018   | 01/12/2018    |
| 3.4.2.2.1. Quản lý nhân viên                             | 8               | 26/11/2018   | 28/11/2018    |
| 3.4.2.2.2. Quản lý khách hàng                            | 8               | 29/11/2018   | 01/12/2018    |
| 3.4.2.3. Xử lý chức năng                                 | 40              | 2-12-2018    | 11-12-2018    |
| 3.4.2.3.1. Tîm tên đồ uống                               |                 |              |               |
| 3.4.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho                            | 8               | 2-12-2018    | 3-12-2018     |
| 3.4.2.3.2. Tạo phiều nhập kho<br>3.4.2.3.3. Thêm đồ uống | 1               |              |               |
| · ·  | 8               | 4-12-2018    | 4-12-2018     |
| 3.4.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá thực đơn              |                 |              |               |
| 3.4.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho                            | 8               | 5-12-2018    | 5-12-2018     |
| 3.4.2.3.6. Lập báo cáo                                   |                 |              |               |
| 3.4.2.3.7. Xem thông tin khách hàng                      | 4               | 6-12-2018    | 6-12-2018     |
| 3.4.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng                         | 4               | 7-12-2018    | 7-12-2018     |
| 3.4.2.3.9. Xử lý quản lý                                 | 8               | 8-12-2018    | 11-12-2018    |
| 3.4.2.3.9.1. Quản lý tồn kho                             | 4               | 8-12-2018    | 9-12-2018     |
| 3.4.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp                        | 4               | 10-12-2018   | 11-12-2018    |
| . Kiếm thử   | 52              | 12-12-2018   | 19/12/2018    |
| 4.1. Lập kế hoạch test                                   | 2               | 12-12-2018   | 12-12-2018    |
| 4.2. Viết test case theo yêu cầu                         | 2               | 13/12/2018   | 13/12/2018    |
| 4.3. Test tổng thể                                       | 16              | 14/12/2018   | 15/12/2018    |
|  |                 |              |               |
| 4.4. Test từng thành phần                                | 16              | 16/12/2018   | 17/12/2018    |
| 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê          | 8               | 18/12/2018   | 18/12/2018    |
| 4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử                          | 8               | 19/12/2018   | 19/12/2018    |
| . Nghiệm thu   | 40              | 20/12/2018   | 24/12/2018    |
| 5.1. Lắp đặt phần cứng                                   | 8               | 20/12/2018   | 20/12/2018    |
| 5.2. Cài đặt phần mềm                                    | 8               | 21/12/2018   | 21/12/2018    |
| 5.3. Đưa vào hoạt động                                   | 8               | 22/12/2018   | 22/12/2018    |
| 5.4. Sửa lỗi phát sinh                                   | 8               | 23/12/2018   | 23/12/2018    |
| 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu                              | 8               | 24/12/2018   | 24/12/2018    |
| s.S. Lạp bao cao nghiệm thu<br>. Chuyển giao             |                 |              |               |
|  | 10              | 25/12/2018   | 26/12/2018    |
| 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn                             | 2               | 25/12/2018   | 25/12/2018    |
| 6.2. Đào tạo   | 8               | 26/12/2018   | 26/12/2018    |
| . Bảo trì  | 0               | 27/12/2018   | 27/12/2018    |
| 7.1. Bảo hành định kỳ                                    | 0               | 27/12/2018   | 27/12/2018    |
|  | _               | 27/12/2018   | 27/12/2018    |
| 7.2. Nâng cấp chương trình khi có phiên bản mới          | 0               | 21/12/2010   | 21/12/2010    |

Hình 3.34. Kế hoạch chi tiết của dự án quản lý quán cà phê Will Coffee


# - Nguồn lực công việc: người thực hiện

| Công việc   | Thời gian (giờ)  | Ngày bắt đầu   | Ngày kết thúc  | Người thực hiện   |
|---|--|--|--|---|
| Hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee  | 310  | 26/10/2018   | 26/12/2018   | 01/11/11/11/11/11   |
| Công tác chuẩn bị     1.1. Xác định mục tiêu và phạm vị   | 10   | 26/10/2018   | 30/10/2018   | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy<br>Đinh Minh Chí                               |
| 1.1. Xac dịnh mục tiêu và phạm vi<br>1.2. Lập bảng mô tả công việc  | 2  | 26/10/2018<br>27/10/2018   | 26/10/2018<br>27/10/2018   | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh   |
| 1.3. Lập đề cương & Bảo vệ đề cương dự án   | 2  | 28/10/2018   | 28/10/2018   |   |
| 1.4. Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết  | 2  | 29/10/2018   | 29/10/2018   | Dinh Minh Chí   |
| 1.5. Rà soát công tác chuẩn bị & Họp khởi động dụ   |  | 30/10/2018   | 30/10/2018   | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy  |
| 2. Phân tích  | 42   | 31/10/2018   | 9-11-2018  |   |
| 2.1. Thu thập yêu cầu   | 8  | 31/10/2018   | 1-11-2018  |   |
| 2.2. Xác định yêu cầu   | 2  | 2-11-2018  | 2-11-2018  |   |
| 2.3. Tổng hợp yêu cầu   | 2  | 3-11-2018  | 3-11-2018  |   |
| 2.4. Phân tích yêu cầu  | 8  | 4-11-2018  | 4-11-2018  | Đinh Minh Chí   |
| 2.5. Viết đặc tả  | 8  | 5-11-2018  | 5-11-2018  | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh   |
| 2.6. Rà soát khảo sát phân tích   | 8  | 6-11-2018  | 6-11-2018  | _   |
| 2.7. Xác định nguồn lực   | 2  | 7-11-2018  | 7-11-2018  | 4   |
| 2.8. Lập kế hoạch thực hiện   | 2  | 8-11-2018  | 8-11-2018  | _   |
| 2.9. Viết báo cáo phân tích   | 2<br>156   | 9-11-2018  | 9-11-2018  | Chí, Hanh, Nhàn, Duy  |
| 3. Phát triển hệ thống<br>3.1. Thiết kế hệ thống tổng thế   | 8  | 10-11-2018<br>10-11-2018   | 9-12-2018<br>11-11-2018  | Cili, Hailli, Milali, Duy   |
| 3.1.1. Thiết kế logic   | 8  | 10-11-2018   | 11-11-2018   | Nguyễn Văn Duy  |
| 3.2. Thiết kế chi tiết các thành phần   | 72   | 12-11-2018   | 18/11/2018   | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy  |
| 3.2.1. Thiết kế giao diện   | 8  |  |  |   |
| 3.2.2. Trang chủ  | 8  | 12-11-2018   | 12-12-2018   | Nguyễn Văn Duy  |
| 3.2.3. Chức năng  | 48   | 13/11/2018   | 17/11/2018   | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy  |
| 3.2.3.1. Tìm tên đồ uống  |  | , ,  |  |   |
| 3.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho   | 8  | 13/11/2018   | 13/11/2018   | Đinh Minh Chí   |
| 3.2.3.3. Thêm đồ uống   |  |  |  |   |
| 3.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá  | -  |  |  |   |
| 3.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho   | 8  | 14/11/2018   | 14/11/2018   |   |
| 3.2.3.6. Lập báo cáo  |  |  |  | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh   |
| 3.2.3.7. Xem thông tin khách hàng   | 8  | 15/11/2018   | 15/11/2018   |   |
| 3.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng  |  |  |  | 4   |
| 3.2.3.9. Quản lý  | 16   | 16/11/2018   | 17/11/2018   |   |
| 3.2.3.9.1. Quản lý tồn kho  | 8  | 16/11/2018   | 16/11/2018   | _   |
| 3.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp<br>3.2.4. Hướng dẫn   | 8  | 17/11/2018   | 17/11/2018   | Huỳnh Thanh Nhàn  |
| 3.2.5. Liên hệ  | 8  | 18/11/2018   | 18/11/2018   | Trayini maini Wilani  |
| 3.2.6. Tin tức  | , and the second | 10/11/2010   | 10/11/2010   |   |
| 3.3. Lập báo cáo thiết kế   | 8  | 19/11/2018   | 19/11/2018   | Duy, Hạnh, Nhàn, Chí  |
| 3.4. Xây dựng   | 68   | 20/11/2018   | 11-12-2018   | Chí, Hạnh, Nhàn, Duy  |
| 3.4.1. Thiết kế CSDL  | 8  | 20/11/2018   | 24/11/2018   |   |
| 3.4.1.1. Tạo sơ đồ lớp  |  | 20/11/2018   | 20/11/2018   |   |
| 3.4.1.2. Tạo các bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD   |  | 21/11/2018   | 22/11/2018   | Đinh Minh Chí   |
| 3.4.1.3. Tạo các ràng buộc  |  | 23/11/2018   | 23/11/2018   |   |
| 3.4.1.4. Lập báo cáo về CSDL  | 8  | 24/11/2018   | 24/11/2018   |   |
| 3.4.2. Lập trình  | 60   | 25/11/2018   | 11-12-2018   |   |
| 3.4.2.1. Cài đặt môi trường   | 4  | 25/11/2018   | 25/11/2018   | Huỳnh Thanh Nhàn  |
| 3.4.2.2. Quản trị hệ thống  | 16   | 26/11/2018   | 01/12/2018   | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh   |
| 3.4.2.2.1. Quản lý nhân viên  | 8  | 26/11/2018   | 28/11/2018   |   |
| 3.4.2.2.2. Quản lý khách hàng   | 8  | 29/11/2018   | 01/12/2018   | -14 113   |
| 3.4.2.3. Xử lý chức năng  | 40   | 2-12-2018  | 11-12-2018   | Chí, Hạnh, Nhàn   |
| 3.4.2.3.1. Tìm tên đồ uống  | 8  | 2-12-2018  | 3-12-2018  |   |
| 3.4.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho   |  |  |  | -   |
| 3.4.2.3.3. Thêm đồ uống   | 8  | 4-12-2018  | 4-12-2018  | Đinh Minh Chí   |
| 3.4.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá thực đơn<br>3.4.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho  |  |  |  | -   |
| 3.4.2.3.6. Lập báo cáo  | 8  | 5-12-2018  | 5-12-2018  |   |
| 3.4.2.3.7. Xem thông tin khách hàng   | 4  | 6-12-2018  | 6-12-2018  |   |
| 3.4.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng  | 4  | 7-12-2018  | 7-12-2018  | Dương Huỳnh Mỹ Hạnh   |
| 3.4.2.3.9. Xử lý quản lý  | 8  | 8-12-2018  | 11-12-2018   |   |
| 3.4.2.3.9.1. Quản lý tồn kho  | 4  | 8-12-2018  | 9-12-2018  | Huỳnh Thanh Nhàn  |
| 3.4.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp   | 4  | 10-12-2018   | 11-12-2018   | 7   |
| 4. Kiếm thử   | 52   | 12-12-2018   | 19/12/2018   |   |
| 4.1. Lập kế hoạch test  | 2  | 12-12-2018   | 12-12-2018   | Nguyễn Văn Duy  |
| 4.2. Viết test case theo yêu cầu  |  |  |  | 7   |
| ·   | 2  | 13/12/2018   | 13/12/2018   | _   |
| 4.3. Test tổng thể  | 2<br>16  | 13/12/2018<br>14/12/2018   | 15/12/2018   |   |
| 4.3. Test tổng thể<br>4.4. Test từng thành phần   |  |  |  | Duy, Hạnh, Nhàn   |
| 0   | 16   | 14/12/2018   | 15/12/2018   | Duy, Hạnh, Nhàn   |
| 4.4. Test từng thành phần   | 16<br>16   | 14/12/2018<br>16/12/2018   | 15/12/2018<br>17/12/2018   | Duy, Hạnh, Nhàn<br>Nguyễn Văn Duy                                   |
| 4.4. Test từng thành phần<br>4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê  | 16<br>16<br>8  | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018   | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018   |   |
| 4.4. Test từng thành phần<br>4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê<br>4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử<br>5. Nghiệm thu<br>5.1. Lấp đặt phần cứng  | 16<br>16<br>8<br>8<br>40   | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018   | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>24/12/2018<br>20/12/2018   | Nguyễn Văn Duy  |
| 4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Bảo cáo quá trình kiếm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lắp đặt phần cứng 5.2. Cài đặt phần mềm  | 16<br>16<br>8<br>8<br>40<br>8  | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018   | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>24/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018   | Nguyễn Văn Duy<br>Dương Huỳnh Mỹ Hạnh                               |
| 4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiếm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cài đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động   | 16<br>16<br>8<br>8<br>40<br>8<br>8   | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018   | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>24/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018   | Nguyễn Văn Duy  |
| 4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Bảo cáo quá trình kiểm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cài đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh  | 16<br>16<br>8<br>8<br>40<br>8<br>8<br>8<br>8   | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018   | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>24/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018   | Nguyễn Văn Duy  Dương Huỳnh Mỹ Hạnh                                 |
| 4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lắp đặt phần cứng 5.2. Cái đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phật sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu  | 16<br>16<br>8<br>8<br>8<br>40<br>8<br>8<br>8<br>8  | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018<br>24/12/2018   | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>24/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018<br>23/12/2018<br>24/12/2018   | Nguyễn Văn Duy  Dương Huỳnh Mỹ Hạnh                                 |
| 4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiếm thử 5.Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Câi đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu 6. Chuyến giao  | 16<br>16<br>8<br>8<br>8<br>40<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8   | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018<br>24/12/2018<br>24/12/2018   | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>24/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018<br>24/12/2018<br>24/12/2018<br>24/12/2018   | Nguyễn Văn Duy<br>Dương Huỳnh Mỹ Hạnh<br>Huỳnh Thanh Nhàn           |
| 4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Bảo cáo quá trình kiếm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cải đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu 6. Chuyển giao 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn              | 16<br>16<br>8<br>8<br>8<br>40<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8  | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018<br>24/12/2018<br>24/12/2018<br>25/12/2018   | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>24/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018<br>24/12/2018<br>24/12/2018<br>26/12/2018<br>25/12/2018                             | Nguyễn Văn Duy  Dương Huỳnh Mỹ Hạnh                                 |
| 4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiếm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cài đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu 6. Chuyển giao 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn 6.2. Đào tạo | 16 16 8 8 8 40 8 8 8 8 10 2 8  | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018<br>24/12/2018<br>25/12/2018<br>25/12/2018<br>25/12/2018<br>25/12/2018                             | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>24/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>22/12/2018<br>24/12/2018<br>26/12/2018<br>25/12/2018<br>26/12/2018                             | Nguyễn Văn Duy<br>Dương Huỳnh Mỹ Hạnh<br>Huỳnh Thanh Nhàn           |
| 4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cái đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu 6. Chuyển giao 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn 6.2. Đào tạo 7. Bảo trì    | 16 16 8 8 8 40 8 8 8 8 10 2 8  | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018<br>18/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>22/12/2018<br>24/12/2018<br>25/12/2018<br>25/12/2018<br>25/12/2018<br>25/12/2018<br>26/12/2018<br>26/12/2018 | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>24/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018<br>24/12/2018<br>26/12/2018<br>25/12/2018<br>26/12/2018<br>26/12/2018<br>26/12/2018 | Nguyễn Văn Duy  Dương Huỳnh Mỹ Hạnh Huỳnh Thanh Nhàn  Đinh Minh Chí |
| 4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiếm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cài đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu 6. Chuyển giao 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn 6.2. Đào tạo | 16 16 8 8 8 40 8 8 8 8 10 2 8  | 14/12/2018<br>16/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>20/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>23/12/2018<br>24/12/2018<br>25/12/2018<br>25/12/2018<br>25/12/2018<br>25/12/2018                             | 15/12/2018<br>17/12/2018<br>18/12/2018<br>19/12/2018<br>24/12/2018<br>20/12/2018<br>21/12/2018<br>22/12/2018<br>22/12/2018<br>24/12/2018<br>26/12/2018<br>25/12/2018<br>26/12/2018                             | Nguyễn Văn Duy<br>Dương Huỳnh Mỹ Hạnh<br>Huỳnh Thanh Nhàn           |

Hình 3.35 Nguồn lực công việc của dự án


#### 3.4.3.2.2 Công cụ Trello, Github

- Quản lý công việc bằng Trello

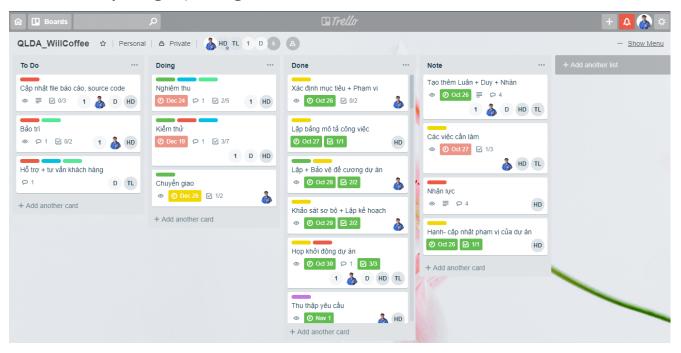

Hình 3.36.1 Quản lý công việc bằng Trello

- Quản lý source code bằng Github




Hình 3.36.2 Quản lý source code bằng Github

## 3.4.3.3 Cơ sở hạ tầng

- Quán cà phê Will Coffe có diện tích 30x40 m².
- Gồm 9 bộ phận: Bộ phận pha chế; Bộ phận thu ngân; Khu vực khách uống; Nhà vệ sinh cho khách; Nhà vệ sinh cho nhân viên; Phòng quản lý; Phòng kế toán; Phòng nghỉ nhân viên; Kho nguyên liệu.

## - Sơ đồ mặt bằng

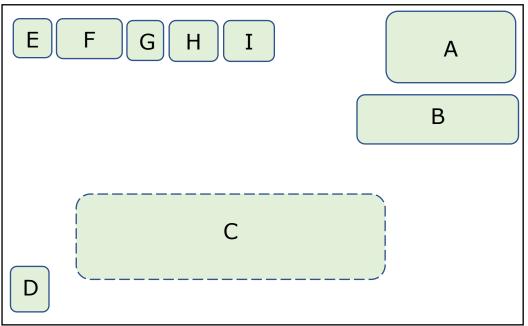

Hình 3.37. Sơ đồ mặt bằng quán cà phê Will Coffee

## Trong đó:

- A: Bộ phận pha chế.
- B. Bộ phận thu ngân.
- C. Khu vực khách uống.
- D: Nhà vệ sinh cho khách.
- E: Nhà vê sinh cho nhân viên.
- F: Phòng quản lý.
- G: Phòng kế toán.
- H: Phòng nghỉ nhân viên.
- I: Kho nguyên liệu.

## 3.4.3.4 Xác nhận yêu cầu người dùng

- Lập kế hoạch gửi tài liệu yêu cầu người dùng

Bảng 3.38. Danh sách sản phẩm bàn giao

| STT | Hạng mục                  | Thời gian Địa điểm |             | Ghi chú    |
|-----|---------------------------|--------------------|-------------|------------|
|     |                           | chuyển giao        | chuyển giao |            |
| 1   | Tài liệu phân tích và     | 10/11/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | thiết kế hệ thống         |                    | Coffee      | email      |
| 2   | Tài liệu danh sách giao   | 18/11/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | diện                      |                    | Coffee      | email      |
| 3   | Tài liệu đặc tả yêu cầu   | 9/11/2018          | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | SRS                       |                    | Coffee      | email      |
| 4   | Tài liệu thư viện dữ liệu | 24/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     |                           |                    | Coffee      | email      |
| 5   | Tài liệu hướng dẫn sử     | 25/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | dụng                      |                    | Coffee      | email      |
| 6   | Tài liệu hướng dẫn cài    | 25/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | đặt                       |                    | Coffee      | email      |
| 7   | Tài liệu kỹ thuật         | 25/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     |                           |                    | Coffee      | email      |
| 8   | Biên bản nghiệm thu       | 24/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     |                           |                    | Coffee      | email      |
| 9   | Phần mềm, hệ thống        | 26/12/2018         | Quán Will   | Chuyển qua |
|     | ứng dụng hoàn thiện       |                    | Coffee      | email      |

## 3.4.3.5 Nghiệm thu sản phẩm

Lập kế hoạch bàn giao sản phẩm, điền thông tin vào
 0118\_UIT\_MaDuAn\_NghiemThuHDKT-[sohopdong].doc.

Sử dụng biên bản nghiệm thu để các bên ký xác nhân.

## 3.4.4 Kiểm tra chất lượng sản phẩm

## 3.4.4.1 Quản lý chất lượng

## a) Lập kế hoạch chất lượng

- Bộ phận: Tổ quản lý chất lượng
- Dự án: Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee.
- Chịu trách nhiệm: Trần Hoàng Luân.
- Vai trò: Tổ trưởng tổ quản lý chất lượng.
- Quyết định tiêu chuẩn:

#### + Tính chức năng:

- O Phù hợp với các yêu cầu của khách hàng quán cà phê Will Coffee.
- O Phải đưa ra kết quả chính xác với hiệu quả cao.
- Phân quyền đăng nhập cho hệ thống, người có tài khoản mới được đăng nhập vào hệ thống.

## + Tính tin cậy:

- O Phải phục hồi được dữ liệu khi dữ liệu bị mất.
- O Phần mềm phải thỏa mãn các tiêu chuẩn, dễ cài đặt.

## + Tính hiệu quả:

- O Phần mềm phải hoạt động hiệu quả, thời gian xử lý nhanh.
- Sử dụng hợp lý tài nguyên hệ thống.

## + Khả năng bảo hành, bảo trì:

- Bộ phận tester và lập trình viên đảm bảo phần mềm có thể phân tích và sửa chữa khi gặp lỗi.
- Đảm bảo phần mềm có thể bảo trì, sửa chữa khi khách hàng gặp sự cố trong thời gian bảo hảnh.

## + Tính khả chuyển:

Phần mềm chỉ thích với hê điều hành window.

#### + Tính khả dụng:

- Phần mềm phải có giao diện dễ hiểu và dễ sử dụng.
- o Khách hàng (người dùng) có thể học được.
- Bộ phận Tester (Nguyễn Văn Duy) có vai trò rà soát tất cả các kết quả chuyển giao công việc.

## Phương pháp Quản lý chất lượng: Theo ISO/IEC 14598.

Quy trình đánh giá chất lượng:



Hình 3.39. Sơ đồ quy trình đánh giá chất lượng

## 3.4.4.2 Thiết lập khung đảm bảo chất lượng

Các phương pháp luận, tiêu chuẩn hướng dẫn hợp lý.

Quy trình kiểm soát thay đổi hiệu quả với đội ngũ lập trình viên và tester ưu tú.

Tập trung rà xét các hoạt động kiểm soát chất lượng.

Bảng 3.40. Danh sách các hoạt động đảm bảo chất lượng của dự án

| Hoạt động đảm<br>bảo chất lượng            | Công tác đảm bảo chất lượng   | Thực hiện                            |
|--|---|--------------------------------------|
| Kiểm tra và đánh                           | Kiểm tra tính đúng đắn của các tài  | -Trần Hoàng Luân                     |
| giá các tài liệu dự                        | liệu dự án, kế hoạch quản lý rủi ro,  | -Đinh Minh Chí                       |
| án   | kế hoạch thử nghiệm, kế hoạch quản lý cấu hình, kế hoạch quản lý chất lượng, yêu cầu hệ thống kỹ thuật, thiết kế hệ thống, hệ thống testcase và hội nhập testcase | -Nguyễn Văn Duy                      |
| Kiểm tra và đánh                           | Kiểm tra tiến trình làm việc đúng   | - Đinh Minh Chí                      |
| giá tiến trình làm<br>việc của dự án       | theo các yêu cầu, công thức và yêu cầu chuẩn của công ty.   | - Trần Hoàng Luân                    |
| Đo lường chất<br>lượng cho dự án           | Dùng các công thức tính độ đo cho<br>dự án để xem xét chất lượng dự án<br>trước mỗi lần giao cho khách hàng.  | - Trần Hoàng Luân                    |
| Đánh giá và báo<br>cáo chất lượng<br>dự án | Báo cáo chất lượng dự án dựa trên các độ đo.  | - Trần Hoàng Luân<br>- Đinh Minh Chí |

## 3.4.4.3 Kiểm soát chất lượng

Đinh Minh Chí (PM) sẽ lập văn bản để kiểm soát chất lượng.

- Rà sóat các nhóm lập trình của Dương Huỳnh Mỹ Hạnh, Huỳnh Thanh Nhàn.
- Khảo sát người sử dụng phần mềm, đưa ra các câu hỏi phỏng vấn.

#### 3.4.5 Báo cáo dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, nếu phát sinh những vấn đề của dự án quá lớn,
 ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án thì PM yêu cầu họp dự án bao gồm
 các thành viên trong dự án → đưa ra cách giải quyết.


## Triển khai các hoạt động hiệu chỉnh:

- Giai đoạn đầu tháng 12, dự án đã diễn ra không theo kế hoạch, chất lượng phần mềm chưa đạt yêu cầu.
- Điều chỉnh: Thuê chuyên gia Trần Sang 1 ngày với chi phí 500 nghìn/1 ngày.
- Giai đoạn giữa tháng 12, bộ phận tester làm việc vất vả, không kịp cho tiến độ.
- Điều chỉnh: Trần Hoàng Luân (BA) sang hỗ trợ bộ phận Tester cho Nguyễn Văn
   Duy.

#### 3.5 Kế hoạch quản lý rủi ro

- Tuân thủ Quy trình quản lý rủi ro.

#### 3.5.1 Quá trình quản lý rủi ro trong khảo sát thực hiện dự án

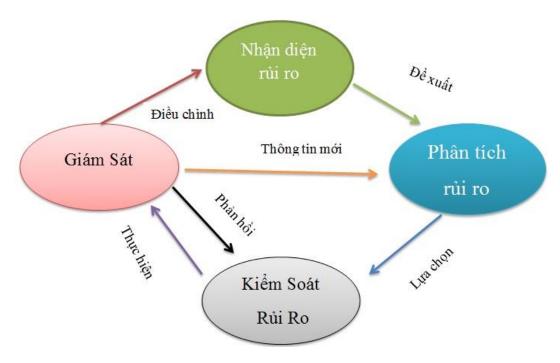

Hình 3.41. Sơ đồ quá trình quản lý rủi ro trong khảo sát thực hiện dự án

## 3.5.2 Lập biểu phân tích rủi ro của dự án

#### 3.5.2.1 Khách hàng

Bảng 3.42. Rủi ro liên quan đến khách hàng

| STT | Mô tả  | Mức độ | Hậu quả | Xử lý  |
|-----|--|--------|---------|--|
| 1   | Nhân viên, quản lý<br>không biết sử dụng phần<br>mềm | Cao    | Cao     | Tổ chức huấn luyện sử dụng.                      |
| 2   | Cơ sở hạ tầng  | Thấp   | Cao     | Hầu như không phải thay đổi gì về cơ sở hạ tầng. |
| 3   | Thay đổi cơ cấu tổ chức                              | Thấp   | Thấp    | Hầu như không có ảnh hưởng gì.                   |
| 4   | Trình độ tin học của người dùng                      | Thấp   | Cao     | Viết phần mềm                                    |

## **3.5.2.2** Phương án

Bảng 3.43. Rủi ro liên quan về phương án

| STT | Mô tả                  | Mức độ | Hậu quả | Xử lý                |
|-----|------------------------|--------|---------|----------------------|
| 1   | Bên triển khai đề án   | Trung  | Trung   | Cần có sự hỗ trợ của |
| 1   | không nắm rõ nghiệp vụ | bình   | bình    | khách hàng           |
| 2   | Kinh phí phát sinh quá | Thấp   | Cao     | Lựa chọn phương án   |
| 2   | lớn                    | тпар   | Cao     | hợp lý               |

#### 3.5.2.3 Nhân sự

Bảng 3.44. Rủi ro liên quan đến nhân sự

| STT | Mô tả                             | Mức độ | Hậu quả | Xử lý   |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---|
| 1   | Không thực hiện kịp tiến độ dự án | Cao    | Cao     | Cần lên kế hoạch rõ<br>ràng, cụ thể   |
| 2   | Mối quan hệ giữa các thành viên   | Thấp   | Cao     | Gặp gỡ hàng ngày,<br>có sự phân công<br>công việc rõ ràng,<br>thêm hoạt động kết<br>nói thành viên. |

## **3.5.2.4 Môi trường**

Bảng 3.45. Phương án trong quản lý rủi ro liên quan đến khách hàng

| STT | Mô tả  | Mức độ | Hậu quả       | Xử lý                         |
|-----|--|--------|---------------|-------------------------------|
| 1   | Cạnh tranh với các phần<br>mềm quản lý quán cà phê<br>hiện có sẵn tại trường | Thấp   | Trung<br>bình | Xây dựng phần mềm chất lượng. |

## 3.6 Kế hoạch chọn lựa giải pháp

#### 3.6.1 Lập phương án

## 3.6.1.1 Phương án tối thiểu

- Về phần cứng: Sử dụng các thiết bị máy tính hiện tại.

## - Về phần mềm:


- Sử dụng hệ điều hành win 7 cài sẵn trên các máy tính tiền và hệ điều hành
   Windows 8.1 cài sẵn trên máy chủ.
- o Sử dụng bộ gõ Unikey 4.2.
- o Sử dụng CSDL SQL Server 2012.

## - Về người dùng:

 Người dùng được phép sử dụng phần mềm với các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.

#### - Công nghệ sử dụng:

- Sử dụng công nghệ .Net viết bằng ngôn ngữ C# để thực hiện các chức năng như: hiển thị thông tin, xử lý thông tin theo nghiệp vụ, trao đổi thông tin, cho phép thanh toán. Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server Express 2014 để trữ thông tin.
- Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng:

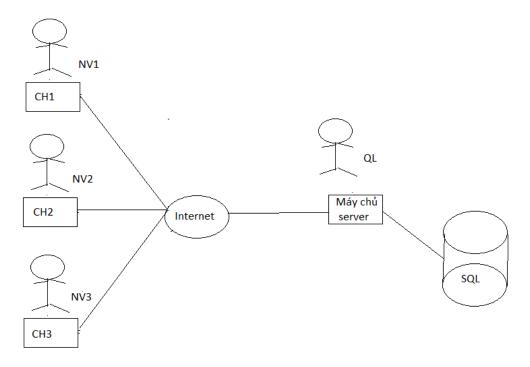


Hình 3.46. Sơ đồ các thành phần của hệ thống quản lý bán hàng theo phương án tối thiểu

- Ước lượng chi phí:
- + Chi phí phần cứng: 0 VND.
- + Chi phí phần mềm:
  - O Phần mềm hỗ trợ quản lý cửa hàng: 5 triệu VND.
  - o Phần mềm khác: 0 VND.
- + Chi phí huấn luyện: 300 nghìn VND.
- + Chi phí khác (điện, bảo trì....): 1 triệu VND/ tháng do sử dụng thiết bị liên tục trong ngày.
- Ưu, khuyết điểm:
  - + Ưu điểm:
- O Sử dụng CSDL SQL Server 2014 để lưu trữ dữ liệu đơn giản, dễ dàng thao tác.
- o Sử dụng được các thiết bị máy tính hiện tại.
- O Phần mềm tiện dụng, giao diện đơn giản giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác.
  - + Nhược điểm:
- o Người dùng phải sử dụng thiết bị tại cửa hàng.

- Sử dụng CSDL SQL Server 2012 không truy xuất được lượng dữ liệu lớn, tốn kém chi phí khi mở rộng, tốc độ truy cập chậm hơn.
- O Không có internet sẽ không kết nối được phần mềm.

## **3.6.1.2** Phương án đề xuất 1

- Về phần cứng:
- O Sử dụng các thiết bị máy tính hiện tại.
- O Người dùng có thể sử dụng ứng dụng bằng các thiết bị cá nhân.
  - Về phần mềm:
- Sử dụng hệ điều hành win 7 cài sẵn trên các máy tính tiền và hệ điều hành Windows 8.1 cài sẵn trên máy chủ.
- o Sử dụng bộ gõ Unikey 4.2.
- o Sử dụng CSDL MySQL.
  - Về người dùng:
- Người dùng được phép sử dụng phần mềm với các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.
- Người dùng có thể từ bên ngoài truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.
  - *Công nghệ sử dụng:* Sử dụng công nghệ PHP, Javascript viết trên Web để thực hiện các chức năng như: hiển thị thông tin, xử lý thông tin theo nghiệp vụ, trao đổi thông tin, cho phép thanh toán. Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin.
  - Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng:

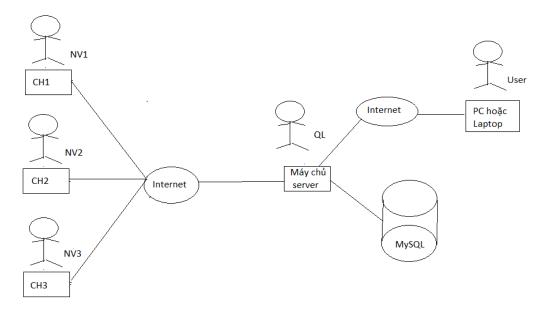


Hình 3.47. Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng theo phương án đề xuất 1

- Ước lượng chi phí:
- + Chi phí phần cứng: 0 VND.
- + Chi phí phần mềm:
  - o Úng dụng hỗ trợ quản lý cửa hàng: 4 triệu VND.
  - o Phần mềm khác: 0 VND.
- + Chi phí huấn luyện: 200 nghìn VND.
- + Chi phí khác (điện, bảo trì....): 1 triệu VND/ tháng do sử dụng thiết bị liên tục trong ngày.
- Ưu, khuyết điểm:
- + Ưu điểm:
- o Sử dụng CSDL MySQL để lưu trữ dữ liệu đơn giản, dễ dàng thao tác.
- O Sử dụng được các thiết bị máy tính hiện tại.
- Úng dụng Website tiện dụng, giao diện đơn giản giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác.
- Người dùng có thể sử dụng phần mềm bằng máy tính cá nhân ở bên ngoài cửa hàng.
- + Nhược điểm:

- Sử dụng công nghệ PHP là mã nguồn mở và miễn phí nên độ bảo mật không cao,
   chỉ chạy được trên ứng dụng web.
- o CSDL MySQL có độ bảo mật chưa cao, quá trình Restore có phần chậm chạp.
- O Không có internet sẽ không kết nối được phần mềm.
- o Úng dụng chiếm nhiều băng thông.

## 3.6.1.3 Phương án đề xuất 2

- Về phần cứng:
- O Sử dụng các thiết bị máy tính hiện tại.
- O Người dùng có thể sử dụng ứng dụng bằng các thiết bị cá nhân.
  - Về phần mềm:
- Sử dụng hệ điều hành win 7 cài sẵn trên các máy tính tiền và hệ điều hành
   Windows 8.1 cài sẵn trên máy chủ.
- o Sử dụng bộ gõ Unikey 4.2.
- o Sử dụng CSDL MySQL.
  - Về người dùng:
- Người dùng được phép sử dụng phần mềm với các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.
- Người dùng có thể từ bên ngoài truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.
  - *Công nghệ sử dụng:* Sử dụng công nghệ PHP, Javascript kết hợp với framework Angular viết trên Web để thực hiện các chức năng như: hiển thị thông tin, xử lý thông tin theo nghiệp vụ, trao đổi thông tin, cho phép thanh toán. Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin.
  - Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng:

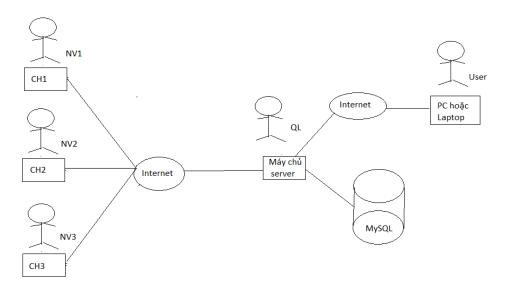

Hình 3.48. Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng theo phương án đề xuất 2

#### - Ước lượng chi phí:

- + Chi phí phần cứng: 0 VND.
- + Chi phí phần mềm:
  - o Úng dụng hỗ trợ quản lý cửa hàng: 7 triệu VND.
  - o Phần mềm khác: 0 VND.
- + Chi phí huấn luyện: 200 nghìn VND.
- + Chi phí khác (điện, bảo trì....): 1 triệu VND/ tháng do sử dụng thiết bị liên tục trong ngày.

## - Ưu, khuyết điểm:

- + Ưu điểm:
- O Sử dụng CSDL MySQL để lưu trữ dữ liệu đơn giản, dễ dàng thao tác.
- o Sử dụng được các thiết bị máy tính hiện tại.
- Úng dụng Website tiện dụng, giao diện đơn giản giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác.
- Người dùng có thể sử dụng phần mềm bằng máy tính cá nhân ở bên ngoài cửa hàng.

- Angular có thể chạy trên hầu hết các trình duyệt điện thoại thông minh, sử dụng data bind giống .NET với tính năng liên kết với HTML nên giúp người dùng cảm thấy dễ chịu, tương thích nhiều phiên bản trình duyệt web.
- + Nhươc điểm:
- O Sử dụng công nghệ PHP là mã nguồn mở và miễn phí nên độ bảo mật không cao.
- o CSDL MySQL có độ bảo mật chưa cao, quá trình Restore có phần chậm chạp.
- O Không có internet sẽ không kết nối được phần mềm.
- o Úng dụng chiếm nhiều băng thông.
- Angular được phát triển từ javascript nên nó không an toàn, phía máy chủ phải thường xuyên xác nhận quyền để hệ thống chạy tron tru.

## 3.6.1.4 Phương án tối đa

## - Về phần cứng:

- O Sử dụng các thiết bị máy tính hiện tại.
- O Người dùng có thể sử dụng ứng dụng bằng các thiết bị cá nhân.

## - Về phần mềm:

- Sử dụng hệ điều hành win 7 cài sẵn trên các máy tính tiền và hệ điều hành Windows 8.1 cài sẵn trên máy chủ.
- O Sử dụng bộ gõ Unikey 4.2.
- o Sử dụng CSDL Oracle.


## - Về người dùng:

- Người dùng được phép sử dụng phần mềm với các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.
- Người dùng có thể từ bên ngoài truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.

## - Công nghệ sử dụng:

Sử dụng công nghệ ASP.Net viết trên Webform để thực hiện các chức năng như: hiển thị thông tin, xử lý thông tin theo nghiệp vụ, trao đổi thông tin, cho phép thanh toán. Sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle để lưu trữ thông tin.

- O Sử dụng API quét mã vạch.
  - Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng:

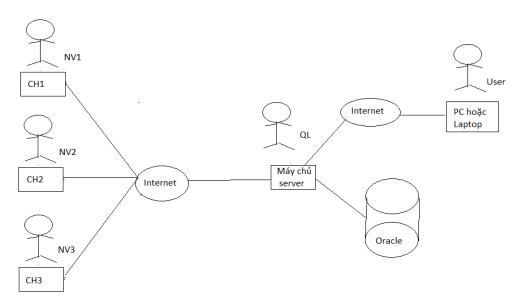

Hình 3.49. Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng theo phương án tối đa

- Ước lượng chi phí:
- + Chi phí phần cứng: 4 triệu VND/ cửa hàng.
- + Chi phí phần mềm:
  - Úng dụng hỗ trợ quản lý cửa hàng: 20 triệu VND do áp dụng các công nghệ mới như Oracle với những tính năng hỗ trợ lượng người dùng lớn, dữ liệu lưu trữ không tập trung, tính an toàn, bảo mật cao, cho phép user truy nhập tới CSDL phân tán như một khối thống nhất, cài đặt được trên đa hệ điều hành.
  - o Phần mềm khác: Oracle 10 Enterprise Edition 40USD.
- + Chi phí huấn luyện: 200 nghìn VND.
- + Chi phí khác (điện, bảo trì....): 1 triệu VND/ tháng do sử dụng thiết bị liên tục trong ngày.
- Ưu, khuyết điểm:
- + Ưu điểm:
- O Quản lý được cơ sở dữ liệu, hệ thống rất lớn.

- Phần mềm Oracle được tích hợp tất cả các công cụ để quản trị cũng như nhập xuất dữ liệu nên rất tiện lợi cho người quản trị.
- O Có thể cài đặt trên đa hệ điều hành.
- O Sử dụng được các máy tính hiện có.
- Người dùng có thể sử dụng máy vào bất kỳ địa điểm và thời gian nào thích hợp với mình.
- o Dễ dàng kiểm soát người dùng.
- + Nhược điểm:
- Phí bản quyền rất đắt.
- o Hệ thống chiếm nhiều băng thông.
- O Thời gian cài đặt lâu, chi phí cao.
- O Không tương thích với các công nghệ của Microsoft.
- O Công cụ thiết kế và lập trình không phổ biến (Sử dụng ngôn ngữ Java).
- O Phải có internet mới kết nối được phần mềm.

#### 3.6.2 Các lựa chọn phương án

- Phương án được chọn lựa là phương án đề xuất thứ 1 vì nó thỏa những tiêu chí sau:
- + Có thể sử dụng máy tính cá nhân để quản lý, xem thông tin cá nhân.
- + Giúp người dùng có thể sử dụng hệ thống với giao diện đơn giản, dễ thao tác.
- + Dễ bảo trì và mở rộng thêm chức năng.
- + Có thể truy cập bất kì đâu với điều kiện nơi đó phải có internet.
- + Chi phí đầu tư thấp.

## 3.7 Kế hoạch quản lý cấu hình (CM)

## 3.7.1 Quy định

- BA Trần Hoàng Luân là ngươi chịu trách nhiệm về quản lý cấu hình.
- Có một kho quản lý cấu hình được đặt tại văn phòng dự án.

- BA sẽ bổ sung các điều khoản mới vào kho cấu hình.

## 3.7.2 Xác định cấu hình

- Đơn vị cấu hình:
  - Bao gồm tài liệu, phần mềm phát triển, thông tin về phần mềm hệ thống.
- Ví dụ cụ thể như sau:

Bảng 3.50. Danh các tài liệu mẫu

| STT | Loại tài<br>liệu | Tên tài liệu                          | Mã số tài liệu |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1   | Doc              | Quản lý dự án                         |                |
| 2   | Doc              | Thông tin về quán cà phê Will Coffee. |                |
| 3   | SW               | Source code C#                        |                |
| 4   | Pdf              | Lập trình C# .Net                     |                |

## 3.7.3 Cấu hình sản phẩm (baseline)

Là một tập hợp các phiên bản của các đơn vị cấu hình có quan hệ logic chặt chẽ với nhau tạo thành một trạng thái sản phẩm và được phê duyệt.

Thời điểm baseline được xác định căn cứ vào các giai đoạn thực hiện dự án. Ví dụ về baseline:

Bảng 3.51. Danh sách các baseline ID

| Baseline ID | Giai đoạn                       |
|-------------|---------------------------------|
| STARTUP     | Khởi tạo dự án                  |
| SRS         | Phân tích và lập kế hoạch dự án |
| CODE        | Hoàn thành code                 |
| PRODUCT     | Bàn giao cho khách hàng         |

#### 3.7.4 Lưu trữ cấu hình

Có ít nhất 3 loại thư mục với quyền truy xuất phù hợp.

- Thư mục phát triển dùng để phát triển sản phẩm.
- Thư mục kiểm soát dùng để lưu các phiên bản của cấu hình.
- Thư mục lưu trữ lưu các cấu hình.

## 3.7.5 Quyền truy xuất

Bảng 3.52. Quyền truy xuất trong hệ thống của nhân viên

| Nhân viên  | Quyền<br>truy<br>xuất     | Ðọc | Chèn | Thay thế | Xóa |
|--|---------------------------|-----|------|----------|-----|
| Lập trình viên (Huỳnh<br>Thanh Nhàn, Dương<br>Huỳnh Mỹ Hạnh) | Thư viện<br>phát<br>triển | Y   | Y    | Y        | Y   |
|  | Thư viện<br>tổng thể      | N   | N    | N        | N   |
|  | Thư viện<br>lưu trữ       | N   | N    | N        | N   |
| Người quản lý<br>cấu hình<br>(Trần Hoàng Luân)               | Thư viện<br>phát<br>triển | Y   | Y    | Y        | Y   |
|  | Thư viện<br>tổng thể      | Y   | Y    | N        | N   |

| Nhân viên | Quyền<br>truy<br>xuất | Ðọc | Chèn | Thay thế | Xóa |
|-----------|-----------------------|-----|------|----------|-----|
|           | Thư viện<br>lưu trữ   | Y   | N    | N        | N   |

## 3.8 Kế hoạch quản lý dữ liệu

- Lập danh sách tài liệu theo dự án.
- Lập kế hoạch kiểm tra tài liệu theo Quy trình kiểm tra.
- Lập kế hoạch lưu trữ tài liệu theo Quy định quản lý cấu hình.
- Tuân thủ Quy trình quản lý thay đổi.

## 3.9 Kế hoạch quản lý thay đổi

- Các thành viên sẽ cập nhật các nội dung vào báo cáo và lưu lại lịch sử thay đổi.

Bảng 3.53. Lịch sử thay đổi

| Người thực hiện | Ngày thực hiện | Nội dung                        | Phiên |
|-----------------|----------------|---------------------------------|-------|
|                 |                |                                 | bản   |
| Đinh Minh Chí   | 26/10/2018     | Tạo tài liệu, cập nhật phần xác | 1.0.0 |
|                 |                | định mục tiêu và phạm vi.       |       |
| Dương Huỳnh     | 27/10/2018     | Cập nhật phần Lập bảng mô tả    | 1.0.1 |
| Mỹ Hạnh         |                | công việc.                      |       |
| Đinh Minh Chí   | 28/12/2018 đến | Cập nhật phần Lập đề cương      | 1.0.2 |
|                 | 29/12/2018     | và kế hoạch chi tiết.           |       |
| Đinh Minh Chí + | 30/10/2018 đến | Cập nhật phần Phân tích và xác  | 1.0.3 |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 09/11/2018     | định yêu cầu, lập kế hoạch      |       |
| Hạnh            |                | thực hiện, viết báo cáo.        |       |

| Dương Huỳnh Mỹ  | 10/11/2018 đến | Thiết kế logic.                 | 1.0.4  |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Hạnh            | 11/11/2018     |                                 |        |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 12/11/2018     | Cập nhật phần Thiết kế giao     | 1.0.5  |
| Hạnh            |                | diện và trang chủ.              |        |
| Đinh Minh Chí   | 13/11/2018     | Cập nhật phần Thiết kế chức     | 1.0.6  |
|                 |                | năng tìm tên đồ uống, tạo       |        |
|                 |                | phiếu nhập kho, thêm đồ uống.   |        |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 14/11/2018 đến | Cập nhật phần chức năng: tạo    | 1.0.7  |
| Hạnh            | 17/11/2018     | phiếu xuất kho, cập nhật và in  |        |
|                 |                | bảng giá, lập báo cáo, xem      |        |
|                 |                | thông tin khách hàng, xem chi   |        |
|                 |                | tiết đơn hàng, quản lý tồn kho, |        |
|                 |                | quản lý nhà cung cấp.           |        |
| Đinh Minh Chí + | 19/11/2018     | Cập nhật phần lập báo cáo thiết | 1.0.8  |
| Dương Huỳnh Mỹ  |                | kế.                             |        |
| Hạnh            |                |                                 |        |
| Đinh Minh Chí   | 20/11/2018 đến | Cập nhật phần Thiết kế cơ sở    | 1.0.9  |
|                 | 24/11/2018     | dữ liệu: tạo sơ đồ lớp, tạo các |        |
|                 |                | bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD,   |        |
|                 |                | tạo các ràng buộc, lập báo cáo  |        |
|                 |                | về CSDL.                        |        |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 25/11/2018 đến | Cập nhật phần Lập trình: cài    | 1.0.10 |
| Hạnh            | 01/12/2018     | đặt môi trường, quản trị hệ     |        |
|                 |                | thống nhân viên, khách hàng.    |        |
| Đinh Minh Chí + | 02/12/2018 đến | Cập nhật phần Lập trình: xử lý  | 1.0.11 |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 11/12/2018     | chức năng tìm tên đồ uống, tạo  |        |
| Hạnh            |                | phiếu nhập kho, thêm đồ uống,   |        |

|                 |                | tạo phiếu xuất kho, lập báo   |        |
|-----------------|----------------|-------------------------------|--------|
|                 |                | cáo, xem thông tin khách hàng |        |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 12/12/2018 đến | Cập nhật phần kiểm thử        | 1.0.12 |
| Hạnh            | 19/12/2018     |                               |        |
| Đinh Minh Chí + | 20/12/2018 đến | Cập nhật phần nghiệm thu      | 1.0.13 |
| Dương Huỳnh Mỹ  | 24/12/2018     |                               |        |
| Hạnh            |                |                               |        |
| Đinh Minh Chí   | 25/12/2018 đến | Cập nhật phần chuyển giao +   | 1.0.14 |
|                 | 27/12/2018     | bảo trì                       |        |
| Đinh Minh Chí + | 27/12/2018     | Cập nhật phần hỗ trợ          | 1.0.15 |
| Dương Huỳnh Mỹ  |                |                               |        |
| Hạnh            |                |                               |        |

## 3.10 Kế hoạch quản lý các bên liên quan

- Sau khi nhận đơn đặt hàng:
  - Lập bảng có liên quan đến dự án (trực tiếp và gián tiếp).
  - O Gán vai trò và mô tả trách nhiệm của từng vai trò.
  - o Lấy thông tin liên hệ.
- Lưu danh sách nhân sự lên issue đặt chương trình.
- Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có thay đổi về nhân sự thì cập nhật theo Quy trình quản lý thay đổi và baseline tài liệu theo Quy định quản lý cấu hình.

## 3.11 Kế hoạch kết thúc dự án

## 3.11.1 Kế hoạch hỗ trợ dự án: hỗ trợ UAT, hỗ trợ sau golive

Bảng 3.54. Kế hoạch hỗ trợ dự án

| STT | Nội dung                   | Thời gian hỗ trợ      |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 1   | Hỗ trợ nghiệp vụ trong quá | Thời gian UAT         |
|     | trình UAT                  |                       |
|     | Hỗ trợ cài đặt source UAT  |                       |
| 2   | Hỗ trợ xử lý lỗi sau triển | 1 tuần sau triển khai |
|     | khai                       |                       |

# $3.11.2~{ m K\'e}$ hoạch hỗ trợ kỹ thuật theo khoảng thời gian bảo hành được ghi nhận trong hợp đồng

Bảng 3.55. Kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật

| STT | Nội dung                   | Thời gian hỗ trợ         |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| 1   | Hỗ trợ xử lý lỗi phát sinh | 1 năm sau khi triển khai |
|     | trong quá trình sử dụng    |                          |
| 2   | Hỗ trợ chỉnh sửa thông số  | 1 năm sau khi triển khai |
|     | hệ thống                   |                          |


## 3.11.3 Kế hoạch bảo trì sau khi đóng dự án

Bảng 3.56. Kế hoạch bảo trì

| STT | Nội dung                   | Thời gian thực hiện         |
|-----|----------------------------|-----------------------------|
| 1   | Sửa lỗi và chỉnh sửa thông | Theo hợp đồng bảo trì chung |
|     | số hệ thống                |                             |


#### 3.11.4 Giao diện chương trình

- Giao diện đăng nhập: nhập tên đăng nhập, mật khẩu.




Hình 3.57. Giao diện đăng nhập

- Giao diện chính




Hình 3.5. Giao diện chính

- Giao diện Admin thống kê doanh thu

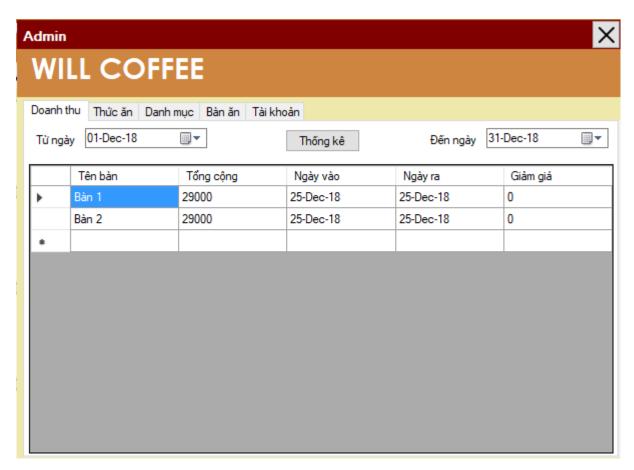


Hình 3.59. Giao diện Admin thống kê doanh thu

- Giao diện Admin thêm/xóa/sửa đồ uống

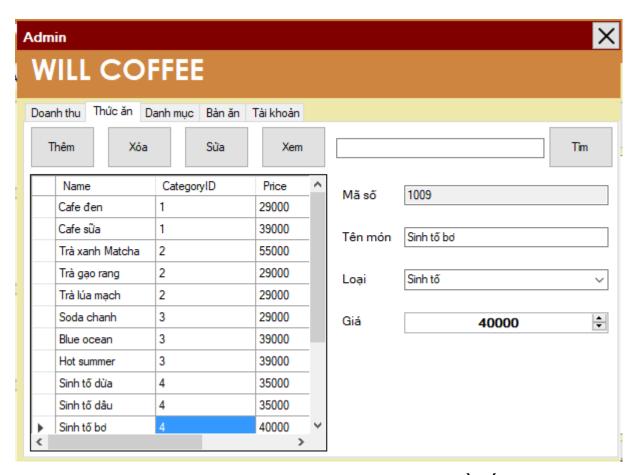


Hình 3.60. Giao diện Admin thêm/xóa/sửa đồ uống

- Giao diện Admin thêm/xóa/sửa loại đồ uống

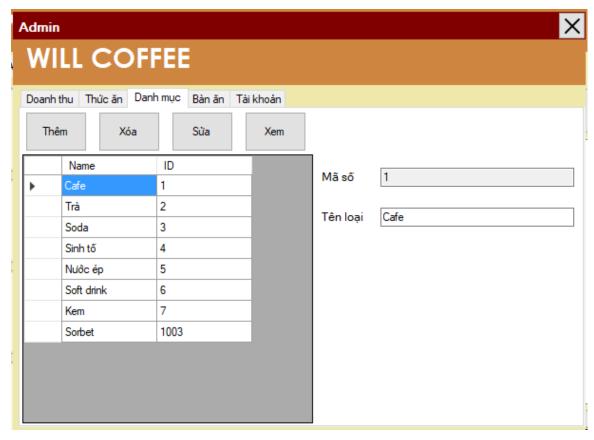

Hình 3.61. Giao diện Admin thêm/xóa/sửa loại đồ uống

- Giao diện Admin thêm bàn



Hình 3.62. Giao diện Admin thêm bàn

## 3.11.5 Tổng kết dự án

## a) Lý do phát triển dự án

- Dự án xây dựng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng trong lĩnh vực bán hàng.
- Giúp cho hoạt động kinh doanh của các cửa hàng trở nên thuận lợi hơn.

## b) Những kết quả đã đạt được

Dự án đã hoàn thành theo mục tiêu đề ra và đi vào hoạt động:

- Bước đầu đáp ứng mục tiêu bán hàng của khách hàng và tiếp theo sẽ mở rộng đa dang hơn về các lĩnh vực khác.
- Đáp ứng cơ bản những nhu cầu của khách hàng.

 Qua việc thực hiện dự án, các thành viên trong dự án rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân như kinh nghiệm làm việc nhóm, nhiều kiến thức hữu ích, khả năng tự học hỏi và làm việc nhóm một cách chuyên nghiệp có quy trình.

## c) Đánh giá và kết quả của dự án

Bảng 3.58. Đánh giá dự án

| Mô tả               | Dự kiến ban đầu                   | Thực tế                        | Kết luận         |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Thời gian           | 70 ngày                           | 62 ngày                        | Dự án hoàn thành |
| hoàn thành<br>dự án | (trừ Chủ nhật)<br>(26/10/2018 đến | (26/10/2018 đến<br>27/12/2018) | đúng dự kiến.    |
|                     | 3/1/2018)                         | 21/12/2010)                    |                  |
| Chi phí cho         | 135.000.000 VNĐ                   | 134.000.000                    | Du 1.000.000 VNĐ |
| dự án               |                                   | VNĐ                            |                  |

## d) Đánh giá về nhân lực

- Các thành viên nhóm hoạt động chăm chỉ, và hoàn thành công việc tốt.
- Nhân lực còn hạn chế nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn được giao.
- Các thành viên đảm bảo làm việc theo đúng quy trình và thời gian đã giao.

## 3.11.6 Ưu điểm của dự án

- Các thành viên có nhiệt huyết trong việc làm dự án.
- Sự lãnh đạo nhiệt tình của quản lý giúp cho dự án thành công như mong đợi.
- Các thành viên tuy ít kinh nghiệm làm việc nhóm nhưng vào dự án được vài tuần đầu và nhờ sự dẫn dắt của lãnh đạo nên kỹ năng làm việc cũng như lối tư duy logic được lên trình giúp cho các công tác làm việc nhanh và hiệu quả.
- Sự chịu khó làm việc với áp lực thời gian và môi trường của các thành viên trong tổ dự án cũng giúp dự án triển khai và kết thúc đúng tiến độ.

- Trong quá trình thi công không gặp những bất lợi lớn vì thế dự án được thành công như mong đợi.
- Sự hỗ trợ và thái độ chịu hợp tác nhiệt tình của khách hàng giúp cho việc xác định
   và thực hiện dự án thuận tiện hơn rất nhiều.

#### 3.11.7 Nhược điểm của dự án

- Các thành viên do mới làm dự án còn chưa có nhiều kinh nghiệm.
- Một số vấn đề khó cần trợ giúp từ công cụ tìm kiếm google.com.
- Dự án chưa phải lớn, chưa có áp lực nhiều.
- Các thành viên bận công việc hoặc học tập khác.

#### 3.11.8 Bài học kinh nghiệm

- Rút kinh nghiệm để tránh những rủi ro không đáng có trong dự án.
- Biết cách tính toán, quản lý thời gian, chi phí, phạm vi của dự án hiệu quả hơn.
- Người quản lý dự án sẽ quản lý sát sao hơn các nguồn nhân lực đang có.
- Cần có những yếu tố để khích lệ tinh thần làm việc của các thành viên hơn nữa.
- Chưa phát huy hết khả năng của các thành viên trong dự án, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên.
- Phân bổ đều số lượng công việc để các thành viên làm việc không bị áp lực quá mức.

## 3.11.9 Kết luận

Sau một thời gian nhóm em bắt tay vào nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo *Huỳnh Đức Huy*, nhóm chúng em đã hoàn thành đề tài "Triển khai phần mềm quản lý quán cà phê Will Coffee". Qua đây, bản thân em cũng như các thành viên trong nhóm đã học hỏi được rất nhiều điều về công việc, cách thức tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích một vấn đề nào đó. Đặc biệt là đã giúp cho chúng em có khả năng làm việc theo nhóm tốt hơn.

Tuy nhiên trong quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống do thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên chắc chắn trong báo cáo

này không tránh khỏi thiếu sót và những chỗ xử lý vấn đề chưa được tối ưu. Chúng em rất mong nhận được những nhận xét, đánh giá từ phía Thầy về báo cáo của chúng em.

## 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Giáo trình quản lý dự án Thầy Nguyễn Đức Lưu
- [2]. A guide to the project managerment body of knowledge Pmbook guide fourth edition
- [3]. Quản lý dự án cntt- đại học quốc gia thành phố hồ chi minh
- [4]. Website google.com.vn.

# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

| Độc Lập - T | Cự Do - | Hạnh | Phúc |
|-------------|---------|------|------|
|-------------|---------|------|------|

| TD    | TION    | •                  | .1 /                                  | _   |  |
|-------|---------|--------------------|---------------------------------------|-----|--|
| IΡ    | H(M)    | noav               | tháng.                                | nam |  |
| T T . | 110111, | $11 \leq \alpha y$ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |  |

# NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

| Tên đồ án: Dự án xây dựng hệ thống qua | ản lý quán cà phê Will Coffee. |
|--|--------------------------------|
| Nhóm SV thực hiện:                     | Cán bộ hướng dẫn:              |
| 1. Đinh Minh Chí – 15520063            | Huỳnh Đức Huy                  |
| 2. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh – 15520         | 196                            |
| Đánh giá báo cáo đồ án                 |                                |
| 1. Về cuốn báo cáo:                    |                                |
| Số trang:                              | Số chương:                     |
| Số bảng số liệu:                       | Số hình vẽ:                    |
| Số tài liệu tham khảo:                 | Sản phẩm:                      |
|  |                                |
|  |                                |
| 1. Về nội dung báo cáo:                |                                |

| 3. Về chương trình ứng dụng:          |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
|                                       |                          |
|                                       |                          |
|                                       |                          |
| 4. Về thái độ làm việc của sinh viên: |                          |
|                                       |                          |
|                                       |                          |
|                                       |                          |
|                                       |                          |
| Đánh giá chung:                       |                          |
|                                       |                          |
|                                       |                          |
|                                       |                          |
| Điểm từng sinh viên:                  |                          |
| 1. Đinh Minh Chí – 1550063:/10.       |                          |
| 2. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh – 15520196:    | /10.                     |
|                                       | Người nhận xét           |
|                                       | (Ký tên và ghi rõ họ tên |

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
