# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----000-----



# <u>BÁO CÁO ĐÔ ÁN MÔN HỌC</u> QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IS208.J12)

# TÊN DỰ ÁN

# CP001 - TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ WILL COFFEE

Phạm vi áp dụng: Will Coffee

Phiên bản: 1.0

Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Đức Huy

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 10

1. Đinh Minh Chí - 15520063

2. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh - 15520196

Công Ty Phần mềm VNSoft TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2018

#### LÒI CẨM ƠN

Trong suốt quá trình học môn *Quản lý dự án Công nghệ Thông tin* và hoàn thành đồ án môn học, nhóm em đã nhận được nhiều kiến thức hay và góp ý từ Thầy *Huỳnh Đức Huy*. Thầy đã cung cấp những kiến thức cần thiết cũng như hướng dẫn cho nhóm em cách tìm hiểu, nghiên cứu đề án đã đăng ký để nhóm có thể hoàn thành đồ án môn học. Bên cạnh việc vận dụng những kiến thức được học trên lớp đồng thời kết hợp với việc học hỏi và tìm hiểu những kiến thức mới. Từ đó, nhóm đã vận dụng tối đa những gì đã tiếp thu được để hoàn thành một báo cáo đồ án tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không tránh khỏi những thiếu sót. Dó đó, nhóm chúng em rất mong nhận được những sự góp ý của Thầy nhằm giúp nhóm hoàn thiện những kiến thức đã học tập và cũng là hành trang để nhóm thực hiện tiếp các đề án khác trong tương lai. Nhóm chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Thầy cùng với những kiến thức mà Thầy đã truyền đạt cho chúng em trong thời gian qua!

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2018 NHÓM THỰC HIỆN

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

# MỤC LỤC

1 Giới thiệu	8
1.1 Từ ngữ viết tắt và thuật ngữ	9 9
1.3.1	
1.3.3Danh sách tổ dự án	10
1.3.4Lý do thực hiện dự án	10
1.3.5Tổng chi phí đầu tư	10
1.4 Phạm vi, mục tiêu dự án	
1.4.2Các yếu tố không thuộc phạm vi của dự án	11
1.4.3Các tính chất và yêu cầu của dự án	12
1.5 Các bên liên quan và nhân sự chính	21
<ul> <li>2.1 Mô hình phát triển phần mềm.</li> <li>2.2 Cơ cấu tổ chức dự án</li> <li>2.2.1</li></ul>	23
2.2.2Vai trò và trách nhiệm	23
3 Quản lý dự án	24
3.1 Giả định, điều kiện, rủi ro         3.1.1	
3.1.2Các hạn chế	24
3.1.3Chi phí dự kiến	25
3.2 Khởi tạo dự án	
3.2.2Yêu cầu nguồn lực	29
3.2.3Yêu cầu đào tạo nhân sự dự án (nếu có)	31
3.3 Kế hoạch thực hiện dự án	
3.3.2Lập lịch làm việc	35
3.3.3Các cột mốc (milestone) và các work product chính	36
3.3.4Lập kế hoạch	37
3.3.5Phân tích yêu cầu	46

3.4Kế hoạch kiểm soát dự án	
3.4.2Kế hoạch quản lý yêu cầu	
3.4.3Kế hoạch quản lý quy trình phát triển phần mềm	
3.4.4Kiểm tra chất lượng sản phẩm	
3.4.5Báo cáo dự án	
3.5 Kế hoạch quản lý rủi ro	
3.5.2Lập biểu phân tích rủi ro của dự án	82
3.6Kế hoạch chọn lựa giải pháp	
3.6.2Các lựa chọn phương án	92
3.7Kế hoạch quản lý cấu hình (CM)Quy định	
3.7.2Xác định cấu hình	93
3.7.3Cấu hình sản phẩm (baseline)	93
3.7.4Lưu trữ cấu hình	94
3.7.5Quyền truy xuất	94
3.8 Kế hoạch quản lý dữ liệu	95 97 98
3.11.2Kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật theo khoảng thời gian bảo hành được hợp đồng98	ghi nhận trong
3.11.3Kế hoạch bảo trì sau khi đóng dự án	98
3.11.4Giao diện chương trình	99
3.11.5Tổng kết dự án	103
3.11.6Ưu điểm của dự án	104
3.11.7Nhược điểm của dự án	105
3.11.8Bài học kinh nghiệm	105
3.11.9Kết luận	105
4 TÀI LIỆU THAM KHẢO	106

# Quản lý tài liệu

Ngày tạo: 26/10/2018	Thời gian lưu: 12/27/2018 6:03:31 PM
Phòng ban/Bộ phận: Project Manager	Lưu bởi: Đinh Minh Chí

# Lịch sử thay đổi

Người thực hiện	Ngày thực hiện	Nội dung	Phiên
			bản
Đinh Minh Chí	26/10/2018	Tạo tài liệu, cập nhật phần xác	1.0.0
		định mục tiêu và phạm vi.	
Dương Huỳnh	27/10/2018	Cập nhật phần Lập bảng mô tả	1.0.1
Mỹ Hạnh		công việc.	
Đinh Minh Chí	28/12/2018 đến	Cập nhật phần Lập đề cương	1.0.2
	29/12/2018	và kế hoạch chi tiết.	
Đinh Minh Chí +	30/10/2018 đến	Cập nhật phần Phân tích và xác	1.0.3
Dương Huỳnh Mỹ	09/11/2018	định yêu cầu, lập kế hoạch	
Hạnh		thực hiện, viết báo cáo.	
Dương Huỳnh Mỹ	10/11/2018 đến	Thiết kế logic.	1.0.4
Hạnh	11/11/2018		
Dương Huỳnh Mỹ	12/11/2018	Cập nhật phần Thiết kế giao	1.0.5
Hạnh		diện và trang chủ.	
Đinh Minh Chí	13/11/2018	Cập nhật phần Thiết kế chức	1.0.6
		năng tìm tên đồ uống, tạo	
		phiếu nhập kho, thêm đồ uống.	
Dương Huỳnh Mỹ	14/11/2018 đến	Cập nhật phần chức năng: tạo	1.0.7
Hạnh	17/11/2018	phiếu xuất kho, cập nhật và in	
		bảng giá, lập báo cáo, xem	
		thông tin khách hàng, xem chi	

		tiết đơn hàng, quản lý tồn kho,	
		quản lý nhà cung cấp.	
Đinh Minh Chí +	19/11/2018	Cập nhật phần lập báo cáo thiết	1.0.8
Dương Huỳnh Mỹ		kế.	
Hạnh			
Đinh Minh Chí	20/11/2018 đến	Cập nhật phần Thiết kế cơ sở	1.0.9
	24/11/2018	dữ liệu: tạo sơ đồ lớp, tạo các	
		bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD,	
		tạo các ràng buộc, lập báo cáo	
		về CSDL.	
Dương Huỳnh Mỹ	25/11/2018 đến	Cập nhật phần Lập trình: cài	1.0.10
Hạnh	01/12/2018	đặt môi trường, quản trị hệ	
		thống nhân viên, khách hàng.	
Đinh Minh Chí +	02/12/2018 đến	Cập nhật phần Lập trình: xử lý	1.0.11
Dương Huỳnh Mỹ	11/12/2018	chức năng tìm tên đồ uống, tạo	
Hạnh		phiếu nhập kho, thêm đồ uống,	
		tạo phiếu xuất kho, lập báo	
		cáo, xem thông tin khách hàng	
Dương Huỳnh Mỹ	12/12/2018 đến	Cập nhật phần kiểm thử	1.0.12
Hạnh	19/12/2018		
Đinh Minh Chí +	20/12/2018 đến	Cập nhật phần nghiệm thu	1.0.13
Dương Huỳnh Mỹ	24/12/2018		
Hạnh			
Đinh Minh Chí	25/12/2018 đến	Cập nhật phần chuyển giao +	1.0.14
	27/12/2018	bảo trì	
Đinh Minh Chí +	27/12/2018	Cập nhật phần hỗ trợ	1.0.15
Dương Huỳnh Mỹ			
Hạnh			

# Lịch sử kiểm tra

Người kiểm tra	Ngày kiểm tra	Nhận xét/đánh giá	Phiên bản
Dương Huỳnh	14/12/2018	Hồ sơ sơ bộ hoàn thiện	1.0.0
Mỹ Hạnh			
Đinh Minh Chí	14/12/2018	Báo cáo các quá trình đầy đủ	1.0.1
Dương Huỳnh	26/12/2018	Tài liệu đầy đủ và hoàn thiện	1.0.14
Mỹ Hạnh			
Đinh Minh Chí +	27/12/2018	Kiểm tra trước khi bàn giao.	1.0.15
Dương Huỳnh Mỹ			
Hạnh			

#### 1 Giới thiệu

Báo cáo giới thiệu tổng quan về dự án, phạm vi, mục tiêu, cách tổ chức và quản lý dự án của cửa hàng cà phê Will Coffee, về hệ thống quản lý bán hàng, quản lý nhân viên cũng như hệ thống quản lý khách hàng, quản lý món ăn và quản lý nguyên liệu. Với mục đích cung cấp đầy đủ, giải thích chi tiết các chức năng có trong hệ thống cùng với các phần mềm, công cụ hỗ trợ mà nhóm đã sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, cũng như kế hoạch chi tiết, các bước cần làm để hoàn thành một hệ thống quản lý quán cà phê theo đúng yêu cầu của cửa hàng.

Ngoài ra, còn có một số thuật ngữ viết tắt, các tài liệu mà nhóm đã tham khảo để có thể hoàn thành dự án này một cách tốt nhất.

Chú ý: Tài liệu này chỉ được phép lưu hành nội bộ.

# 1.1 Từ ngữ viết tắt và thuật ngữ

Từ viết	Diễn giải		
tắt			
PM	Project Manager – Trưởng dự án		
Work	Tất cả các tài liệu/source của dự án như tài liệu yêu cầu người dùng, tài		
Products	liệu kỹ thuật, source code, hướng dẫn sử dụng		
KH	Customer – Khách hàng		
NV	Nhân viên		
QLDA	Quản lý dự án		
CM	Quản lý cấu hình		
DB	Database – Cơ sở dữ liệu		
QC	Quality Control – Kiểm soát chất lượng		
BA	Business Analyst – Chuyên viên phân tích		
SoW	Statement of Work		
WBS	Work Breakdown Statement		
Baseline	Cấu hình sản phẩm		

#### 1.2 Tham khảo

STT	Mô tả	Tên tài liệu
1	Tài liệu đề xuất dự án	
2	Mẫu phiếu nhập nguyên liệu.	
3	Mẫu phiếu chi.	
4	Mẫu hóa đơn bán lẻ.	
5	Mẫu đơn đặt hàng.	
6	Mẫu phiếu giao hàng.	
7	Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo	
	tháng.	
8	Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo	
	quý.	
9	Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo	
	năm.	
10	Một số tài liệu liên quan đến sản phẩm	
	của dự án như: Tài liệu thiết kế, mã	
	nguồn phần mềm, phần cứng.	

# 1.3 Tổng quan dự án

### 1.3.1 Tên dự án

# CP001 - TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ WILL COFFEE

- Chuyên pha chế, phục vụ thức uống, cà phê, trà và một số loại thức ăn nhẹ.

# 1.3.2 Người quản lý dự án

Trưởng dự án: Đinh Minh Chí

### 1.3.3 Danh sách tổ dự án

Tổ dự án gồm những thành viên sau:

- 1. Đinh Minh Chí (PM)
- 2. Trần Hoàng Luân (BA)
- 3. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh (Lập trình viên)
- 4. Huỳnh Thanh Nhàn (Lập trình viên)
- 5. Nguyễn Văn Duy (Tester 1 năm kinh nghiệm)

### 1.3.4 Lý do thực hiện dự án

Dự án nhằm tin học hóa một hệ thống quản lý quán cà phê cho cửa hàng cà phê Will Coffee, nhằm nâng cao chất lượng quản lý toàn diện của cửa hàng, qua đó có thể vận hành một cách hiệu quả về quy trình mua nguyên vật liệu, qui trình bán hàng cho khách hàng cũng như về các nghiệp vụ về thu ngân, kế toán, pha chế. Việc tin học hóa các quy trình quản lý quán giúp mọi thứ chính xác, nhanh chóng và đảm bảo hơn. Không cần phải nhập liệu và lưu trữ trên văn bản giấy dễ thất lạc. Đồng thời giúp việc quản lý nhân viên một cách hiệu quả hơn. Nhờ thế, có thể giúp quán cà phê đạt hiệu quả cao nhất trong việc kinh doanh cũng như tạo lòng tin nơi khách hàng.

# 1.3.5 Tổng chi phí đầu tư

- Chi phí dự kiến: 125000000 VND (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Chi phí tối đa: 135000000 VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

### 1.4 Phạm vi, mục tiêu dự án

## 1.4.1 Xác định phạm vi, mục tiêu của dự án

### 1.4.1.1 Phạm vi của dự án

Dựa trên những dữ liệu khảo sát đã thu được tại cửa hàng Will Coffee để phân tích, xác định yêu cầu người dùng, thiết kế và lên kế hoạch phát triển hệ thống. Các quy trình nghiệp vụ bên ngoài từ quán cà phê Will Coffee sẽ được kết nối và tích hợp vào hệ thống.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ chuyển giao cho quán cà phê Will Coffee, hệ thống chủ yếu tập trung vào các chức năng chính như: quản lý đơn hàng và quản lý nhân viên. Bên cạnh đó, hệ thống còn có các chức năng như quản lý khách hàng, quản lý đồ uống và quản lý nguyên liệu.

- Chức năng quản lý đơn hàng, bao gồm tính toán, lưu trữ và thống kê doanh thu đạt được qua từng tháng.
- Chức năng quản lý nhân viên, bao gồm việc đăng nhập, lưu trữ, sửa đổi thông tin nhân viên và đăng xuất.
- Chức năng quản lý đồ uống, bao gồm thêm/xóa/sửa một đồ uống vào cơ sở dữ liêu.
- Chức năng quản lý thông tin bàn, bao gồm quản lý trạng thái của bàn (trống/có người) và thông tin hóa đơn, quá trình gọi món tại bàn.
- Chức năng phân quyền, bao gồm phân quyền cho quản lý với những tính năng riêng biệt, giúp tối ưu và đảm bảo tính đúng đắn của phần mềm.

### 1.4.1.2 Mục tiêu của dự án

Nhằm xây dựng một hệ thống quản lý quán cà phê cho cửa hàng cà phê Will Coffee, nâng cao chất lượng quản lý toàn diện cho cửa hàng. Thông qua đó, có thể vận hành một cách hiệu quả về quy trình mua nguyên vật liệu, quy trình bán hàng cho khách hàng cũng như các nghiệp vụ về thu ngân, kế toán, pha chế. Đồng thời, giúp cho việc quản lý nhân viên một cách hiệu quả hơn. Nhờ đó, có thể giúp quán cà phê đạt hiệu quả cao nhất trong việc kinh doanh, vận hành, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như xây dựng niềm tin đối với khách hàng.

# 1.4.2 Các yếu tố không thuộc phạm vi của dự án

Hệ thống không chịu trách nhiệm quản lý các thông tin khách hàng, đặt hàng trực tuyến...

# 1.4.3 Các tính chất và yêu cầu của dự án

Phục vụ cho khách hàng ở mọi lứa tuổi cũng như giúp cho các nhân viên của quán cà phê Will Coffee có thể thuận lợi hơn trong công việc.

Thỏa mãn các yêu cầu mà quán đã đặt ra về hệ thống quản lý cũng như các chức năng cơ bản giúp quán cà phê quản lý một cách toàn diện hơn.

Cung cấp đầy đủ các tính năng như: thêm món, đặt hàng, quản lý bán hàng, quản lý nhân viên, quản lý nguyên vật liệu đến việc quản lý thu ngân và thanh toán của khách hàng.

Hệ thống có thể lưu thông tin đơn hàng, thông tin nhân viên, cũng như thực đơn của quán, có thể chỉnh sửa thông tin nhân viên, thực đơn, bàn. Ngoài ra, còn có chức năng đăng nhập, đăng xuất ra khỏi hệ thống.

#### 1.4.3.1 Các ràng buộc

#### a) Thời gian

- Thời gian thực hiện dự án dự kiến: 60 ngày
- Thời gian thực hiện dự án tối đa: 70 ngày
- Thời gian tập huấn sử dụng hệ thống: 6 ngày
- Thời gian sử dụng thử nghiệm hệ thống: 3 ngày
- Thời gian bắt đầu dự án: 26/10/2018.
- Thời gian kết thúc dự án dự kiến: 26/12/2018.

# b) Chi phí

- Chi phí dự kiến: 125000000 VND (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Chi phí tối đa: 135000000 VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn )

### c) Nhân lực

- 1. Đinh Minh Chí (PM)
- 2. Trần Hoàng Luân (BA)
- 3. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh (Lập trình viên 3 năm kinh nghiệm)
- 4. Huỳnh Thanh Nhàn (Lập trình viên 3 năm kinh nghiệm)
- 5. Nguyễn Văn Duy (Tester 1 năm kinh nghiệm)

# d) Thiết bị, công cụ và tiện ích

- Hiện có
  - + 1 Máy chủ
  - + 3 Máy khách
  - + 2 điện thoại
- Tăng cường
  - + 1 Máy đọc mã vạch (Barcode Reader).
  - + 1 Máy in hóa đơn (Bill Printer).

## 1.4.3.2 Tài nguyên sử dụng

# a) Về phía các thành viên

Công cụ làm việc của các thành viên trong nhóm: máy tính cấu hình cao, các phần mềm hỗ trợ có bản quyền đầy đủ.

# Các phần mềm công cụ:

- ✓ Visual Studio 2017 Community
- ✓ SQL Server Express 2014
- ✓ MS Office
- ✓ Trello
- ✓ GitHub

# Môi trường test:

- ✓ Máy tính dùng cho test có cấu hình tương đương với khách hàng
- ✓ Tài liệu các quy trình test, các phần mềm test trên Windows 10
- ✓ Cơ sở dữ liệu dùng SQL server

# b) Về phía quán cà phê Will Coffee

Sử dụng thông tin về quy trình nghiệp vụ của quán cà phê Will Coffee, quá trình hoạt động và công việc của các nhân viên để giúp phân tích và đưa ra các chức năng của hệ thống.

### 1.4.3.3 Tiêu chuẩn thực hiện, cam kết

a) Chi phí: Không vượt quá chi phí tối đa là 135000000 VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

# b) Lịch biểu

Đảm bảo tiến độ theo đúng các mốc thời gian và hạn mức:

- Thời gian giao bản thiết kế: không quá 30 ngày sau ngày bắt đầu dự án.
- Thời gian hoàn tất cài đặt: không quá 45 ngày sau ngày bắt đầu dự án.
- Thời gian hoàn tất dự án: không quá 70 ngày sau ngày bắt đầu dự án.

### c) Chất lượng

#### - Tính tiến hóa:

- + Dễ dàng trong lúc nâng cấp hệ thống hoặc chuyển đổi cơ sở dữ liệu.
- + Dễ dàng nâng cấp thêm tính năng giao hàng, thanh toán trực tuyến.

#### - Tính tiện dụng:

- + Hệ thống có giao diện đơn giản, trực quan, thân thiện và dễ sử dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
  - + Các đặc tả và hướng dẫn sử dụng chi tiết, rõ ràng.

## - Tính hiệu quả:

- + Hệ thống có sự hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự cố.
- + Cơ sở dữ liệu ổn định và đáng tin cậy, dễ sao lưu và bảo mật cao.
- + Hệ thống hoạt động ổn định và đáng tin cậy.

### - Tinh tương thích:

- + Hoạt động tốt với Windows 7, 8, 10.
- + Hoạt động tốt với Microsoft Office 2010 trở lên.
- + Hoạt động tốt với Microsoft SQL 2014.

# d) Yêu cầu chức năng

- Hệ thống sẽ dễ dàng tùy chỉnh, thay đổi các module, có khả năng tích hợp nhiều thành phần.
- Có hiệu quả cao.

- Có tính bảo mật cao.

# e) Yêu cầu phi chức năng

#### - Hiệu năng:

- + Lượng nhân viên truy cập đồng thời lên đến 200 người truy xuất CSDL trung tâm bất cứ lúc nào, và đến 300 người cùng truy xuất các server cục bộ.
- + Hệ thống cho phép truy xuất CSDL danh mục các loại thức uống, món ăn và thông tin khách hàng, nhân viên với độ trễ không quá 4 giây.
  - + Hệ thống có khả năng hoàn tất 80% giao dịch trong vòng 2 phút.

# - Tính sẵn sàng:

- + Hỗ trợ kỹ thuật 24/24h bởi đội ngũ bảo trì sự cố.
- + Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự cố.
- + Khôi phục hệ thống và khắc phục sự cố trong vòng 48 giờ.

# - Tính ổn định:

+ Hệ thống phải hoạt động liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, với thời gian ngừng hoạt động không quá 10%.

## - Bảo mật:

- + Hệ thống có tính bảo mật cao, đảm bảo thông tin khách hàng, các hóa đơn, cũng như quá trình tính toán và thu ngân của kế toán và nhân viên thu ngân. Chỉ có người quản lý mới được phép sửa dữ liệu thông tin của quán.
- + Phần mềm sẽ phân quyền cho các nhân viên rõ ràng. Đi kèm theo đó là kiểm tra thông tin đăng nhập của người dùng. Nhân viên chỉ thao tác được với phần mềm sau khi đăng nhập thành công.
- + Mọi thao tác trên cơ sở dữ liệu khi dùng phần mềm đều được lưu lại trong Log file.

# f) Các module yêu cầu cho phần mềm

- Module quản lý mua hàng.
- Module quản lý bán hàng.
- Module quản lý nhân viên.
- Module quản lý nguyên liệu.

- Module quản lý menu.
- Module thống kê.
- Module quản lý đăng nhập, đăng xuất.

# 1.4.3.4 Nhiệm vụ, quyền lợi

### \* Khách hàng và người dùng

- Nhiệm vụ:
- Quán có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ thông tin về các quy trình nghiệp vụ, các món trong thực đơn, nguyên liệu, giá thành, cũng như các tài liệu liên quan, hiện trạng và yêu cầu cho nhóm dự án.
- Thanh toán đủ và đúng các mốc thời gian đã hẹn trước.
- Ngoài ra, chính các nhân viên sẽ là người trực tiếp thực hiện quá trình kiểm thử người dùng, trực tiếp sử dụng hệ thống. Vì thế, phía cửa hàng cần phải có các buổi tập huấn cho nhân viên về chuyên môn nhằm giúp cho việc tiếp cận, sử dụng hệ thống được dễ dàng, thuận tiện.

### - Quyền lợi:

- O Được quyền sử dụng hệ thống sau khi dự án hoàn thành.
- o Hệ thống quản lý hóa đơn, phiếu chi nhanh chóng, chính xác và đầy đủ.
- O Quản lý thông tin đăng nhập, thông tin nhân viên đầy đủ và nhanh chóng.
- o Báo cáo và thống kê chính xác, chi tiết, rõ ràng.
- Thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu có độ bảo mật cao, giúp truy xuất, sao lưu và khôi phục dễ dàng, đồng bộ nhanh chóng và đáng tin cậy.
- Giao diện đẹp, thân thiện và phù hợp với yêu cầu của chủ quán cà phê giúp nhân viên quán có thể sử dụng và thao tác dễ dàng.
- Dễ sử dụng với các đối tượng nhân viên: thu ngân, bán hàng, pha chế, phục vụ, kế toán và người quản lý.
- Hệ thống vẫn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của quán trong 3 đến 5 năm tiếp theo.

#### \* Nhóm dự án

#### - Nhiệm vụ:

- Công ty hay đơn vị thực hiện dự án phải chịu trách nhiệm chính về kết quả của dự án, phải đảm bảo xác định đúng mục tiêu, đúng các yêu cầu của phía khách hàng.
- Cần phải đảm bảo đúng tiến độ dự án cũng như đảm bảo sao cho dự án thực hiện hiệu quả và đúng thời hạn mà khách hàng đã yêu cầu.
- Cần đảm bảo quản lý dự án một cách hiệu quả cả về nhân sự, kế hoạch,
   nguồn vốn và thời gian, phải theo dõi sát sao tiến độ của dự án về mọi mặt.
- Cần phải cung cấp các tài liệu hướng dẫn về hệ thống, cách sử dụng để có thể bàn giao đúng cho cửa hàng.
- Oự án sẽ không vượt quá chi phí đã dự trù mà quán và bên công ty đã thỏa thuận, sẽ đúng ngày giao nộp và được đảm bảo đúng hạn các cột mốc và những ngày quan trọng đã báo bên quán, các dịch vụ và những biên bản đặc biệt sẽ được chú trọng.

### - Quyền lợi:

- Đơn vị thực hiện dự án sẽ được hưởng mọi chế độ chăm sóc cũng như quyền lợi khi làm việc, được cửa hàng đón tiếp và cung cấp thông tin chính xác, hiệu quả cũng như các tài liệu cần thiết để phục vụ dự án.
- O Được thanh toán đủ và đúng theo các mốc thời gian đã hẹn trước.

### 1.4.3.5 Trách nhiệm chính

### **❖** *Nhóm dự án*:

- Khảo sát hiện trạng và các yêu cầu của khách hàng.
- o Lên kế hoạch và ước lượng chi phí.
- o Lên kế hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên.
- o Thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu.
- o Hiện thực phần mềm.
- Báo cáo tình hình triển khai dư án.

- O Kiểm thử phần mềm.
- O Bàn giao hệ thống hoàn chỉnh cùng các bản đặc tả chi tiết.

#### \* Khách hàng:

- O Cung cấp đầy đủ thông tin về hiện trạng và các yêu cầu cho dự án.
- Cung cấp và huy động đầy đủ các nguồn tài nguyên đúng thời hạn cho nhóm dư án.
- O Thanh toán đầy đủ và đúng hạn thời gian cho nhóm dự án.

### ❖ Người dùng:

- O Đọc và nắm các tài liệu đặc tả hệ thống.
- Tham gia tập huấn sử dụng hệ thống.

### \* Lập trình viên:

- Lập trình ứng dụng trên nền tảng C# .Net phục vụ các dự án lớn của công ty.
- Quản trị hệ thống mạng windows gồm Active Directory, DHCP,
   DNS, IIS, ISA.

### **❖** BA (Business Analyst):

Vị trí Chuyên viên phân tích nghiệp vụ chịu trách nhiệm phân tích nhu cầu của bên khách hàng là quán cà phê Will Coffee, và các đối tác liên quan để tìm hiểu và đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề phát sinh về việc quản lý thông tin quán. Viết tài liệu phân tích hệ thống.

## \* Tester:

- o Lập Test plan, Test case.
- o Thực hiện việc kiểm tra hệ thống xem có lỗi hay không.
- Lập báo cáo các lỗi đã tìm thấy cho lập trình viên khắc phục kịp thời.
- Chịu trách nhiệm lập báo cáo tiến độ công việc, quá trình thực hiện dư án.
- O Tạo các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống.

# 1.4.3.6 Sửa đổi, bổ sung

Bản phát biểu công việc này được chỉnh sửa theo từng thời gian cụ thể, các thay đổi được bổ sung và được chấp nhận. Các sửa đổi bổ sung sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình thực hiện dự án.

#### 1.4.3.7 Chữ ký

Đại diện phía quán cà phê là chủ quán và các thành viên trong nhóm phát triển dự án gồm quản lý dự án, lập trình viên, chuyên viên phân tích đã thảo luận và lắng nghe các yêu cầu từ phía quán, hai bên đã thống nhất cho việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee được thực hiện. Hai bên đã có buổi kí kết hợp đồng thành công tốt đẹp.

### 1.4.3.8 Các yêu cầu để đánh giá sự thành công của dự án

Các cuộc khảo sát phải trung thực, quá trình xác định yêu cầu người dùng phải dựa trên tình hình thực tế; Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhóm và phía bên quán; Cần có sự hỗ trợ và ra quyết định kịp thời từ Trưởng dự án.

### 1.5 Các bên liên quan và nhân sự chính

Bảng 1.1 Các bên liên quan và nhân sự chính

STT	Họ Tên	Bộ phận	Vai trò & trách nh	iệm Liên lạc
1	Đinh Minh	Phòng	- Trưởng dự án	chidm@gmail.com
	Chí	QLDA -	- Chịu trách nhiệm	DT: 0394430048
		Công ty phần	điều phối dự án.	
		mềm		
		VNSoft.		
2	Trần	Phòng	- Chuyên viên phân	luanth@gmail.com
	Hoàng	QLDA -	tích (BA)	DT: 0394452688
	Luân	Công ty phần	- Phân tích các yêu	
			cầu khách hàng	

		mềm		
		VNSoft.		
3	Dương	Developer -	- Lập trình viên.	hanhdhm@gmail.com.vn
	Huỳnh Mỹ	Công ty phần	- Thiết kế và lập	ĐT: 0357512987
	Hạnh	mềm	trình hệ thống phần	
		VNSoft.	mềm theo yêu cầu	
			và các tài liệu được	
			giao.	
			- Hoàn thành công	
			việc đúng thời hạn.	
4	Huỳnh	Developer	- Lập trình viên.	nhanht@gmail.com.vn
	Thanh	- Công ty	- Thiết kế và hoàn	ÐT: 0928452882
	Nhàn	phần mềm	thành phần mềm.	
		VNSoft.	- Hoàn thành công	
			việc đúng thời hạn.	
5	Nguyễn	Phòng	- Tester.	duynv@gmail.com
	Văn Duy	QLDA	- Báo cáo các lỗi	ÐT: 0939562456
		- Công ty	phát sinh để khắc	
		phần mềm	phục kịp thời.	
		VNSoft.		
5	Tập thể	Phòng kinh	- Nhân viên kinh	nvwillcoffee@gmail.com
	nhân viên	doanh - Cửa	doanh.	ĐT: 18009563
	cửa hàng	hàng Will	- Phục vụ khách	Ext: 40063
	Will	Coffee.	hàng tận tâm, nhiệt	
	Coffee		tình, giải quyết các	
			thắc mắc của khách	
			hàng một cách	
			nhanh chóng.	

# 1.6 Điều phối dự án

Đơn vị thực hiện sẽ bàn giao các sản phẩm cho cửa hàng cụ thể như sau:

Bảng 1.2. Danh sách sản phẩm bàn giao

STT	Hạng mục	g mục Thời gian Địa điểm		Ghi chú	
		chuyển giao	chuyển giao		
1	Tài liệu phân tích và	10/11/2018	Quán Will	Chuyển qua	
	thiết kế hệ thống		Coffee	email	
2	Tài liệu danh sách giao	18/11/2018	Quán Will	Chuyển qua	
	diện		Coffee	email	
3	Tài liệu đặc tả yêu cầu	9/11/2018	Quán Will	Chuyển qua	
	SRS		Coffee	email	
4	Tài liệu thư viện dữ	24/12/2018	Quán Will	Chuyển qua	
	liệu		Coffee	email	
5	Tài liệu hướng dẫn sử	25/12/2018	Quán Will	Chuyển qua	
	dụng		Coffee	email	
6	Tài liệu hướng dẫn cài	25/12/2018	Quán Will	Chuyển qua	
	đặt		Coffee	email	
7	Tài liệu kỹ thuật	25/12/2018	Quán Will	Chuyển qua	
			Coffee	email	
8	Biên bản nghiệm thu	24/12/2018	Quán Will	Chuyển qua	
			Coffee	email	
9	Phần mềm, hệ thống	26/12/2018	Quán Will	Chuyển qua	
	ứng dụng hoàn thiện		Coffee	email	

# \* Các dịch vụ mà sản phẩm cung cấp:

- + Quản lý đăng nhập, đăng xuất.
- + Quản lý mua hàng.

- + Quản lý bán hàng.
- + Quản lý nhân viên.
- + Quản lý khách hàng.
- + Quản lý nguyên liệu.
- + Quản lý menu.
- + Thống kê, báo cáo doanh thu.


# 2 Tổ chức dự án

# 2.1 Mô hình phát triển phần mềm

Dự án này sử dụng mô hình Thác nước (Waterfall Model). Các giai đoạn sẽ được thực hiện tuần tự.

Mô hình thác nước đơn giản, dễ sử dụng, với các giai đoạn được xử lý và hoàn thành tuần tự, không trùng lặp, không quay lại.


Mô hình phù hợp với dự án ngắn hạn và khi đã xác định các yêu cầu rõ ràng và cố định. Vì vậy, việc áp dụng mô hình này vào dự án lần này là phù hợp.

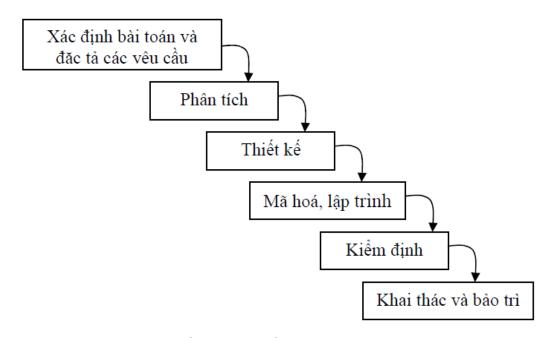

Hình 2.1. Mô hình thác nước

# 2.2 Cơ cấu tổ chức dự án

# 2.2.1 Tổ chức dự án

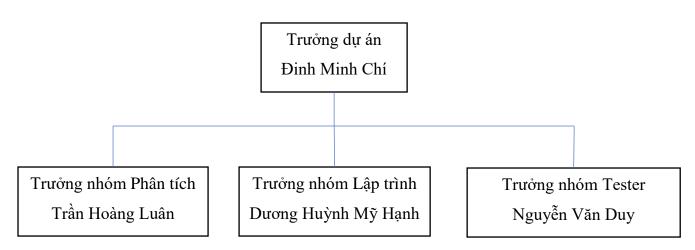

Hình 2.2. Sơ đồ quản lý tổ chức dự án

# 2.2.2 Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.1 Vai trò và trách nhiệm

Nhóm	Họ Tên	Vai trò	Trách nhiệm chính
PM	Đinh Minh Chí	Trưởng dự án	- Chịu trách nhiệm quản lý, điều
	Email:		phối toàn bộ dự án.
	chidm@gmail.com		- Đảm bảo dự án đúng tiến độ và
			chất lượng sản phẩm.
BA	Trần Hoàng Luân	Trưởng nhóm	- Điều phối công việc.
	Email:	phân tích	- Review và approve work
	luanth@gmail.com		product nhóm BA.
Tester	Nguyễn Văn Duy	Trưởng nhóm	- Kiểm tra lỗi phần mềm.
	Email:	Tester	- Viết báo cáo.
	duynv@gmail.com		
LTV	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh	Trưởng nhóm	- Lấy yêu cầu
	Email:	lập trình	- Thiết kế

hanhdhm@gmail.c	<u>com</u>	- Lập trình
Huỳnh Thanh Nhà	n Nhân viên lập	- Thiết kế
Email:	trình	- Lập trình.
nhanht@gmail.com	<u>n.vn</u>	

#### 3 Quản lý dự án

### 3.1 Giả định, điều kiện, rủi ro

#### 3.1.1 Giả định

- Các thành viên trong dự án không bị điều động sang thực hiện các đội dự án khác.
- Các tác nhân trong hệ thống thực hiện các thao tác đúng với vai trò, chức năng đã quy định.
- Có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và đều hoạt động ổn định, tin cậy.
- Không gặp khó khăn với khách hàng trong quá trình tìm hiểu, thu thập yêu cầu và xây dựng sản phẩm.
- Cơ sở dữ liệu hiện tại (văn bản, các file dữ liệu...) được chuyển đổi sang cơ sở dữ liệu mới của hệ thống thành công và không sai sót, hoặc sai sót trong mức độ cho phép và kiểm soát được.

# 3.1.2 Các hạn chế

- Dữ liệu không realtime, cần thời gian để đồng bộ lên hệ thống.
- Cần nhiều thời gian để có thể kiểm soát các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống.
- Hạn chế việc các thành viên không thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ đã được giao.
- Hạn chế việc điều động nhân viên giữa các dự án, tránh tình trạng nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

### 3.1.3 Chi phí dự kiến

- Chi phí dự kiến: 125000000 VND (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Chi phí tối đa: 135000000 VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn )

#### 3.2 Khởi tạo dự án

#### 3.2.1 Uớc lượng

- ❖ Các phương pháp, kỹ thuật được sử dụng để ước lượng chi phí dự án:
  - Kỹ thuật tương tự hay ước lượng từ trên xuống (Top-down estimating): sử dụng chi phí thực tế trước đó của các dự án tương tự làm nền tảng cơ bản để làm ước tính cho dư án hiện tai.
  - Ước lượng từ dưới lên (Bottom-up estimating): ước tính riêng từng nhóm và tính toán con số tổng cộng.

### 3.2.1.1 Ước lượng chi phí, thời gian

- Chi phí thực hiện dự án không được vượt quá chi phí tối đa là 135000000
   VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
- Thời gian thực hiện dự án dự kiến: 60 ngày
- Thời gian thực hiện dự án tối đa: 70 ngày
- Thời gian tập huấn sử dụng hệ thống: 6 ngày
- Thời gian sử dụng thử nghiệm hệ thống: 3 ngày
- Thời gian bắt đầu dự án: 26/10/2018.
- Thời gian kết thúc dự án dự kiến: 26/12/2018.

# 3.2.1.2 Chi phí tổng quan

Bảng 3.1. Các chi phí tổng quan trong dự án

STT	Nội dung công việc	Chi Phí	Ghi chú
1	Khởi động DA	500.000	

2	Khảo sát thực tế	100.000
3	Phân tích và xác định yêu cầu hệ thống	150.000
4	Thiết kế CSDL	20.000.000
5	Thiết kế giao diện	30.000.000
6	Lập trình	68.000.000
7	Kiểm thử và chuẩn bị tài liệu	9.000.000
8	Cài đặt và hướng dẫn sử dụng	1.000.000
10	Chi phí dự phòng	4.000.000
12	Chi phí đầu tư thiết bị, máy móc	1.000.000
13	Chi phí cho hội họp, tiếp khách	400.000
	Tổng	134.000.000

# 3.2.1.3 Chi phí chi tiết

Bảng 3.2. Chi phí chi tiết trong dự án

STT	Chi tiết	Đơn giá (VNĐ)	Thời gian (Giờ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Khảo sát	25.000	20	500.000
	Quan sát			100.000
	Phỏng vấn			300.000
	Điều tra thăm dò			200.000

2	Phân tích chức năng	500.000	48	24.000.000
	Quản lý mua hàng			3.000.000
	Quản lý bán hàng			3.000.000
	Quản lý nhân viên			3.000.000
	Quản lý khách hàng			3.000.000
	Quản lý nguyên liệu			3.000.000
	Quản lý món			3.000.000
	Thống kê – báo cáo			3.000.000
	Quản lý đăng nhập			3.000.000
3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	625.000	32	20.000.000
	Bảng thực đơn			1.333.000
	Bảng mua hàng			1.333.000
	Bảng chọn món			1.333.000
	Bảng mức giá			1.333.000
	Bảng hóa đơn			1.333.000
	Bảng đồ uống			1.333.000
	Bảng chức vụ			1.333.000
	Bảng hóa đơn			1.333.000
	Bảng chi tiết hóa đơn			1.333.000
	Bảng phân quyền			1.333.000
	Bảng nhân viên			1.333.000
	Bảng thông tin nhân viên			1.333.000

	Bảng hàng nhập			1.333.000
	Bảng đặt món			1.333.000
	Thiết kế Sơ đồ lớp			1.333.000
4	Thiết kế giao diện	416.000	72	1.000.000
	Module hệ thống			300.000
	Module quản lý			400.000
	Module Báo cáo-Thống kê			300.000
5	Lập trình và tích hợp hệ thống	1.133.000	60	68.000.000
	Xây dựng chức năng quản trị người dùng			10.000.000
	Lập Trình Module Quản Trị Hệ Thống			18.000.000
	Lập Trình Module Thông tin			10.000.000
	Lập trình module liên kết			10.000.000
	Lập trình module liên hệ			10.000.000
	Tích hợp hệ thống			10.000.000
6	Kiểm thử và sửa lỗi	1.125.000	8	9.000.000
	Kiểm thử mức đơn vị			2.000.000
	Kiểm thử mức tích hợp			3.000.000
	Kiểm thử mức hệ thống			2.000.000
	Kiểm thử giao diện			2.000.000
7	Kết thúc dự án	250.000	8	1.000.000

	Bàn giao sản phẩm		250.000
	Làm tài liệu hướng dẫn sử dụng		250.000
	Đào tạo		250.000
	Bảo trì		250.000
8	Chi phí khác		10.000.000
	Đi lại		2.000.000
	Hội họp		8.000.000
	,	Tổng	123.500.000

# 3.2.2 Yêu cầu nguồn lực

# ❖ Gồm có 5 người:

- + 1 Trưởng dự án
- + 1 Nhân viên phân tích (BA)
- + 2 Lập trình viên
- + 1 Tester
- Thời gian sử dụng nhân sự tối thiểu: 2 tháng

## ❖ Giới thiệu về nhân sự :

## 1. Đinh Minh Chí (Project Manager)

- Ngày sinh: 05/03/1997

- Địa chỉ: Củ Chi - TP.HCM

- Email: <a href="mailto:chidm@gmail.com">chidm@gmail.com</a>

Bằng cấp: Đại học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Kinh nghiệm chuyên môn: Khoa Hệ thống Thông tin tại trường UIT

### 2. Trần Hoàng Luân (BA)

- Ngày sinh: 19/01/1997

- Địa chỉ: Hòa Thành - Tây Ninh

- Email: <u>luanth@gmail.com</u>

Bằng cấp: Đại học

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nhật

- Kinh nghiệm chuyên môn: Khoa Hệ thống Thông tin tại trường UIT

## 3. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh (Lập trình viên)

Ngày sinh: 12/09/1997

- Địa chỉ: Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

- Email: hanhdhm@gmail.com

- Bằng cấp: Đại học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Kinh nghiệm chuyên môn: Khoa Công nghệ phần mềm tại trường UIT

### 4. Huỳnh Thanh Nhàn (Lập trình viên)

Ngày sinh: 28/11/1997

- Địa chỉ: Cái Bè - Tiền Giang

- Email: <a href="mailto:nhanht@gmail.com">nhanht@gmail.com</a>

Bằng cấp: Đại học

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Kinh nghiệm chuyên môn: Khoa Hệ thống Thông tin tại trường UIT.

### 5. Nguyễn Văn Duy (Tester)

- Ngày sinh: 01/09/1997

− Địa chỉ: Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh

- Email: <u>duynv@gmail.com</u>

Bằng cấp: Đại học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Kinh nghiệm chuyên môn: Khoa Hệ thống Thông tin tại trường UIT.

### 3.2.3 Yêu cầu đào tạo nhân sự dự án (nếu có)

Việc lựa chọn hình thức đào tạo để mang lại hiệu quả cao nhất phụ thuộc vào các yêu cầu về quy mô đào tạo, mức độ phức tạp, nội dung cần đào tạo và điều kiện trang bị kỹ thuật, năng lực tài chính cụ thể của từng doanh nghiệp.

Đối với công ty, sẽ đào tạo theo định hướng công việc: nó là hình thức đào tạo về kỹ năng thực hiện một loại công việc nhất định, nhân viên có thể sử dụng kỹ năng sau khi được đào tạo để làm việc trong các dự án khác nhau.

Tất cả các nhân viên của công ty đều được đào tạo thường xuyên thông qua các buổi training kiến thức để cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất liên quan đến từng phòng ban trong công ty để phục vụ cho công việc một cách tốt nhất.

Lý do tại sao cần yêu cầu đào tạo nhân sự dự án? Trong thực tế, một doanh nghiệp khi mới thành lập thì nhu cầu đào tạo nhân viên là một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. Bởi vì cho dù doanh nghiệp có một hệ thống thiết bị, máy móc, kỹ thuật tinh vi mà không có người biết điều khiển cũng trở nên vô ích. Đó là chưa kể đến các nghiệp vụ có tính chất vô hình như các kỹ năng quản trị. Đối với một doanh nghiệp đã có nhiều năm hoạt động, qua kinh nghiệm doanh nghiệp đã xây dựng được bản mô tả công việc. Dựa vào những bản mô tả chi tiết công việc mà khi tuyển nhân viên mới, doanh nghiệp biết rõ nhân viên mới còn thiếu các kỹ năng nào. Ít khi, một công ty nào tuyển được người có đầy đủ trình độ phù hợp theo bản mô tả công việc bởi dù nhanh hay chậm, những người mới được tuyển thường phải qua một giai đoạn đào tạo.

# 3.3 Kế hoạch thực hiện dự án

## 3.3.1 Phân rã công việc (WBS)

Xem chi tiết WBS theo file đính kèm:


 $WBS\_15520063\_15520196\_DinhMinhChi\_DuongHuynhMyHanh.xlsx$ 

Công việc	Thời gian (giờ)	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người thực hiện	Chi Phí (VNĐ)
Hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee	334	26/10/2018	26/12/2018	Ohi Haab Nhàa Duu	134,000,000
Công tác chuẩn bị      1.1. Xác định mục tiêu và pham vi	10	26/10/2018	30/10/2018	Chí, Hạnh, Nhàn, Duy Đinh Minh Chí	500,000
1.1. Xac dịnh mục tiêu và phạm vi 1.2. Lập bảng mô tả công việc	2 2	26/10/2018 27/10/2018	26/10/2018 27/10/2018	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh	0
1.3. Lập đề cương & Bảo vệ đề cương dự án	2	28/10/2018	28/10/2018		0
1.4. Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết	2	29/10/2018	29/10/2018	Dinh Minh Chí	100,000
1.5. Rà soát công tác chuẩn bị & Họp khởi động dụ	2	30/10/2018	30/10/2018	Chí, Hanh, Nhàn, Duy	400,000
2. Phân tích	42	31/10/2018	9-11-2018		500,000
2.1. Thu thập yêu cầu	8	31/10/2018	1-11-2018		100,000
2.2. Xác định yêu cầu	2	2-11-2018	2-11-2018		50,000
2.3. Tổng hợp yêu cầu	2	3-11-2018	3-11-2018		50,000
2.4. Phân tích yêu cầu	8	4-11-2018	4-11-2018	Đinh Minh Chí	50,000
2.5. Viết đặc tả	8	5-11-2018	5-11-2018	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh	50,000
2.6. Rà soát khảo sát phân tích	8	6-11-2018	6-11-2018		50,000
2.7. Xác định nguồn lực	2	7-11-2018	7-11-2018		50,000
2.8. Lập kế hoạch thực hiện	2	8-11-2018	8-11-2018		50,000
2.9. Viết báo cáo phân tích	2	9-11-2018	9-11-2018		50,000
3. Phát triển hệ thống	180	10-11-2018	9-12-2018	Chí, Hạnh, Nhàn, Duy	119,000,000
3.1. Thiết kế hệ thống tổng thể	8	10-11-2018	11-11-2018	Nguyễn Văn Duy	800000
3.1.1. Thiết kế logic	8	10-11-2018	11-11-2018	Chí Hanh Nhàn Duy	800000
3.2. Thiết kế chi tiết các thành phần	72 8	12-11-2018	18/11/2018	Chí, Hạnh, Nhàn, Duy	30,000,000
3.2.1. Thiết kế giao diện 3.2.2. Trang chủ	8	12-11-2018	12-12-2018	Nguyễn Văn Duy	1,000,000
		12/11/2012	47/44/2040	Chí, Hạnh, Nhàn, Duy	24 000 000
3.2.3. Chức năng	48	13/11/2018	17/11/2018	cni, Hann, Nnan, Duy	24,000,000
3.2.3.1. Tìm tên đồ uống	8	13/11/2018	13/11/2018	Định Minh Chí	5,000,000
3.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho	٥	15/11/2018	15/11/2018	DITH WITH CH	3,000,000
3.2.3.3. Thêm đồ uống 3.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá					
3.2.3.4. Cạp nhạt và in bang gia 3.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho	8	14/11/2018	14/11/2018		5,000,000
3.2.3.6. Lập báo cáo	o	1-1/11/2010	14/11/2010		5,000,000
3.2.3.7. Xem thông tin khách hàng				Dương Huỳnh Mỹ Hạnh	
3.2.3.8. Xem thiolig thi khaci hang	8	15/11/2018	15/11/2018		4,000,000
3.2.3.9. Quản lý	16	16/11/2018	17/11/2018	┥ ┝	10,000,000
3.2.3.9.1. Quản lý tồn kho	8	16/11/2018	16/11/2018		5,000,000
3.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp	8	17/11/2018	17/11/2018		5,000,000
3.2.4. Hướng dẫn				Huỳnh Thanh Nhàn	
3.2.5. Liên hệ	8	18/11/2018	18/11/2018	•	5,000,000
3.2.6. Tin tức					
3.3. Lập báo cáo thiết kế	8	19/11/2018	19/11/2018	Duy, Hạnh, Nhàn, Chí	200,000
3.4. Xây dựng	92	20/11/2018	11-12-2018	Chí, Hạnh, Nhàn, Duy	88,000,000
3.4.1. Thiết kế CSDL	32	20/11/2018	24/11/2018		
3.4.1.1. Tạo sơ đồ lớp		20/11/2018	20/11/2018		
3.4.1.2. Tạo các bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD		21/11/2018	22/11/2018	Đinh Minh Chí	20,000,000
3.4.1.3. Tạo các ràng buộc		23/11/2018	23/11/2018		
3.4.1.4. Lập báo cáo về CSDL	32	24/11/2018	24/11/2018		
3.4.2. Lập trình	60	25/11/2018	11-12-2018		68,000,000
3.4.2.1. Cài đặt môi trường	4	25/11/2018	25/11/2018	iiuyiii iilaiii ivilaii	400,000
3.4.2.2. Quản trị hệ thống	16	26/11/2018	01/12/2018	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh	27,600,000
3.4.2.2.1. Quản lý nhân viên	8	26/11/2018	28/11/2018	_	13,000,000
3.4.2.2.2. Quản lý khách hàng	8	29/11/2018	01/12/2018		14,600,000
3.4.2.3. Xử lý chức năng	40	2-12-2018	11-12-2018	Chí, Hạnh, Nhàn	40,000,000
3.4.2.3.1. Tìm tên đồ uống	8	2-12-2018	3-12-2018		
3.4.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho				-	
3.4.2.3.3. Thêm đồ uống	8	4-12-2018	4-12-2018	Đinh Minh Chí	10,000,000
3.4.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá thực đơn					
3.4.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho	8	5-12-2018	5-12-2018		
3.4.2.3.6. Lập báo cáo 3.4.2.3.7. Xem thông tin khách hàng	4	6 12 2010	6 12 2010	+	
3.4.2.3.7. Xem thong tin khach hang 3.4.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng	4	6-12-2018 7-12-2018	6-12-2018 7-12-2018	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh	5,000,000
3.4.2.3.9. Xem cni tiet don nang 3.4.2.3.9. Xử lý quản lý	8	7-12-2018 8-12-2018			
3.4.2.3.9. XV iy quan iy 3.4.2.3.9.1. Quản lý tồn kho	4	8-12-2018 8-12-2018	11-12-2018 9-12-2018	Huỳnh Thanh Nhàn	25,000,000
3.4.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp	4	10-12-2018	11-12-2018		22,230,000
S.4.2.5.5.2. Quanty fina cung cap	52	12-12-2018	19/12/2018		9,000,000
4.1. Lập kế hoạch test	2	12-12-2018	12-12-2018	Nguyễn Văn Duy	1,000,000
4.2. Viết test case theo yêu cầu	2	13/12/2018	13/12/2018		1,000,000
4.3. Test tổng thể	16	14/12/2018	15/12/2018		
4.4. Test từng thành phần	16	16/12/2018	17/12/2018	Duy, Hạnh, Nhàn	6,000,000
4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê	8	18/12/2018	18/12/2018		
4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử	8	19/12/2018	19/12/2018	Nguyễn Văn Duy	1,000,000
. Nghiệm thu	40	20/12/2018	24/12/2018		4,000,000
5.1. Lắp đặt phần cứng	8	20/12/2018	20/12/2018		1,000,000
5.2. Cài đặt phần mềm	8	21/12/2018	21/12/2018	uỳnh Mỹ Hanhluyah Th	1,000,000
5.3. Đưa vào hoạt động	8	22/12/2018	22/12/2018	uỳnh Mỹ HạnhHuỳnh Tha	0
5.4. Sửa lỗi phát sinh	8	23/12/2018	23/12/2018		2,000,000
5.5. Lập báo cáo nghiệm thu	8	24/12/2018	24/12/2018		0
i. Chuyến giao	10	25/12/2018	26/12/2018		1,000,000
6.1. Viết tài liệu hướng dẫn	2	25/12/2018	25/12/2018	Đinh Minh Chí	0
6.2. Đào tạo	8	26/12/2018	26/12/2018		1,000,000
'. Bảo trì	0	27/12/2018	27/12/2018		0
7.1. Bảo hành định kỳ	0	27/12/2018	27/12/2018	Huỳnh Thanh Nhàn	0
7.2. Nâng cấp chương trình khi có phiên bản mới	0	27/12/2018	27/12/2018		0
8. Hỗ trợ	0	27/12/2018	27/12/2018	Đinh Minh Chí	0


# 3.3.1.1 Bảng cấu trúc

- WBS trong dự án triển khai phần mềm quản lý quán cà phê Will Coffee

Hình 3.3. WBS trong xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee

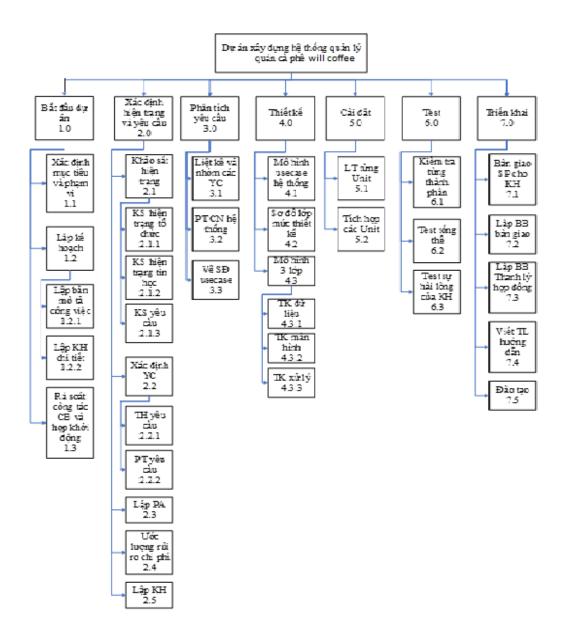


## 3.3.1.2 Danh sách các sản phẩm

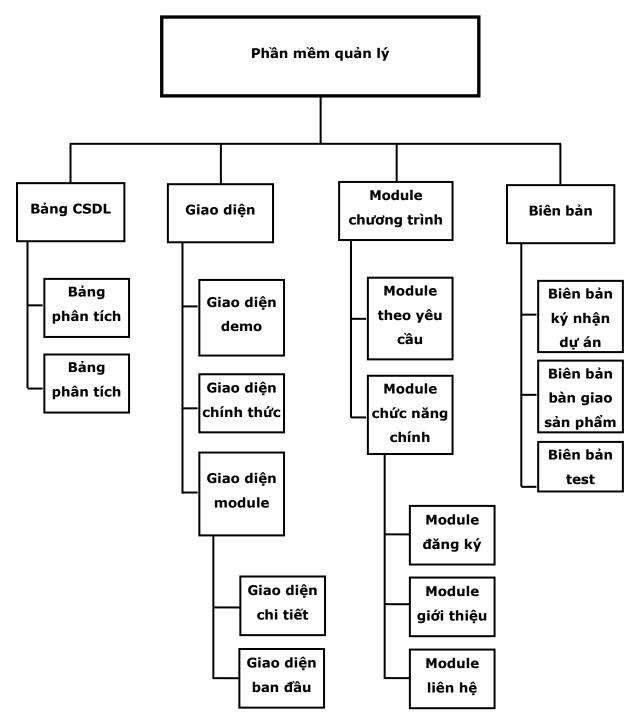

Hình 3.4. Danh sách các sản phẩm của hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee


#### 3.3.2 Lập lịch làm việc

Quản lý công việc bằng Trello

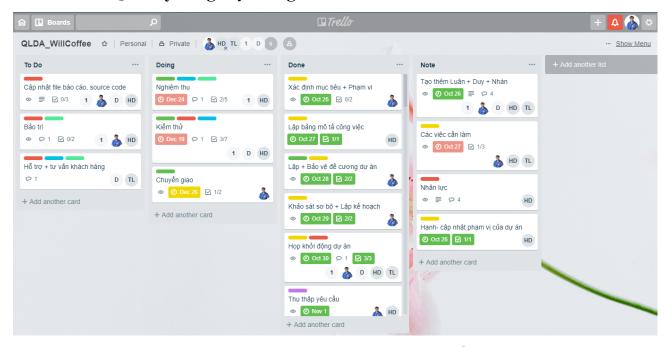

Hình 3.5 Quản lý công việc bằng Trello

- Quản lý source code bằng Github



Hình 3.6 Quản lý source code bằng Github

- Link Github: https://github.com/ChiDinh97/QLDA-CNTT

### \* Thời gian tổng thể

Tổng thời gian dự kiến là 62 ngày được phân chia như sau:

- Khảo sát, phân tích và viết báo cáo: 15 ngày
- Lập trình, kiểm thử các phân hệ, bàn giao từng phân hệ cho khách hàng,
   nhận yêu cầu sửa lỗi của khách hàng và tiến hành sửa lỗi: 47 ngày.
- Thanh lý hợp đồng.

### \* Thời gian chi tiết

Xem chi tiết WBS theo file đính kèm:

 $WBS\_15520063\_15520196\_DinhMinhChi\_DuongHuynhMyHanh.xlsx.$ 

#### 3.3.3 Các cột mốc (milestone) và các work product chính

Bảng 3.7. Danh sách các cột mốc của dự án

STT	Giai đoạn	Ngày báo cáo	Tài liệu	Ghi chú
1	Khởi động	26/10/2018	Nhận dự án và quyết định khởi	PM
1	dự án		động dự án (văn bản kèm theo)	
		27/10/2018	- Ước lượng dự án.	PM
2	Lập kế hoạch		- Bản kế hoạch thực hiện dự	
	dự án		án.	
		27/10/2018	- Bản báo cáo khảo sát.	BA
3	Lấy yêu cầu		- Bản đặc tả yêu cầu khách	
3	khách hàng		KH.	
			- Báo cáo tiến độ.	
		01/11/2018	- Bản phân tích hệ thống dựa	BA
4	Phân tích		trên yêu cầu KH.	
4	và thiết kế		- Bản đặc tả thiết kế (giao diện,	
			module,).	

			- Hoàn thành bản phân tích	
			thiết kế hệ thống và giao diện	
			theo yêu cầu KH.	
			- Báo cáo tiến độ.	
		15/11/2018	- Báo cáo tiến độ lập trình.	Trưởng
5	Lập trình		- Bàn giao module chương	nhóm
			trình.	lập trình
			- Kế hoạch kiểm thử	Nhóm
	77.2	30/11/2018	- Các kịch bản kiểm thử	Tester
6	Kiểm thử		- Các biên bản kiểm thử	
			- Báo cáo tiến độ.	
7	Chuyển giao	18/12/2018	- Source code	PM
/	sản phẩm		- Checklist kỹ thuật	
	117	19/12/2018	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Nhóm
8	Hỗ trợ kỹ thuật		sản phẩm	Tester
9	Dána durá:	27/12/2018	- Biên bản bàn giao và thanh lý	Nhóm
9	Đóng dự án		hợp đồng.	Tester

## 3.3.4 Lập kế hoạch

## 3.3.4.1 Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.8. Các công việc cần làm trong kế hoạch

Giai đoạn	Thời gian	Kết quả	Ghi chú
Công tác	5 ngày	<ul> <li>Xác định mục tiêu và phạm vi.</li> </ul>	
chuẩn bị	5 ngày	<ul> <li>Lập bảng mô tả công việc.</li> </ul>	

Xác định hiện trạng và yêu cầu	10 ngày	<ul> <li>Lập đề cương và bảo vệ đề cương dự án.</li> <li>Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết.</li> <li>Rà soát công tác chuẩn bị và họp khởi động dự án.</li> <li>Khảo sát hiện trạng và thu thập yêu cầu.</li> <li>Tổng hợp và phân tích yêu cầu.</li> <li>Lập phương án, kế hoạch.</li> </ul>
Phân tích và thiết kế	10 ngày	<ul> <li>Viết báo cáo phân tích.</li> <li>Xác định Stackeholder, customer.</li> <li>Xây dựng mô hình usecase nghiệp vụ.</li> <li>Xây dựng activity diagram.</li> <li>Xây dựng sequence diagram.</li> <li>Xây dựng mô hình business object.</li> <li>Xây dựng sơ đồ lớp mức phân tích.</li> <li>Mô hình usecase hệ thống.</li> <li>Thiết kế theo mô hình 3 lớp: dữ liệu, màn hình, xử lý.</li> </ul>
Cài đặt	22 ngày	<ul> <li>Cài đặt gói chức năng hỗ trợ actor.</li> <li>Chuẩn bị và tích hợp các gói chức năng unit.</li> </ul>
Kiểm thử	8 ngày	<ul> <li>Kiểm tra thành phần: dữ liệu, xử lý và giao diện người dùng.</li> <li>Kiểm tra tổng thể.</li> <li>Kiểm tra sự hài lòng của khách hàng.</li> </ul>
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm	7 ngày	– Viết tài liệu hướng dẫn và đào tạo.


### 3.3.4.2 Kế hoạch chi tiết

### 3.3.4.2.1 Công tác chuẩn bị

Bảng 3.9. Danh sách các công việc trong công tác chuẩn bị

STT	Công việc	Thời gian (giờ)	Công việc kết thúc trước đó	Chi phí/Ngày rút ngắn
1	Xác định mục tiêu và phạm vi (A)	2		
2	Lập bảng mô tả công việc + Lập đề cương & Bảo vệ đề cương dự án (B)	2	A	
4	Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết (C)	2	A	
5	Rà soát công tác chuẩn bị và họp khởi động dự án (D)	2	С	

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn công tác chuẩn bị




Hình 3.10. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn công tác chuẩn bị

### 3.3.4.2.2 Giai đoạn xác định hiện trạng và yêu cầu

Bảng 3.11. Danh sách công việc trong giai đoạn xác định hiện trạng và yêu cầu

STT	Công việc	Thời gian (giờ)	Công việc kết thúc trước đó	Chi phí/Ngày rút ngắn
1	Khảo sát hiện trạng tổ chức	2		
	(A)			
2	Khảo sát hiện trạng tin học	4		
2	(B)	T		
3	Khảo sát yêu cầu (C)	8	A, B	
4	Tổng hợp yêu cầu (D)	2	С	
5	Phân tích yêu cầu (E)	8	С	
6	Lập phương án (F)	4	Е	
7	Ước lượng rủi ro, chi phí (G)	8	F	
8	Lập kế hoạch (H)	8	Е	

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn xác định hiện trạng và yêu cầu



Hình 3.12. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn xác định hiện trạng và yêu cầu


### 3.3.4.2.3 Giai đoạn phân tích

Bảng 3.13. Danh sách các công việc trong giai đoạn phân tích

STT	Công việc	Thời gian (giờ)	Công việc kết thúc trước đó	Chi phí/Ngày rút ngắn
1	Xác định stackeholder, customer (A)	8		
2	Xây dựng mô hình usecase nghiệp vụ (B)	8	A	
3	Xây dựng activity diagram (C)	8	В	
4	Xây dựng sequence diagram (D)	8	D	
5	Xây dựng mô hình business object (E)	8	В	

	6	Xây dựng sơ đồ lớp mức phân tích (F)	8	
ı		, , ,		

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn phân tích



Hình 3.14. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn phân tích


### 3.3.4.2.4 Giai đoạn thiết kế

Bảng 3.15. Các công việc cần làm trong giai đoạn thiết kế

STT	Công việc	Thời gian (giờ)	Công việc kết thúc trước đó	Chi phí/ Ngày rút ngắn
1	Mô hình usecase hệ thống (A)	2		
2	Sơ đồ lớp mức thiết kế (B)	2	A	
3	Thiết kế hệ thống tổng thể (C)	8	В	
4	Thiết kế chi tiết các thành phần (D)	8	С	
5	Thiết kế màn hình - tiện dụng - hiệu quả (E)	2	D	
6	Thiết kế màn hình tra cứu (F)	2	Е	

7	Thiết kế màn hình thực đơn (G)	2	F	
8	Minh họa thiết kế xử lý (H)	2	G	
9	Thiết kế xử lý (I)	2	Н	

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn thiết kế



Hình 3.16. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn thiết kế


### **3.3.4.2.5** Giai đoạn cài đặt

Bảng 3.17. Danh sách các công việc trong giai đoạn cài đặt

STT	Công việc	Thời gian (giờ)	Công việc kết thúc trước đó	Chi phí/Ngày rút ngắn
1	Cài đặt gói chức năng hỗ trợ phân quyền (A)	8		
2	Cài đặt gói chức năng hỗ trợ quản lý (B)	8	A	

3	Cài đặt gói chức năng hỗ trợ thu ngân (C)	8	A	
4	Cài đặt gói chức năng hỗ trợ nhân viên pha chế (D)	8	A	
5	Cài đặt gói chức năng hỗ trợ nhân viên phục vụ (E)	8	A	
6	Cài đặt gói chức năng hỗ trợ kế toán (F)	8	A	
7	Chuẩn bị unit (G)	2	F	
8	Tích hợp unit (H)	16	G	

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn cài đặt

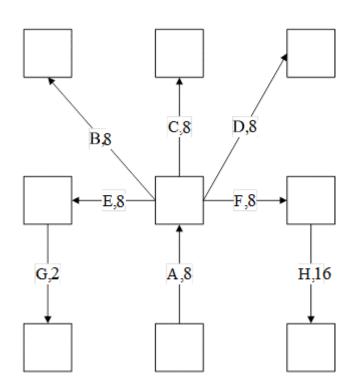


Hình 3.18. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn cài đặt

### **3.3.4.2.6** Giai đoạn kiểm thử

Bảng 3.19. Danh sách các công việc trong giai đoạn kiểm thử

STT	Công việc	Thời gian (giờ)	Công việc kết thúc trước đó	Chi phí/Ngày rút ngắn
1	Kiểm tra các thành phần dữ liệu (A)	8		
2	Kiểm tra các thành phần xử lý (B)	8	A	
3	Kiểm tra các thành phần giao diện (C)	16	В	
4	Kiểm tra tổng thể (D)	16	С	
5	Kiểm tra sự hài lòng của khách hàng (E)	8	D	

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn kiểm thử




Hình 3.20. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn kiểm thử

### 3.3.4.2.7 Giai đoạn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

Bảng 3.21. Danh sách các công việc trong giai đoạn cài hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

STT	Công việc	Thời gian (giờ)	Công việc kết thúc trước đó	Chi phí/Ngày rút ngắn
1	Viết tài liệu hướng dẫn (A)	2		
2	Đào tạo (B)	8	A	

- Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm



Hình 3.22. Biểu diễn sơ đồ pert giai đoạn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

### 3.3.5 Phân tích yêu cầu

#### 3.3.5.1 Khảo sát hiện trạng

### 3.3.5.1.1 Phỏng vấn

Bảng 3.23. Danh sách câu hỏi phỏng vấn

Người được phỏng vấn: Trần Sang	Ngày: 31/10/2018
Chức vụ: Quản lý	
Câu hỏi	Ghi nhận


Câu hỏi 1: Anh có thể cho biết quá trình	- Ban đầu chúng tôi kiểm tra hàng trong
nhập hàng diễn ra như thế nào không?	kho xem thiếu những nguyên liệu gì, rồi
	sẽ đặt hàng cho nhà cung cấp, khi hàng
	được giao tới chúng tôi kiểm tra số
	lượng, chất lượng của hàng hóa rồi ghi
	chép vào sổ sách.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 2: Anh sẽ lưu trữ những thông	- Vì cửa hàng chúng tôi nhập các loại
tin gì khi đặt hoặc nhận hàng? Và anh	nguyên liệu đa dạng nên có nhiều nhà
đặt hàng của một nhà cung cấp hay	cung cấp khác nhau. Tôi sẽ ghi lại thông
nhiều nhà cung cấp khác nhau?	tin sản phẩm, số lượng, ngày giao, nhà
	cung cấp, nguồn cung cấp
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 3: Cửa hàng của mình là một	- Có, khách hàng sẽ thanh toán 1/3 số
cửa hàng lớn. Vậy cửa hàng có dịch vụ	tiền bàn mình đã đặt, thông tin khách
đặt bàn trước không? Nếu muốn thay	hàng và bản được đặ sẽ được ghi chú
đổi hoặc hủy bàn thì cửa hàng sẽ xử lý	trên máy tính. Nếu có thay đổi yêu cầu
như thế nào?	khách hàng thông báo cho chúng tôi biết
	trước 1 ngày.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 4: Nếu có một phần mềm quản	- Tôi muốn có một phần mềm tiện lợi,
lý cửa hàng thì anh muốn phần mềm đó	đơn giản và dễ quản lý, dễ bảo trì và có
như thế nào?	thể mở rộng chức năng nếu cần thiết.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 5: Hóa đơn sau khi thanh toán	- Có, hóa đơn sau khi trên toán sẽ luôn
cho khách có được lưu lại trên máy hay	được lưu trên máy tính. Cuối mỗi ca,
không và làm thế nào để kiểm tra lại?	nhân viên thu ngân giữ ca trực đó sẽ
	phải sắp xếp theo trình tự: toàn bộ bill

	bán hàng, và cuối ngày chúng tôi sẽ
	kiểm tra lại doanh thu thực tế xem có
	trùng khớp với hóa đơn đã bán hàng hay
	không.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 6: Thông thương trên hóa đơn	- Thông thường trên hóa đơn sẽ được in
sẽ được in những thông tin gì?	thông tin: loại nước uống, số lượng, số
	tiền của từng loại nước và tổng tiền, tên
	nhân viên lập hóa đơn, thông tin cửa
	hàng, password wifi.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 7: Hiện nay cửa hàng có hệ	- Hiện tại cửa hàng sử dụng phần mềm
thống quản lý bằng tin học nào không?	quản lý quán cà phê áp dụng công nghệ
	C#.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 8: Cho biết hệ thống quản lý cửa	- Hiện tại cửa hàng có 3 chi nhánh.
hàng cà phê và số lượng máy tại mỗi chi	- Trong đó mỗi chi nhánh có 2 máy để
nhánh như thế nào?	quản lý cửa hàng.
	- Các máy được kết nối mạng LAN.
	- Nhân viên có thể truy cập internet từ
	client.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 9: Cho biết các phần mềm cài	- Hiện tại các máy đều khởi động thông
đặt trên máy?	qua máy chủ.
	- Các máy đơn cài windows 7.
	- Máy chủ cài windows 10.
	- Hiện tại toàn bộ hệ thống được kết nối
	cơ sở dữ liệu bằng SQL Server 2016.

	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 10: Máy chủ có quản lý toàn bộ	- Máy chủ quản lý toàn bộ hệ thống và
hệ thống không hay mỗi chi nhánh sử	toàn bộ cơ sở dữ liệu được lưu vào máy
dụng một cơ sở dữ liệu khác nhau?	chủ vận hành.
	- Thái độ trả lời: không chắc chắn.
Câu hỏi 11: Khách hàng sẽ thanh toán	- Nếu là khách hàng mới thì làm thẻ
như thế nào?	thành viên mới cho khách hàng (nếu
	khách hàng có nhu cầu) hoặc thanh toán
	bằng tiền mặt và nhận hóa đơn từ cửa
	hàng.
	- Nếu đã là thành viên của cửa hàng thì
	hệ thống sẽ quản lý điểm tích lũy(khách
	hàng thân thiện), được thanh toán tiền,
	nhận hóa đơn từ cửa hàng.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 12: Quản lý có vai trò gì trong	- Quản lý là người trực tiếp quản lý quán
cửa hàng?	cà phê, mọi vấn đề của quán đều thông
	qua quản lý và quản lý có quyền quyết
	định mọi thông tin trong cửa hàng. Là
	người nắm được tình hình mua bán,
	doanh thu của cửa hàng, quản lý nhân
	viên.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 13: Nhân viên thu ngân có vai	- Nhân viên sẽ là người đứng ở quầy thu
trò như thế nào với hệ thống?	tiền và tính tiền cho khách hàng thông
	qua hệ thống.

	-Nhân viên sẽ kiểm tra mã món, thanh
	toán trực tiếp và gửi hóa đơn cho khách
	hàng.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 14: Phục vụ có vai trò gì trong	- Phục vụ sẽ ghi danh sách món theo yêu
cửa hàng?	cầu của khách hàng tại bàn và bưng món
	lên cho khách hàng.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 15: Pha chế có vai trò gì trong	- Khi nhân viên phục vụ ghi danh sách
cửa hàng?	món trong thực đơn thì pha chế sẽ dựa
	vào thực đơn đó và tạo ra các món mà
	khách hàng yêu cầu.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 16: Kế toán có vai trò gì trong	- Tính lương cho nhân viên.
cửa hàng?	- Báo cáo doanh thu theo tháng, quý
	hoặc cũng có khi báo cáo đột xuất.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 17: Tạp vụ có vai trò gì trong	- Tạp vụ làm công việc quét dọn.
cửa hàng?	- Thái độ trả lời: chắc chắn.
Câu hỏi 18: Bảo vệ có vai trò gì trong	- Bảo vệ là người quản lý bãi giữ xe và
cửa hàng?	trật tự an ninh tại cửa hàng.
	- Thái độ trả lời: chắc chắn.

#### 3.3.5.1.2 Hiện trạng tổ chức



Hình 2.24. Hiện trạng tổ chức của quán cà phê Will Coffee

- Mô tả: Người quản lý sẽ là người chịu trách nhiệm quản lý tất cả các nhân viên trong cửa hàng.
- Ở mỗi bộ phận, tùy theo khối lượng công việc sẽ được phân chia với số lượng nhân viên khác nhau.

#### 3.3.5.1.3 Hiện trạng tin học

#### ❖ Phần cứng

- Hiện tại quán có 5 máy tính để bàn, các máy hiện tại có cấu hình Intel ® Core ™ i5, bên cạnh đó quán có 2 máy in, 1 máy đọc mã vạch.
- Các máy tính đều được kết nối mạng LAN và có sử dụng đường truyền ADSL để kết nối Internet.

#### ❖ Phần mềm

- Phần mềm đang sử dụng: Word 2013, Ecxel 2013, Microsoft SQL Server 2012.
- Hệ điều hành: Windows 10
- Hệ quản trị CSDL: SQL Server.
- Các phần mềm tiện ích khác như đã cài đặt sẵn Unikey, ...

#### ❖ Con người

Nhân viên trong quán đều hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản như:

- Sử dụng máy tính cơ bản.

- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản như có thể gõ văn bản, trình bày, và lập công thức và tính toán các hàm trong excel.

### Khối lượng

- Số nhân viên kể cả quản lý trong quán hiện tại có 9 người (trừ nhân viên bảo vệ và nhân viên tạp vụ).
- Nhân viên thu ngân và pha chế xem và tra cứu và hóa đơn và đơn hàng.

#### **❖** Tần suất

- Số lượng khách hàng đến quán mỗi ngày ước tính khoảng: 150 khách và tăng lên vào các ngày lễ.
- Nhân viên thu ngân và nhân viên pha chế một ngày phải xử lý và pha chế hơn 300 đơn hàng và các loại thức uống.

#### 3.3.5.1.4 Nghiệp vụ và quy trình

Mua hàng: Sau khi kiểm tra định kì để biết số lượng còn lại của các sản phẩm thì cửa hàng sẽ tiến hành mua các nguyên liệu về để trong kho, các nguyên liệu gồm có như bột cà phê, sữa đặc, sữa không đường, kem, bột bánh mì, các bột pha chế các nước trái cây, cũng như các nguyên liệu để trong tử lạnh như các lọa trái cây, kem, ... Mỗi ngày, nhân viên sẽ lấy ra các sản phẩm để bán trong ngày thông qua các dự đoán đã lập sẵn về sức bán trong ngày.

Bán hàng: Mỗi khi có khách đặt món sẽ thông qua phục vụ, phục vụ sẽ báo lại với thu ngân để thu ngân lập món cho nhân viên pha chế. Khách hàng sẽ thanh toán trước khi rời khỏi quán.

#### 3.3.5.2 Khảo sát về yêu cầu

### 3.3.5.2.1 Yêu cầu phi chức năng

- + Yêu cầu về giao diện:
  - o Giao diện quản lý hợp lý, đơn giản, tiện dụng.
  - Giao diện dùng cho khách hàng yêu cầu thân thiện, sinh động, dễ sử dụng và tương tác cao vs khách hàng.

- + Yêu cầu chất lượng:
  - Hệ thống giao diện trực quan, thân thiện, dễ dành sử dụng, mang tính hiệu quả cao.
  - Các đặc tả và hướng dẫn sử dụng dõ ràng.
- + Yêu cầu hoạt động:
  - o Tính hiệu quả:
    - Hệ thống tính toán chuẩn xác hóa đơn và tự động nâng cấp khách hàng thân thiết.
    - Hệ thống hoạt động ổn định và đáng tin cậy.
  - o Tính tương thích:
    - Hoạt động tốt trên các hệ điều hành: Windows, Mac OS, Linux...
    - Hoạt động tốt với máy tính có cấu hình yếu

#### 3.3.5.2.2 Yêu cầu chức năng

- + Quản lý mua hàng
- + Quản lý bán hàng
- + Quản lý nhân viên
- + Quản lý khách hàng
- + Quản lý nguyên liệu
- + Quản lý món
- + Quản lý thống kê
- + Quản lý đăng nhập

### 3.3.5.2.3 Danh sách các tác nhân nghiệp vụ của hệ thống

Bảng 3.25. Danh sách Actor trong hệ thống

STT	ACTOR	Ý Nghĩa	
1	AT01_ThuNgan	Là thu ngân trong quán cà phê. Thu ngân đứng ở quầy	
		thu tiền và thanh toán hóa đơn tạm tính. Thu ngân là tác	
		nhân tác động trực tiếp và được phân quyền sử dụng hệ	
		thống để hỗ trợ cho việc thanh toán hóa đơn bán hàng.	
		Không được xóa hóa đơn tạm tính, hóa đơn bán hàng và	
		hóa đơn tạm tính khi thanh toán thành hóa đơn bán hàng	
		chỉ được in một lần.	
2	AT02_PhaChe	Là nhân viên pha chế trong phòng pha chế. Được phân	
		quyền sử dụng hệ thống hỗ trợ cho việc cập tình trạng	
		đơn đặt món và tình trạng nguyên liệu.	
3	AT03_PhucVu	Là nhân viên phục vụ trong quán. Nhân viên phục vụ có	
		nhiệm vụ order món cho khách hàng, giúp khách hàng	
		thanh toán hóa đơn tại khu vực quầy thu tiền. Phục vụ	
		cũng được phân quyền sử dụng hệ thống để order món	
		tạo hóa đơn tạm tính.	
		Không được xóa hóa đơn tạm tính.	
4	AT04_KeToan	Là nhân viên kế toán trong quán. Chịu trách nhiệm trong	
		việc nhập nguyên liệu, cập nhật hóa đơn mua hàng, tính	
		trạng nguyên liệu và thống kê các doanh số trong quán.	
		Kế toán được phân quyền sử dụng hệ thống thực hiện	
		các nghiệp vụ cá nhân.	
5	AT05_QuanLy	Là quản lý trong quán cà phê. Có trách nhiệm kiểm kê,	
		quản lý chung mọi họa động trong quán. Ngoài các chức	
		năng của nhân viên, Quản lý có quyền thêm món, bàn,	
		nhân viên, khách hàng và xóa món, bàn, nhân viên.	

	Không được xóa khách hàng. Quản lý còn được cung
	cấp chức năng phân quyền cho các actor.

### 3.3.5.2.4 Danh sách Usecase nghiệp vụ

Bảng 3.26. Danh sách các Usecase nghiệp vụ của hệ thống

STT	Tên usecase	Ghi chú	Người thực			
311	Ten usecase	Gill Citu	hiện			
AT01	AT01_ThuNgan					
1	u001_TCKhachHang	Nhân viên tra cứu và xem	Thu Ngân			
	uoo1_1Cixilaciii iang	thông tin khách hàng	Quản lý			
2	u002_TCBan	Nhân viên tra cứu và tình	Thu ngân			
	uooz_1cban	trạng bàn	NV phục vụ			
3	u003_CNHDTamTinh	Nhân viên cập nhật thêm món mới vào hóa đơn tạm tính	Thu ngân NV phục vụ			
4	u004_InHDTamTinh	Nhân viên in hóa đơn tạm tính	Thu ngân			
5	u005_ThanhToanHD	Nhân viên thanh toán hóa đơn tạm tính	Thu ngân			
6	u006_InHDThanhToan	Nhân viên in hóa đơn sau khi thanh toán hóa đơn tạm tính và chỉ được in một lần	Thu ngân			
7	u007_TCHDBH	Nhân viên tra cứu và xem hóa đơn bán hàng	Thu ngân Kế toán Quản lý			
8	u008_TCMenu	Nhân viên tra cứu menu và xem thông tin món	Thu ngân NV phục vụ			


AT02	AT02_PhaChe				
		Nhân viên tra cứu nguyên	Quản lý		
1	u009_TCNL	liệu và xem thông tin nguyên	Kế toán		
		liệu	Pha chế		
2	u010 CNTinhTrangNI	Nhân viên cập nhật tình	NV pha chế		
2	u010_CNTinhTrangNL	trạng nguyên liệu	iv pha che		
3	u011_CNDatMon	Nhân viên cập nhật tình	NV pha chế		
	doff_Crybanylon	trạng đơn đặt món	iv pha che		
AT03	_PhucVu				
1	u012 TCMenu	Nhân viên tra cứu menu,	Thu ngân		
	uo12_1 Civiciiu	xem thông tin món	NV phục vụ		
2	u013_TCBan	Nhân viên tra cứu bàn và	Thu ngân		
		xem tình trạng bàn	NV phục vụ		
3	u014_TaoHDTamTinh	Nhân viên chọn món và đặt	NV phục vụ		
		order	TV phậc vậ		
4	u015_CNHDTamTinh	Nhân viên thêm món trong	NV phục vụ		
		hóa đơn tạm tính	Thu ngân		
AT04	_KeToan				
1	u016_TCNhanVien	Nhân viên tra cứu và xem	Kế toán		
		thông tin nhân viên tra cứu	Quản lý		
2	u017_TKLuong	Nhân viên thống kê lương	Kế toán		
		nhân viên theo tháng	Quản lý		
3	u018_InBangLuong	Nhân viên in bảng lương	Kế toán		
		nhân viên			
		Nhân viên tra cứu hóa đơn	Kế toán		
4	u019_TCHDBH	bán hàng và xem chi tiết hóa	Quản lý		
		đơn bán hàng			

5	u020_TKDoanhThu	Nhân viên thống kê doanh thu của quán theo ngày hoặc theo tháng	Kế toán Quản lý
6	u021_InTKDoanhThu	Nhân viên in thống kê doanh thu	Kế toán
7	u022_TKBanHang	Nhân viên thống kê bán hàng theo ngày hoặc theo tháng	Kế toán Quản lý
8	u023_InTKBanHang	Nhân viên in thống kê bán hàng	Kế toán
9	u024_TCHDMH	Nhân viên tra cứu hóa đơn mua hàng và xem chi tiết hóa đơn mua hàng	Kế toán Quản lý
10	u025_ThemHDMH	Nhân viên thêm hóa đơn mua hàng bằng cách nhập trực tiếp hoặc import file excel	Kế toán
11	u026_TKMuaHang	Nhân viên thống kê mua hàng	Kế toán Quản lý
12	u027_InTKMuaHang	Nhân viên in thống kê mua hàng	Kế toán
13	u028_ TCNL	Nhân viên tra cứu và xem chi tiết thông tin nguyên liệu	Quản lý Kế toán NV Pha chế
14	u029_CNTinhTrangNL	Nhân viên cập nhật tình trạng nguyên liệu	Kế toán NV pha chế
AT05	_QuanLy		
1	u030_TCNL	Tra cứu và xem thông tin chi tiết nguyên liệu	Quản lý Kế toán


			NV Pha chế
2	u031_XoaNL	Xóa nguyên liệu	Quản lý
3	u032_ThemNL	Thêm nguyên liệu	Quản lý
4	u033_TCMon	Tra cứu và xem thông tin chi tiết món	Quản lý
5	u034_CNMon	Cập nhật thông tin món	Quản lý
6	u035_XoaMon	Xóa món	Quản lý
7	u036_ThemMon	Thêm món	Quản lý
8	u037_XoaBan	Xóa bàn	Quản lý
9	u038_TCBan	Tra cứu bàn	Quản lý
10	u039_ThemBan	Thêm bàn	Quản lý
11	u040_TCKhachHang	Tra cứu thông tin khách	Quản lý
11	u040_1CKnachriang	hàng	Thu ngân
12	u041_CNKhachHang	Cập nhật thông tin khách hàng	Quản lý
13	u042_ThemKhachHang	Thêm khách hàng mới	Quản lý
14	u043_TCNhanVien	Tra cứu và xem thông tin nhân viên chi tiết	Quản lý Kế toán
15	u044_CNNhanVien	Cập nhật thông tin nhân viên	Quản lý
16	u045_XoaNhanVien	Xóa nhân viên	Quản lý
17	u046_ThemNhanVien	Thêm nhân viên mới	Quản lý
18	u047_TKBanHang	Thống kê bán hàng theo	Quản lý
	do-t/_1 KDaii11aiig	ngày hoặc theo thàng	Kế toán
19	u048_TKDoanhThu	Thống kê doanh thu theo	Quản lý
	_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	ngày hoặc theo tháng	Kế toán
20	u049_TKMuaHang	Thống kê mua hàng theo	Quản lý
_ 5		thàng hoặc theo ngày	Kế toán

21	u050 TVI uong	Thống kê lương nhân viên	Quản lý
21	u050_TKLuong	theo tháng	Kế toán
22	u051_PhanQuyenSuDung	Phân quyên các chức năng	Quản lý
22 u051_PhanQuyer		sử dụng cho từng tác nhân	Quairiy
	u052_TCHDBH		Quản lý
23		Tra cứu hóa đơn bán hàng	Kế toán
			Thu ngân
24	u053_TCHDMH	Tra cứu hóa đơn mua hàng	Quản lý
24		Tra cuu noa don mua nang	Kế toán


#### 3.3.5.2.5 So đồ Usecase

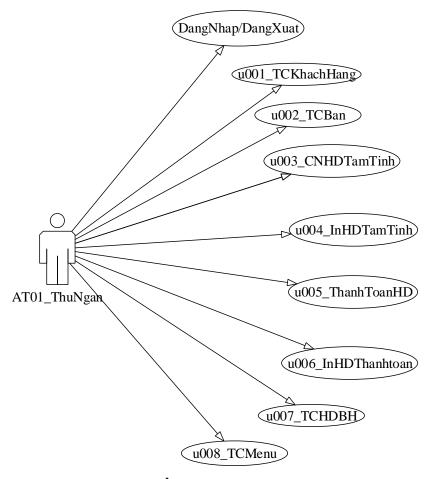


Hình 3.27. Sơ đồ Usecase phân hệ thu ngân

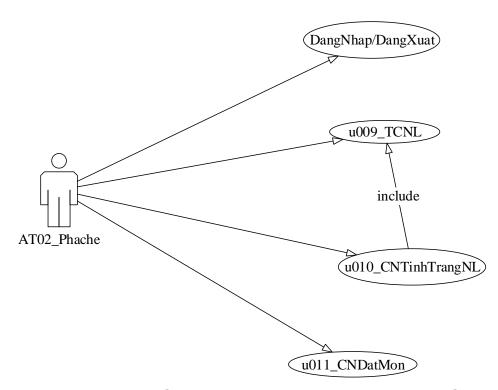


Hình 3.28. Sơ đồ Usecase phân hệ nhân viên pha chế

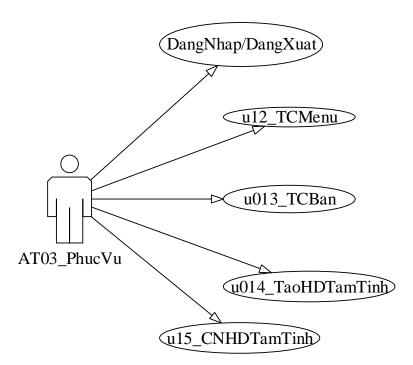

Hình 3.29. Sơ đồ Usecase phân hệ nhân viên phục vụ

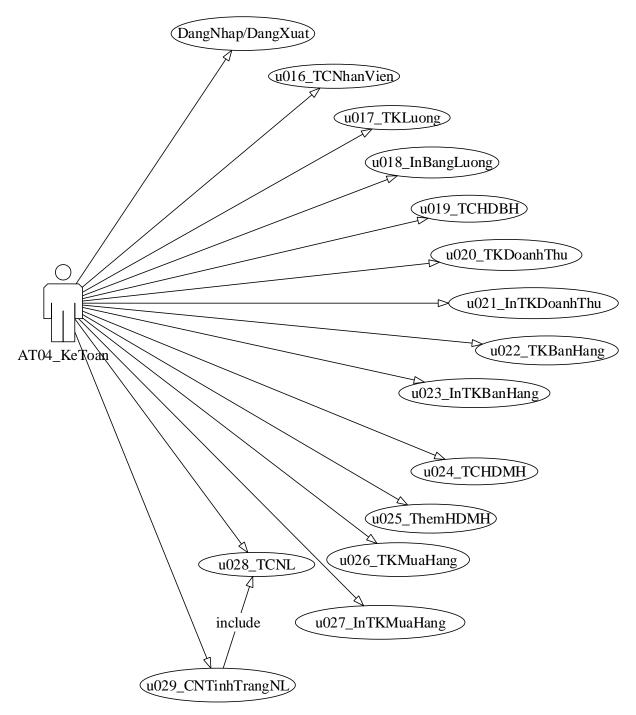


Hình 3.30. Sơ đồ Usecase phân hệ kế toán

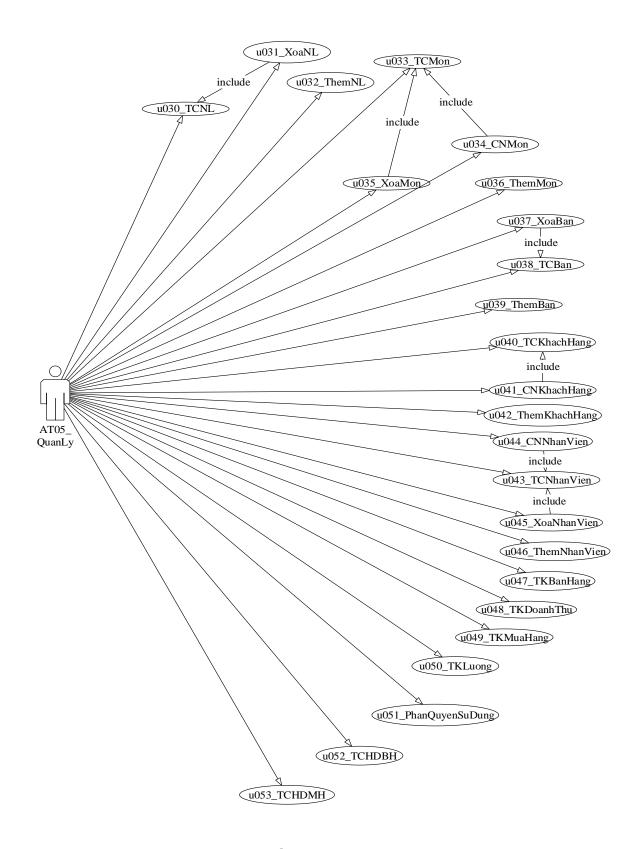

Hình 3.31. Sơ đồ Usecase phân hệ quản lý

#### 3.3.5.2.6 Sơ đồ ERD

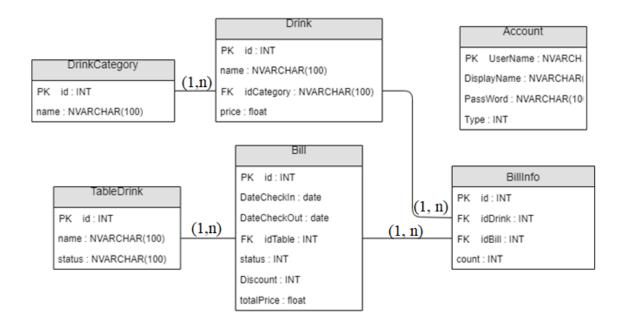

Hình 3.32 Sơ đồ ERD

#### 3.3.5.2.7 Quy trình nghiệp vụ

Đầu tiên, nhân viên phục vụ sẽ order món cho khách hàng trực tiếp trên phần mềm và tạo hóa đơn tạm tính. Lúc này kế toán sẽ nhận được đơn tạm tính và nhân viên pha chế sẽ nhận được đơn đặt món. Khi đơn đặt món đã hoàn thành, nhân viên pha chế cập nhật tình trạng đơn đặt món và nhân viên phục vụ mang ra cho khách hàng.

Khi khách hàng thanh toán hóa đơn có thể trực tiếp tới quầy thu ngân hoặc thanh toán qua nhân viên phục vụ. Khi thanh toán qua nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ sẽ yêu cầu in hóa đơn tạm tính để thanh toán cho khách hàng. Thu ngân thanh toán hóa đơn tạm tính sẽ in hóa đơn mua hàng sau khi thanh toán và đưa lại khách hàng.

Trong quá trình pha chế, nếu nhận thấy cần bổ sung nguyên liệu, pha chế sẽ cập nhật tình trạng nguyên liệu để kế toán bổ sung nguyên liệu.

Kế toán bổ sung đơn mua hàng vào hệ thống đồng thời cập nhật lại tình trạng nguyên liệu, thống kê doanh số ngày và tháng.

### 3.4 Kế hoạch kiểm soát dự án

#### 3.4.1 Kiểm soát kế hoạch thực hiện

#### 3.4.1.1 Quy trình kiểm soát

Người quản lý dự án kiểm soát tiến trình thực hiện dự án tại các mốc kiểm soát, dùng mọi phương pháp để xác định xem các công việc (nói riêng) và toàn bộ dự án (nói chung) hiện đang tiến triển như thế nào.

Người quản lý dự án phải luôn luôn theo dõi sát sao với từng giai đoạn của dự án, tại các thời điểm của các giai đoạn nhất định, các trưởng nhóm sẽ phải báo cáo tiến độ công việc của nhóm mình hoặc của từng cá nhân với người quản lý dự án, trong đó phải nêu bật những điều đã làm được và những điều chưa làm được để người quản lý dự án có một sự điều chỉnh nhất định sao cho hợp lý.

#### - Các mốc kiểm soát

Bảng 3.33. Danh sách các mốc kiểm soát của dự án

STT	Giai đoạn kết thúc	Ngày báo cáo	Tài liệu	Ghi chú
1	Khởi động	26/10/2018	Nhận dự án và quyết định khởi	PM
1	dự án		động dự án (văn bản kèm theo)	
		30/10/2018	- Ước lượng dự án.	PM
2	Lập kế hoạch		- Bản kế hoạch thực hiện dự	
	dự án		án.	
		09/11/2018	- Bản báo cáo khảo sát.	BA
3	Lấy yêu cầu		- Bản đặc tả yêu cầu khách	
3	khách hàng		KH.	
			- Báo cáo tiến độ.	
4	Phân tích	19/11/2018	- Bản phân tích hệ thống dựa	BA
4	và thiết kế		trên yêu cầu KH.	

			<ul> <li>Bản đặc tả thiết kế (giao diện, module,).</li> <li>Hoàn thành bản phân tích</li> </ul>	
			thiết kế hệ thống và giao diện theo yêu cầu KH Báo cáo tiến độ.	
5	Lập trình	11/12/2018	<ul> <li>Báo cáo tiến độ lập trình.</li> <li>Bàn giao module chương trình.</li> </ul>	Trưởng nhóm lập trình
6	Kiểm thử	19/12/2018	<ul> <li>Kế hoạch kiểm thử</li> <li>Các kịch bản kiểm thử</li> <li>Các biên bản kiểm thử</li> <li>Báo cáo tiến độ.</li> </ul>	Nhóm Tester
7	Chuyển giao sản phẩm	26/12/2018	- Source code - Checklist kỹ thuật.	PM
8	Hỗ trợ kỹ thuật	27/12/2018	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm.	Nhóm Tester
9	Đóng dự án	27/12/2018	- Biên bản bàn giao và thanh lý hợp đồng.	Nhóm Tester

## 3.4.1.2 Diễn biến quá trình thực hiện dự án

Diễn biến quá trình thực hiện dự án được mô tả thông qua các mốc dự án đã xác định. Tại sao mốc kiểm soát sẽ diễn ra các cuộc họp, nhằm xem xét tiến độ thực hiện, các khó khăn cần khắc phục và kế hoạch tiếp theo.

Để theo dõi tiến trình dự án, chúng ta xem xét các biên bản họp dự án tương ứng với các mốc kiểm soát đã chọn.

## - Khởi động dự án:

Biên bản họp dự án				
Tên Dự án	Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee			
Mã dự án	CP001			
Nội dung công việc	Quyết định khởi động dự án			
Chủ trì cuộc họp	Đinh Minh Chí			
Thư ký	Trần Hoàng Luân			
	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh			
Những người tham gia	Huỳnh Thanh Nhàn			
	Nguyễn Văn Duy			
Thời gian	30/10/2018			
Địa điểm	256 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ			
Dia arem	Đức, Tp. Hồ Chí Minh.			
Mục đích	Công bố việc khởi động dự án, dự kiến các công việc			
Trige dieli	cần làm, bàn giao kế hoạch tiếp theo.			

# - Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết
	Bản phân tích	Đội phân	Bản kế hoạch		
1	và thiết kế hệ	tích và	thực hiện dự		
	thống	thiết kế	án		

# - Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Lập trình	Đội lập trình	- Hoàn thành module chức năng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.	Từ 25/11 đến 11/12/2018

## - Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu	
1	KH/NT01-3	Bản phân tích chi tiết mô tả hệ thống chức năng và giao diện.	
2	QÐ/NT01-5	Biên bản cuộc họp	

## - Lập trình:

Biên bản họp dự án				
Tên Dự án	Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee			
Mã dự án	CP001			
Nội dung công việc	Lập trình			
Chủ trì cuộc họp	Đinh Minh Chí			
Thư ký	Trần Hoàng Luân			
Những người tham	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh			
gia	Huỳnh Thanh Nhàn			
	Nguyễn Văn Duy			

Thời gian	25/11/2018
Địa điểm	9/7/9, khu phố 5, đường số 7, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Mục đích	Hoàn thành chức năng sản phẩm

## - Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Module các chức năng sản phẩm	Đội lập trình			

# - Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Kiểm thử và khắc phục lỗi	Đội kiểm thử	Hoàn thiện lại các chức năng sản phẩm đảm bảo chạy ổn định theo yêu cầu khách hàng.	

## - Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu	
1	KH/NT01-4	Các chức năng sản phẩm	
2	QÐ/NT01-6	Biên bản cuộc họp	

# - Kiểm thử và khắc phục lỗi:

Biên bản họp dự án		
Tên Dự án	Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee	
Mã dự án	CP001	
Nội dung công việc	Kiểm thử	
Chủ trì cuộc họp	Đinh Minh Chí	
Thư ký	Trần Hoàng Luân	
	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh	
Những người tham gia	Huỳnh Thanh Nhàn	
	Nguyễn Văn Duy	
Thời gian	19/12/2018	
Địa điểm	9/7/9, khu phố 5, đường số 7, phường Linh Chiểu, quận	
Dia diem	Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.	
Mục đích	Kiểm thử và khắc phục lỗi	

# - Tiến độ hiện tại

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Kiểm thử toàn bộ hệ thống	Đội kiểm thử			

# - Kế hoạch tiếp theo

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Kiểm thử và khắc phục lỗi	Đội kiểm thử	Hoàn thiện lại các chức năng sản phẩm đảm bảo chạy ổn định theo yêu cầu khách hàng.	Từ 20/12/2018 đến 24/12/2018

## - Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu	
1	KH/NT01-5	Các chức năng sản phẩm	
2	QÐ/NT01/7	Biên bản cuộc họp	

## - Tổng kết dự án:

Biên bản họp dự án		
Tên Dự án	Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee	
Mã dự án	CP001	
Nội dung công việc	Tổng kết dự án	
Chủ trì cuộc họp	Đinh Minh Chí	
Thư ký	Trần Hoàng Luân	
	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh	
Những người tham gia	Huỳnh Thanh Nhàn	
	Nguyễn Văn Duy	
Thời gian	27/12/2018	
Địa điểm	9/7/9/, khu phố 5, đường số 7, phường Linh Chiểu,	
2.55 5.611	quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.	
Mục đích	Thông qua các báo cáo tổng kết dự và kết thúc dự án.	

### Các tài liệu

STT	Mã số	Tài liệu
1	KH/NT01-6	Báo cáo tổng kết dự án
2	QÐ/NT01-8	Biên bản cuộc họp

## 3.4.2 Kế hoạch quản lý yêu cầu

 Khi tiếp nhận dự án (mới bắt đầu một dự án hoặc khi bắt đầu một giai đoạn mới của dự án), BA khởi tạo tài liệu quản lý yêu cầu.

- BA ghi nhận lại danh sách các phân hệ và danh sách yêu cầu ngay từ khi mới bắt đầu dự án. Các danh sách này sẽ được BA cập nhật trong suốt quá trình lấy yêu cầu từ khách hàng.
- BA ghi nhận lại danh sách các yêu cầu sau cùng (được khách hàng xác nhận sẽ thực hiện) cùng các thông tin do BA phụ trách (Yêu cầu liên quan, Mã chức năng, Mã quy tắc nghiệp vụ) sau khi hoàn tất giai đoạn lấy yêu cầu. Khi được duyệt baseline tài liệu lần đầu, BA chuyển giao tài liệu này lại cho PM quản lý.
- Mỗi khi baseline tài liệu, người viết tài liệu (tất cả các bộ phận tham gia dự án) phải lấy bản baseline mới nhất của tài liệu này về, cập nhật các phần thay đổi của mình vào và gửi lại cho PM review và cập nhật bản baseline thông qua task Trello.

# 3.4.3 Kế hoạch quản lý quy trình phát triển phần mềm

- Lên schedule tasks.
- Tạo task Trello để phân công Task cho các thành viên.
- Tạo tài khoản Github, cấp quyền cho các thành viên.

#### 3.4.3.1 Quy trình mẫu

- Đầu tiên, mô tả các luồng thông tin và các sản phẩm công việc giữa các hoạt động và chức năng.
- Sau đó, xác định thời gian làm việc để sản phẩm được tạo ra.
- O Xác định đánh giá được tiến hành.
- O Xác định các cột mốc quan trọng để đạt được.
- Xác định cách tạo và quản lý tài liệu baseline.
- O Xác định các sản phẩm (tài liệu, source code...) của dự án được hoàn thành.
- Xác định phê chuẩn cần thiết trong thời hạn của dự án.
- Xác định mô hình để phát triển hệ thống.

#### 3.4.3.2 Phương pháp, công cụ, công nghệ

#### **3.4.3.2.1** Công cụ MS Excel

- Bảng kế hoạch chi tiết dự án

Công việc	Thời gian (giờ)	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
Hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee	310	26/10/2018	26/12/2018
1. Công tác chuẩn bị	10	26/10/2018	30/10/2018
1.1. Xác định mục tiêu và phạm vi	2	26/10/2018	26/10/2018
1.2. Lập bảng mô tả công việc	2	27/10/2018	27/10/2018
1.3. Lập đề cương & Bảo vệ đề cương dự án	2	28/10/2018	28/10/2018
1.4. Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết	2	29/10/2018	29/10/2018
1.5. Rà soát công tác chuẩn bị & Họp khởi động dụ	2	30/10/2018	30/10/2018
2. Phân tích	42	31/10/2018	9-11-2018
2.1. Thu thập yêu cầu	8	31/10/2018	1-11-2018
2.2. Xác định yêu cầu	2	2-11-2018	2-11-2018
2.3. Tổng hợp yêu cầu	2	3-11-2018	3-11-2018
2.4. Phân tích yêu cầu	8	4-11-2018	4-11-2018
2.5. Viết đặc tả	8	5-11-2018	5-11-2018
2.6. Rà soát khảo sát phân tích	8	6-11-2018	6-11-2018
2.7. Xác định nguồn lực	2	7-11-2018	7-11-2018
2.8. Lập kế hoạch thực hiện	2	8-11-2018	8-11-2018
2.9. Viết báo cáo phân tích	2	9-11-2018	9-11-2018
3. Phát triển hệ thống	156		
		10-11-2018	9-12-2018
3.1. Thiết kế hệ thống tổng thế	8	10-11-2018	11-11-2018
3.1.1. Thiết kế logic	8	10-11-2018	11-11-2018
3.2. Thiết kế chi tiết các thành phần	72	12-11-2018	18/11/2018
3.2.1. Thiết kế giao diện	8	12-11-2018	12-12-2018
3.2.2. Trang chủ	8	11 2010	12 12 2010
3.2.3. Chức năng	48	13/11/2018	17/11/2018
3.2.3.1. Tìm tên đồ uống			
3.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho	8	13/11/2018	13/11/2018
3.2.3.3. Thêm đồ uống			
3.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá			
3.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho	8	14/11/2018	14/11/2018
3.2.3.6. Lập báo cáo		. ,	,
3.2.3.7. Xem thông tin khách hàng			
3.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng	8	15/11/2018	15/11/2018
	16	15/11/2019	17/11/2010
3.2.3.9. Quản lý	16	16/11/2018	17/11/2018
3.2.3.9.1. Quản lý tồn kho	8	16/11/2018	16/11/2018
3.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp	8	17/11/2018	17/11/2018
3.2.4. Hướng dẫn			
3.2.5. Liên hệ	8	18/11/2018	18/11/2018
3.2.6. Tin tức			
3.3. Lập báo cáo thiết kế	8	19/11/2018	19/11/2018
3.4. Xây dựng	68	20/11/2018	11-12-2018
3.4.1. Thiết kế CSDL	8	20/11/2018	24/11/2018
3.4.1.1. Tạo sơ đồ lớp		20/11/2018	20/11/2018
3.4.1.2. Tạo các bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD		21/11/2018	22/11/2018
3.4.1.3. Tạo các ràng buộc		23/11/2018	23/11/2018
3.4.1.4. Lập báo cáo về CSDL	8	24/11/2018	24/11/2018
3.4.2. Lập trình	60	25/11/2018	11-12-2018
3.4.2.1. Cài đặt môi trường	4	25/11/2018	25/11/2018
3.4.2.2. Quản trị hệ thống	16	26/11/2018	01/12/2018
3.4.2.2.1. Quản lý nhân viên	8	26/11/2018	28/11/2018
3.4.2.2.2. Quản lý khách hàng	8	29/11/2018	01/12/2018
3.4.2.3. Xử lý chức năng	40	2-12-2018	11-12-2018
3.4.2.3.1. Tìm tên đồ uống	40	2 12 2010	11 12 2010
	8	2-12-2018	3-12-2018
3.4.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho			
3.4.2.3.3. Thêm đồ uống	8	4-12-2018	4-12-2018
3.4.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá thực đơn			
3.4.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho	8	5-12-2018	5-12-2018
3.4.2.3.6. Lập báo cáo			
3.4.2.3.7. Xem thông tin khách hàng	4	6-12-2018	6-12-2018
3.4.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng	4	7-12-2018	7-12-2018
3.4.2.3.9. Xử lý quản lý	8	8-12-2018	11-12-2018
3.4.2.3.9.1. Quản lý tồn kho	4	8-12-2018	9-12-2018
3.4.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp	4	10-12-2018	11-12-2018
. Kiếm thử	52	12-12-2018	19/12/2018
4.1. Lập kế hoạch test	2	12-12-2018	12-12-2018
4.2. Viết test case theo yêu cầu	2	13/12/2018	13/12/2018
4.3. Test tổng thể	16	14/12/2018	15/12/2018
4.4. Test từng thành phần	16	16/12/2018	17/12/2018
4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê	8	18/12/2018	18/12/2018
4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử	8	19/12/2018	19/12/2018
. Nghiệm thu	40	20/12/2018	24/12/2018
5.1. Lắp đặt phần cứng	8	20/12/2018	20/12/2018
5.2. Cài đặt phần mềm	8	21/12/2018	21/12/2018
5.3. Đưa vào hoạt động	8	22/12/2018	22/12/2018
5.4. Sửa lỗi phát sinh	8	23/12/2018	23/12/2018
5.5. Lập báo cáo nghiệm thu	8	24/12/2018	24/12/2018
. Chuyển giao	10	25/12/2018	26/12/2018
6.1. Viết tài liệu hướng dẫn	2	25/12/2018	25/12/2018
6.2. Đào tạo	8	26/12/2018	26/12/2018
	0	27/12/2018	27/12/2018
		2.722720	
7.1. Bảo hành định kỳ	0	27/12/2018	27/12/2018
7. Bảo trì 7.1. Bảo hành định kỳ 7.2. Nâng cấp chương trình khi có phiên bản mới			27/12/2018 27/12/2018

Hình 3.34. Kế hoạch chi tiết của dự án quản lý quán cà phê Will Coffee


# - Nguồn lực công việc: người thực hiện

Công việc	Thời gian (giờ)	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người thực hiện
Hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee	310	26/10/2018	26/12/2018	01/11/11/11/11/11
Công tác chuẩn bị     1.1. Xác định mục tiêu và phạm vị	10	26/10/2018	30/10/2018	Chí, Hạnh, Nhàn, Duy Đinh Minh Chí
1.1. Xac dịnh mục tiêu và phạm vi 1.2. Lập bảng mô tả công việc	2	26/10/2018 27/10/2018	26/10/2018 27/10/2018	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh
1.3. Lập đề cương & Bảo vệ đề cương dự án	2	28/10/2018	28/10/2018	
1.4. Khảo sát sơ bộ và lập kế hoạch chi tiết	2	29/10/2018	29/10/2018	Dinh Minh Chí
1.5. Rà soát công tác chuẩn bị & Họp khởi động dụ		30/10/2018	30/10/2018	Chí, Hạnh, Nhàn, Duy
2. Phân tích	42	31/10/2018	9-11-2018	
2.1. Thu thập yêu cầu	8	31/10/2018	1-11-2018	
2.2. Xác định yêu cầu	2	2-11-2018	2-11-2018	
2.3. Tổng hợp yêu cầu	2	3-11-2018	3-11-2018	
2.4. Phân tích yêu cầu	8	4-11-2018	4-11-2018	Đinh Minh Chí
2.5. Viết đặc tả	8	5-11-2018	5-11-2018	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh
2.6. Rà soát khảo sát phân tích	8	6-11-2018	6-11-2018	_
2.7. Xác định nguồn lực	2	7-11-2018	7-11-2018	4
2.8. Lập kế hoạch thực hiện	2	8-11-2018	8-11-2018	_
2.9. Viết báo cáo phân tích	2 156	9-11-2018	9-11-2018	Chí, Hanh, Nhàn, Duy
3. Phát triển hệ thống 3.1. Thiết kế hệ thống tổng thế	8	10-11-2018 10-11-2018	9-12-2018 11-11-2018	Cili, Hailli, Milali, Duy
3.1.1. Thiết kế logic	8	10-11-2018	11-11-2018	Nguyễn Văn Duy
3.2. Thiết kế chi tiết các thành phần	72	12-11-2018	18/11/2018	Chí, Hạnh, Nhàn, Duy
3.2.1. Thiết kế giao diện	8			
3.2.2. Trang chủ	8	12-11-2018	12-12-2018	Nguyễn Văn Duy
3.2.3. Chức năng	48	13/11/2018	17/11/2018	Chí, Hạnh, Nhàn, Duy
3.2.3.1. Tìm tên đồ uống		, ,		
3.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho	8	13/11/2018	13/11/2018	Đinh Minh Chí
3.2.3.3. Thêm đồ uống				
3.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá	-			
3.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho	8	14/11/2018	14/11/2018	
3.2.3.6. Lập báo cáo				Dương Huỳnh Mỹ Hạnh
3.2.3.7. Xem thông tin khách hàng	8	15/11/2018	15/11/2018	
3.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng				4
3.2.3.9. Quản lý	16	16/11/2018	17/11/2018	
3.2.3.9.1. Quản lý tồn kho	8	16/11/2018	16/11/2018	_
3.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp 3.2.4. Hướng dẫn	8	17/11/2018	17/11/2018	Huỳnh Thanh Nhàn
3.2.5. Liên hệ	8	18/11/2018	18/11/2018	Trayini maini Wilani
3.2.6. Tin tức	, and the second	10/11/2010	10/11/2010	
3.3. Lập báo cáo thiết kế	8	19/11/2018	19/11/2018	Duy, Hạnh, Nhàn, Chí
3.4. Xây dựng	68	20/11/2018	11-12-2018	Chí, Hạnh, Nhàn, Duy
3.4.1. Thiết kế CSDL	8	20/11/2018	24/11/2018	
3.4.1.1. Tạo sơ đồ lớp		20/11/2018	20/11/2018	
3.4.1.2. Tạo các bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD		21/11/2018	22/11/2018	Đinh Minh Chí
3.4.1.3. Tạo các ràng buộc		23/11/2018	23/11/2018	
3.4.1.4. Lập báo cáo về CSDL	8	24/11/2018	24/11/2018	
3.4.2. Lập trình	60	25/11/2018	11-12-2018	
3.4.2.1. Cài đặt môi trường	4	25/11/2018	25/11/2018	Huỳnh Thanh Nhàn
3.4.2.2. Quản trị hệ thống	16	26/11/2018	01/12/2018	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh
3.4.2.2.1. Quản lý nhân viên	8	26/11/2018	28/11/2018	
3.4.2.2.2. Quản lý khách hàng	8	29/11/2018	01/12/2018	-14 113
3.4.2.3. Xử lý chức năng	40	2-12-2018	11-12-2018	Chí, Hạnh, Nhàn
3.4.2.3.1. Tìm tên đồ uống	8	2-12-2018	3-12-2018	
3.4.2.3.2. Tạo phiếu nhập kho				-
3.4.2.3.3. Thêm đồ uống	8	4-12-2018	4-12-2018	Đinh Minh Chí
3.4.2.3.4. Cập nhật và in bảng giá thực đơn 3.4.2.3.5. Tạo phiếu xuất kho				-
3.4.2.3.6. Lập báo cáo	8	5-12-2018	5-12-2018	
3.4.2.3.7. Xem thông tin khách hàng	4	6-12-2018	6-12-2018	
3.4.2.3.8. Xem chi tiết đơn hàng	4	7-12-2018	7-12-2018	Dương Huỳnh Mỹ Hạnh
3.4.2.3.9. Xử lý quản lý	8	8-12-2018	11-12-2018	
3.4.2.3.9.1. Quản lý tồn kho	4	8-12-2018	9-12-2018	Huỳnh Thanh Nhàn
3.4.2.3.9.2. Quản lý nhà cung cấp	4	10-12-2018	11-12-2018	7
4. Kiếm thử	52	12-12-2018	19/12/2018	
4.1. Lập kế hoạch test	2	12-12-2018	12-12-2018	Nguyễn Văn Duy
4.2. Viết test case theo yêu cầu				7
·	2	13/12/2018	13/12/2018	_
4.3. Test tổng thể	2 16	13/12/2018 14/12/2018	15/12/2018	
4.3. Test tổng thể 4.4. Test từng thành phần				Duy, Hạnh, Nhàn
0	16	14/12/2018	15/12/2018	Duy, Hạnh, Nhàn
4.4. Test từng thành phần	16 16	14/12/2018 16/12/2018	15/12/2018 17/12/2018	Duy, Hạnh, Nhàn Nguyễn Văn Duy
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê	16 16 8	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018	
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng	16 16 8 8 40	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 24/12/2018 20/12/2018	Nguyễn Văn Duy
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Bảo cáo quá trình kiếm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lắp đặt phần cứng 5.2. Cài đặt phần mềm	16 16 8 8 40 8	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 24/12/2018 20/12/2018 21/12/2018	Nguyễn Văn Duy Dương Huỳnh Mỹ Hạnh
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiếm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cài đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động	16 16 8 8 40 8 8	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 24/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018	Nguyễn Văn Duy
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Bảo cáo quá trình kiểm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cài đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh	16 16 8 8 40 8 8 8 8	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 24/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 22/12/2018 23/12/2018	Nguyễn Văn Duy  Dương Huỳnh Mỹ Hạnh
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lắp đặt phần cứng 5.2. Cái đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phật sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu	16 16 8 8 8 40 8 8 8 8	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 22/12/2018 23/12/2018 24/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 24/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018 23/12/2018 24/12/2018	Nguyễn Văn Duy  Dương Huỳnh Mỹ Hạnh
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiếm thử 5.Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Câi đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu 6. Chuyến giao	16 16 8 8 8 40 8 8 8 8 8	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018 24/12/2018 24/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 24/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018 24/12/2018 24/12/2018 24/12/2018	Nguyễn Văn Duy Dương Huỳnh Mỹ Hạnh Huỳnh Thanh Nhàn
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Bảo cáo quá trình kiếm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cải đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu 6. Chuyển giao 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn	16 16 8 8 8 40 8 8 8 8 8 8	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018 24/12/2018 24/12/2018 25/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 24/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018 24/12/2018 24/12/2018 26/12/2018 25/12/2018	Nguyễn Văn Duy  Dương Huỳnh Mỹ Hạnh
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Bảo cáo quá trình kiếm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cài đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu 6. Chuyển giao 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn 6.2. Đào tạo	16 16 8 8 8 40 8 8 8 8 10 2 8	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018 24/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 25/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 24/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 22/12/2018 24/12/2018 26/12/2018 25/12/2018 26/12/2018	Nguyễn Văn Duy Dương Huỳnh Mỹ Hạnh Huỳnh Thanh Nhàn
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Báo cáo quá trình kiểm thử 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cái đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu 6. Chuyển giao 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn 6.2. Đào tạo 7. Bảo trì	16 16 8 8 8 40 8 8 8 8 10 2 8	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018 18/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 22/12/2018 24/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 26/12/2018 26/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 24/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018 24/12/2018 26/12/2018 25/12/2018 26/12/2018 26/12/2018 26/12/2018	Nguyễn Văn Duy  Dương Huỳnh Mỹ Hạnh Huỳnh Thanh Nhàn  Đinh Minh Chí
4.4. Test từng thành phần 4.5. Test sự hài lòng của nhân viên quán cà phê 4.6. Bảo cáo quá trình kiếm thử 5. Nghiệm thu 5.1. Lấp đặt phần cứng 5.2. Cài đặt phần mềm 5.3. Đưa vào hoạt động 5.4. Sửa lỗi phát sinh 5.5. Lập báo cáo nghiệm thu 6. Chuyển giao 6.1. Viết tài liệu hướng dẫn 6.2. Đào tạo	16 16 8 8 8 40 8 8 8 8 10 2 8	14/12/2018 16/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 23/12/2018 24/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 25/12/2018 25/12/2018	15/12/2018 17/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 24/12/2018 20/12/2018 21/12/2018 22/12/2018 22/12/2018 24/12/2018 26/12/2018 25/12/2018 26/12/2018	Nguyễn Văn Duy Dương Huỳnh Mỹ Hạnh Huỳnh Thanh Nhàn

Hình 3.35 Nguồn lực công việc của dự án


#### 3.4.3.2.2 Công cụ Trello, Github

- Quản lý công việc bằng Trello

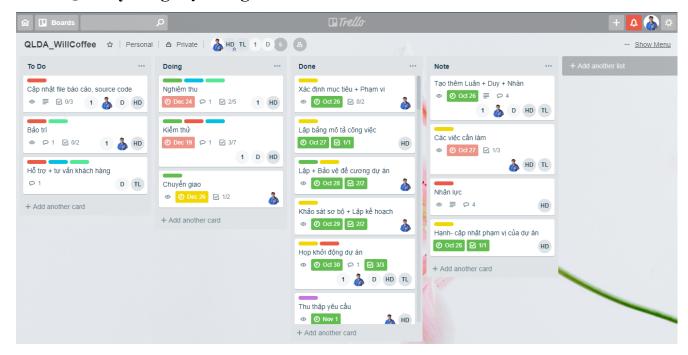

Hình 3.36.1 Quản lý công việc bằng Trello

- Quản lý source code bằng Github




Hình 3.36.2 Quản lý source code bằng Github

#### 3.4.3.3 Cơ sở hạ tầng

- Quán cà phê Will Coffe có diện tích 30x40 m².
- Gồm 9 bộ phận: Bộ phận pha chế; Bộ phận thu ngân; Khu vực khách uống; Nhà vệ sinh cho khách; Nhà vệ sinh cho nhân viên; Phòng quản lý; Phòng kế toán; Phòng nghỉ nhân viên; Kho nguyên liệu.

# - Sơ đồ mặt bằng

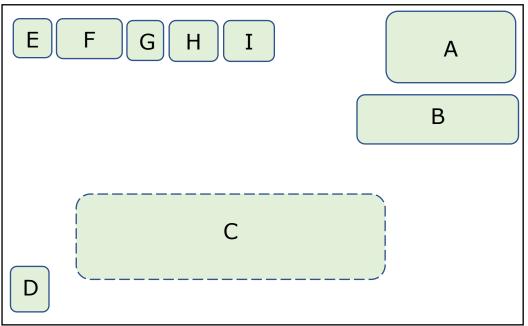

Hình 3.37. Sơ đồ mặt bằng quán cà phê Will Coffee

#### Trong đó:

- A: Bộ phận pha chế.
- B. Bộ phận thu ngân.
- C. Khu vực khách uống.
- D: Nhà vệ sinh cho khách.
- E: Nhà vê sinh cho nhân viên.
- F: Phòng quản lý.
- G: Phòng kế toán.
- H: Phòng nghỉ nhân viên.
- I: Kho nguyên liệu.

# 3.4.3.4 Xác nhận yêu cầu người dùng

- Lập kế hoạch gửi tài liệu yêu cầu người dùng

Bảng 3.38. Danh sách sản phẩm bàn giao

STT	Hạng mục	Thời gian	Thời gian Địa điểm	
		chuyển giao	chuyển giao	
1	Tài liệu phân tích và	10/11/2018	Quán Will	Chuyển qua
	thiết kế hệ thống		Coffee	email
2	Tài liệu danh sách giao	18/11/2018	Quán Will	Chuyển qua
	diện		Coffee	email
3	Tài liệu đặc tả yêu cầu	9/11/2018	Quán Will	Chuyển qua
	SRS		Coffee	email
4	Tài liệu thư viện dữ liệu	24/12/2018	Quán Will	Chuyển qua
			Coffee	email
5	Tài liệu hướng dẫn sử	25/12/2018	Quán Will	Chuyển qua
	dụng		Coffee	email
6	Tài liệu hướng dẫn cài	25/12/2018	Quán Will	Chuyển qua
	đặt		Coffee	email
7	Tài liệu kỹ thuật	25/12/2018	Quán Will	Chuyển qua
			Coffee	email
8	Biên bản nghiệm thu	24/12/2018	Quán Will	Chuyển qua
			Coffee	email
9	Phần mềm, hệ thống	26/12/2018	Quán Will	Chuyển qua
	ứng dụng hoàn thiện		Coffee	email

## 3.4.4 Kiểm tra chất lượng sản phẩm

#### 3.4.4.1 Quản lý chất lượng

#### a) Lập kế hoạch chất lượng

- Bộ phận: Tổ quản lý chất lượng
- Dự án: Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê Will Coffee.
- Chịu trách nhiệm: Trần Hoàng Luân.
- Vai trò: Tổ trưởng tổ quản lý chất lượng.
- Quyết định tiêu chuẩn:

#### + Tính chức năng:

- O Phù hợp với các yêu cầu của khách hàng quán cà phê Will Coffee.
- O Phải đưa ra kết quả chính xác với hiệu quả cao.
- Phân quyền đăng nhập cho hệ thống, người có tài khoản mới được đăng nhập vào hệ thống.

## + Tính tin cậy:

- O Phải phục hồi được dữ liệu khi dữ liệu bị mất.
- Phần mềm phải thỏa mãn các tiêu chuẩn, dễ cài đặt.

# + Tính hiệu quả:

- Phần mềm phải hoạt động hiệu quả, thời gian xử lý nhanh.
- O Sử dụng hợp lý tài nguyên hệ thống.

#### + Khả năng bảo hành, bảo trì:

- Bộ phận tester và lập trình viên đảm bảo phần mềm có thể phân tích và sửa chữa khi gặp lỗi.
- Đảm bảo phần mềm có thể bảo trì, sửa chữa khi khách hàng gặp sự cố trong thời gian bảo hảnh.

#### + Tính khả chuyển:

Phần mềm chỉ thích với hê điều hành window.

#### + Tính khả dụng:

- Phần mềm phải có giao diện dễ hiểu và dễ sử dụng.
- o Khách hàng (người dùng) có thể học được.
- Bộ phận Tester (Nguyễn Văn Duy) có vai trò rà soát tất cả các kết quả chuyển giao công việc.

#### Phương pháp Quản lý chất lượng: Theo ISO/IEC 14598.

Quy trình đánh giá chất lượng:



Hình 3.39. Sơ đồ quy trình đánh giá chất lượng

# 3.4.4.2 Thiết lập khung đảm bảo chất lượng

Các phương pháp luận, tiêu chuẩn hướng dẫn hợp lý.

Quy trình kiểm soát thay đổi hiệu quả với đội ngũ lập trình viên và tester ưu tú.

Tập trung rà xét các hoạt động kiểm soát chất lượng.

Bảng 3.40. Danh sách các hoạt động đảm bảo chất lượng của dự án

Hoạt động đảm bảo chất lượng	Công tác đảm bảo chất lượng	Thực hiện
Kiểm tra và đánh	Kiểm tra tính đúng đắn của các tài	-Trần Hoàng Luân
giá các tài liệu dự	liệu dự án, kế hoạch quản lý rủi ro,	-Đinh Minh Chí
án	kế hoạch thử nghiệm, kế hoạch quản lý cấu hình, kế hoạch quản lý chất lượng, yêu cầu hệ thống kỹ thuật, thiết kế hệ thống, hệ thống testcase và hội nhập testcase	-Nguyễn Văn Duy
Kiểm tra và đánh	Kiểm tra tiến trình làm việc đúng	- Đinh Minh Chí
giá tiến trình làm việc của dự án	theo các yêu cầu, công thức và yêu cầu chuẩn của công ty.	- Trần Hoàng Luân
Đo lường chất lượng cho dự án	Dùng các công thức tính độ đo cho dự án để xem xét chất lượng dự án trước mỗi lần giao cho khách hàng.	- Trần Hoàng Luân
Đánh giá và báo cáo chất lượng dự án	Báo cáo chất lượng dự án dựa trên các độ đo.	- Trần Hoàng Luân - Đinh Minh Chí

## 3.4.4.3 Kiểm soát chất lượng

Đinh Minh Chí (PM) sẽ lập văn bản để kiểm soát chất lượng.

- Rà sóat các nhóm lập trình của Dương Huỳnh Mỹ Hạnh, Huỳnh Thanh Nhàn.
- Khảo sát người sử dụng phần mềm, đưa ra các câu hỏi phỏng vấn.

#### 3.4.5 Báo cáo dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, nếu phát sinh những vấn đề của dự án quá lớn,
 ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án thì PM yêu cầu họp dự án bao gồm
 các thành viên trong dự án → đưa ra cách giải quyết.


#### Triển khai các hoạt động hiệu chỉnh:

- Giai đoạn đầu tháng 12, dự án đã diễn ra không theo kế hoạch, chất lượng phần mềm chưa đạt yêu cầu.
- Điều chỉnh: Thuê chuyên gia Trần Sang 1 ngày với chi phí 500 nghìn/1 ngày.
- Giai đoạn giữa tháng 12, bộ phận tester làm việc vất vả, không kịp cho tiến độ.
- Điều chỉnh: Trần Hoàng Luân (BA) sang hỗ trợ bộ phận Tester cho Nguyễn Văn
   Duy.

## 3.5 Kế hoạch quản lý rủi ro

- Tuân thủ Quy trình quản lý rủi ro.

#### 3.5.1 Quá trình quản lý rủi ro trong khảo sát thực hiện dự án

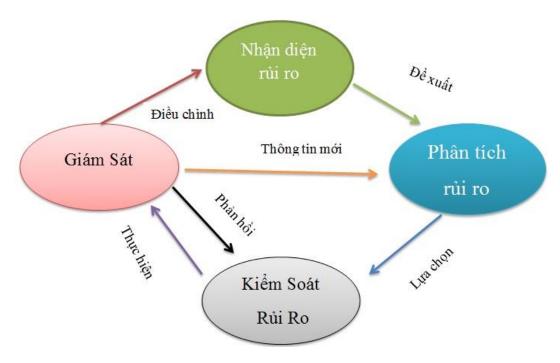

Hình 3.41. Sơ đồ quá trình quản lý rủi ro trong khảo sát thực hiện dự án

# 3.5.2 Lập biểu phân tích rủi ro của dự án

#### 3.5.2.1 Khách hàng

Bảng 3.42. Rủi ro liên quan đến khách hàng

STT	Mô tả	Mức độ	Hậu quả	Xử lý
1	Nhân viên, quản lý không biết sử dụng phần mềm	Cao	Cao	Tổ chức huấn luyện sử dụng.
2	Cơ sở hạ tầng	Thấp	Cao	Hầu như không phải thay đổi gì về cơ sở hạ tầng.
3	Thay đổi cơ cấu tổ chức	Thấp	Thấp	Hầu như không có ảnh hưởng gì.
4	Trình độ tin học của người dùng	Thấp	Cao	Viết phần mềm

### **3.5.2.2** Phương án

Bảng 3.43. Rủi ro liên quan về phương án

STT	Mô tả	Mức độ	Hậu quả	Xử lý
1	Bên triển khai đề án	Trung	Trung	Cần có sự hỗ trợ của
1	không nắm rõ nghiệp vụ	bình	bình	khách hàng
2	Kinh phí phát sinh quá	Thấp	Cao	Lựa chọn phương án
2	lớn	тпар	Cao	hợp lý

#### 3.5.2.3 Nhân sự

Bảng 3.44. Rủi ro liên quan đến nhân sự

STT	Mô tả	Mức độ	Hậu quả	Xử lý
1	Không thực hiện kịp tiến	Cao	Cao	Cần lên kế hoạch rõ
	độ dự án			ràng, cụ thể
2	Mối quan hệ giữa các thành viên	Thấp	Cao	Gặp gỡ hàng ngày, có sự phân công công việc rõ ràng, thêm hoạt động kết nói thành viên.

# **3.5.2.4 Môi trường**

Bảng 3.45. Phương án trong quản lý rủi ro liên quan đến khách hàng

STT	Mô tả	Mức độ	Hậu quả	Xử lý
1	Cạnh tranh với các phần mềm quản lý quán cà phê hiện có sẵn tại trường	Thấp	Trung bình	Xây dựng phần mềm chất lượng.

#### 3.6 Kế hoạch chọn lựa giải pháp

#### 3.6.1 Lập phương án

#### 3.6.1.1 Phương án tối thiểu

- Về phần cứng: Sử dụng các thiết bị máy tính hiện tại.

# - Về phần mềm:


- Sử dụng hệ điều hành win 7 cài sẵn trên các máy tính tiền và hệ điều hành
   Windows 8.1 cài sẵn trên máy chủ.
- o Sử dụng bộ gõ Unikey 4.2.
- o Sử dụng CSDL SQL Server 2012.

# - Về người dùng:

 Người dùng được phép sử dụng phần mềm với các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.

#### - Công nghệ sử dụng:

- Sử dụng công nghệ .Net viết bằng ngôn ngữ C# để thực hiện các chức năng như: hiển thị thông tin, xử lý thông tin theo nghiệp vụ, trao đổi thông tin, cho phép thanh toán. Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server Express 2014 để trữ thông tin.
- Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng:

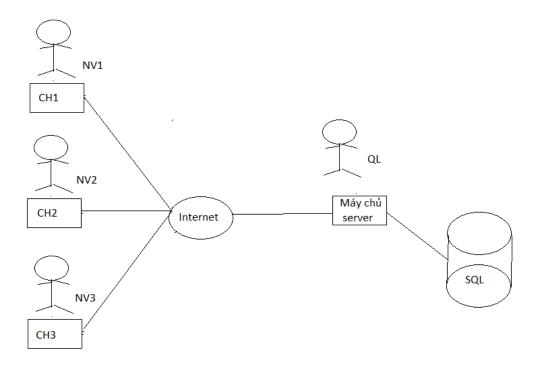


Hình 3.46. Sơ đồ các thành phần của hệ thống quản lý bán hàng theo phương án tối thiểu

- Ước lượng chi phí:
- + Chi phí phần cứng: 0 VND.
- + Chi phí phần mềm:
  - O Phần mềm hỗ trợ quản lý cửa hàng: 5 triệu VND.
  - o Phần mềm khác: 0 VND.
- + Chi phí huấn luyện: 300 nghìn VND.
- + Chi phí khác (điện, bảo trì....): 1 triệu VND/ tháng do sử dụng thiết bị liên tục trong ngày.
- Ưu, khuyết điểm:
  - + Ưu điểm:
- o Sử dụng CSDL SQL Server 2014 để lưu trữ dữ liệu đơn giản, dễ dàng thao tác.
- O Sử dụng được các thiết bị máy tính hiện tại.
- O Phần mềm tiện dụng, giao diện đơn giản giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác.
  - + Nhược điểm:
- o Người dùng phải sử dụng thiết bị tại cửa hàng.

- Sử dụng CSDL SQL Server 2012 không truy xuất được lượng dữ liệu lớn, tốn kém chi phí khi mở rộng, tốc độ truy cập chậm hơn.
- O Không có internet sẽ không kết nối được phần mềm.

# **3.6.1.2** Phương án đề xuất 1

- Về phần cứng:
- O Sử dụng các thiết bị máy tính hiện tại.
- O Người dùng có thể sử dụng ứng dụng bằng các thiết bị cá nhân.
  - Về phần mềm:
- Sử dụng hệ điều hành win 7 cài sẵn trên các máy tính tiền và hệ điều hành
   Windows 8.1 cài sẵn trên máy chủ.
- o Sử dụng bộ gõ Unikey 4.2.
- o Sử dụng CSDL MySQL.
  - Về người dùng:
- Người dùng được phép sử dụng phần mềm với các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.
- Người dùng có thể từ bên ngoài truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.
  - *Công nghệ sử dụng:* Sử dụng công nghệ PHP, Javascript viết trên Web để thực hiện các chức năng như: hiển thị thông tin, xử lý thông tin theo nghiệp vụ, trao đổi thông tin, cho phép thanh toán. Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin.
  - Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng:

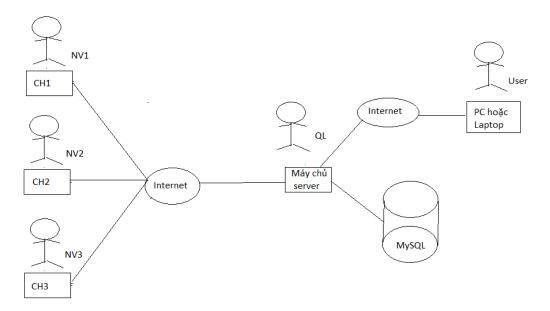


Hình 3.47. Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng theo phương án đề xuất 1

- Ước lượng chi phí:
- + Chi phí phần cứng: 0 VND.
- + Chi phí phần mềm:
  - o Úng dụng hỗ trợ quản lý cửa hàng: 4 triệu VND.
  - o Phần mềm khác: 0 VND.
- + Chi phí huấn luyện: 200 nghìn VND.
- + Chi phí khác (điện, bảo trì....): 1 triệu VND/ tháng do sử dụng thiết bị liên tục trong ngày.
- Ưu, khuyết điểm:
- + Ưu điểm:
- O Sử dụng CSDL MySQL để lưu trữ dữ liệu đơn giản, dễ dàng thao tác.
- O Sử dụng được các thiết bị máy tính hiện tại.
- Úng dụng Website tiện dụng, giao diện đơn giản giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác.
- Người dùng có thể sử dụng phần mềm bằng máy tính cá nhân ở bên ngoài cửa hàng.
- + Nhược điểm:

- Sử dụng công nghệ PHP là mã nguồn mở và miễn phí nên độ bảo mật không cao,
   chỉ chạy được trên ứng dụng web.
- O CSDL MySQL có độ bảo mật chưa cao, quá trình Restore có phần chậm chạp.
- O Không có internet sẽ không kết nối được phần mềm.
- o Úng dụng chiếm nhiều băng thông.

#### 3.6.1.3 Phương án đề xuất 2

- Về phần cứng:
- O Sử dụng các thiết bị máy tính hiện tại.
- O Người dùng có thể sử dụng ứng dụng bằng các thiết bị cá nhân.
  - Về phần mềm:
- Sử dụng hệ điều hành win 7 cài sẵn trên các máy tính tiền và hệ điều hành
   Windows 8.1 cài sẵn trên máy chủ.
- o Sử dụng bộ gõ Unikey 4.2.
- o Sử dụng CSDL MySQL.
  - Về người dùng:
- Người dùng được phép sử dụng phần mềm với các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.
- Người dùng có thể từ bên ngoài truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.
  - *Công nghệ sử dụng:* Sử dụng công nghệ PHP, Javascript kết hợp với framework Angular viết trên Web để thực hiện các chức năng như: hiển thị thông tin, xử lý thông tin theo nghiệp vụ, trao đổi thông tin, cho phép thanh toán. Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin.
  - Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng:

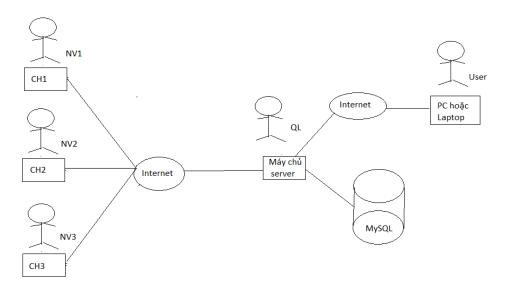

Hình 3.48. Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng theo phương án đề xuất 2

#### - Ước lượng chi phí:

- + Chi phí phần cứng: 0 VND.
- + Chi phí phần mềm:
  - o Úng dụng hỗ trợ quản lý cửa hàng: 7 triệu VND.
  - o Phần mềm khác: 0 VND.
- + Chi phí huấn luyện: 200 nghìn VND.
- + Chi phí khác (điện, bảo trì....): 1 triệu VND/ tháng do sử dụng thiết bị liên tục trong ngày.

# - Ưu, khuyết điểm:

- + Ưu điểm:
- O Sử dụng CSDL MySQL để lưu trữ dữ liệu đơn giản, dễ dàng thao tác.
- o Sử dụng được các thiết bị máy tính hiện tại.
- Úng dụng Website tiện dụng, giao diện đơn giản giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác.
- Người dùng có thể sử dụng phần mềm bằng máy tính cá nhân ở bên ngoài cửa hàng.

- Angular có thể chạy trên hầu hết các trình duyệt điện thoại thông minh, sử dụng data bind giống .NET với tính năng liên kết với HTML nên giúp người dùng cảm thấy dễ chịu, tương thích nhiều phiên bản trình duyệt web.
- + Nhươc điểm:
- O Sử dụng công nghệ PHP là mã nguồn mở và miễn phí nên độ bảo mật không cao.
- o CSDL MySQL có độ bảo mật chưa cao, quá trình Restore có phần chậm chạp.
- Không có internet sẽ không kết nối được phần mềm.
- o Úng dụng chiếm nhiều băng thông.
- Angular được phát triển từ javascript nên nó không an toàn, phía máy chủ phải thường xuyên xác nhận quyền để hệ thống chạy tron tru.

# 3.6.1.4 Phương án tối đa

# - Về phần cứng:

- O Sử dụng các thiết bị máy tính hiện tại.
- O Người dùng có thể sử dụng ứng dụng bằng các thiết bị cá nhân.

#### - Về phần mềm:

- Sử dụng hệ điều hành win 7 cài sẵn trên các máy tính tiền và hệ điều hành
   Windows 8.1 cài sẵn trên máy chủ.
- O Sử dụng bộ gõ Unikey 4.2.
- o Sử dụng CSDL Oracle.


# - Về người dùng:

- Người dùng được phép sử dụng phần mềm với các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.
- Người dùng có thể từ bên ngoài truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tùy theo cấp độ phân quyền.

# - Công nghệ sử dụng:

Sử dụng công nghệ ASP.Net viết trên Webform để thực hiện các chức năng như: hiển thị thông tin, xử lý thông tin theo nghiệp vụ, trao đổi thông tin, cho phép thanh toán. Sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle để lưu trữ thông tin.

- O Sử dụng API quét mã vạch.
  - Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng:

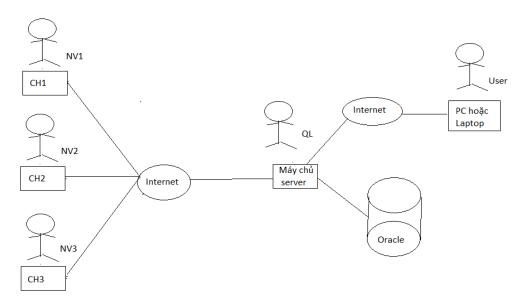

Hình 3.49. Các thành phần của hệ thống quản lý cửa hàng theo phương án tối đa

- Ước lượng chi phí:
- + Chi phí phần cứng: 4 triệu VND/ cửa hàng.
- + Chi phí phần mềm:
  - Úng dụng hỗ trợ quản lý cửa hàng: 20 triệu VND do áp dụng các công nghệ mới như Oracle với những tính năng hỗ trợ lượng người dùng lớn, dữ liệu lưu trữ không tập trung, tính an toàn, bảo mật cao, cho phép user truy nhập tới CSDL phân tán như một khối thống nhất, cài đặt được trên đa hệ điều hành.
  - o Phần mềm khác: Oracle 10 Enterprise Edition 40USD.
- + Chi phí huấn luyện: 200 nghìn VND.
- + Chi phí khác (điện, bảo trì....): 1 triệu VND/ tháng do sử dụng thiết bị liên tục trong ngày.
- Ưu, khuyết điểm:
- + Ưu điểm:
- O Quản lý được cơ sở dữ liệu, hệ thống rất lớn.

- Phần mềm Oracle được tích hợp tất cả các công cụ để quản trị cũng như nhập xuất dữ liệu nên rất tiện lợi cho người quản trị.
- O Có thể cài đặt trên đa hệ điều hành.
- O Sử dụng được các máy tính hiện có.
- Người dùng có thể sử dụng máy vào bất kỳ địa điểm và thời gian nào thích hợp với mình.
- o Dễ dàng kiểm soát người dùng.
- + Nhược điểm:
- Phí bản quyền rất đắt.
- o Hệ thống chiếm nhiều băng thông.
- O Thời gian cài đặt lâu, chi phí cao.
- O Không tương thích với các công nghệ của Microsoft.
- O Công cụ thiết kế và lập trình không phổ biến (Sử dụng ngôn ngữ Java).
- O Phải có internet mới kết nối được phần mềm.

#### 3.6.2 Các lựa chọn phương án

- Phương án được chọn lựa là phương án đề xuất thứ 1 vì nó thỏa những tiêu chí sau:
- + Có thể sử dụng máy tính cá nhân để quản lý, xem thông tin cá nhân.
- + Giúp người dùng có thể sử dụng hệ thống với giao diện đơn giản, dễ thao tác.
- + Dễ bảo trì và mở rộng thêm chức năng.
- + Có thể truy cập bất kì đâu với điều kiện nơi đó phải có internet.
- + Chi phí đầu tư thấp.

#### 3.7 Kế hoạch quản lý cấu hình (CM)

# 3.7.1 Quy định

- BA Trần Hoàng Luân là ngươi chịu trách nhiệm về quản lý cấu hình.
- Có một kho quản lý cấu hình được đặt tại văn phòng dự án.

- BA sẽ bổ sung các điều khoản mới vào kho cấu hình.

#### 3.7.2 Xác định cấu hình

- Đơn vị cấu hình:
  - Bao gồm tài liệu, phần mềm phát triển, thông tin về phần mềm hệ thống.
- Ví dụ cụ thể như sau:

Bảng 3.50. Danh các tài liệu mẫu

STT	Loại tài liệu	Tên tài liệu	Mã số tài liệu
1	Doc	Quản lý dự án	
2	Doc	Thông tin về quán cà phê Will Coffee.	
3	SW	Source code C#	
4	Pdf	Lập trình C# .Net	

# 3.7.3 Cấu hình sản phẩm (baseline)

Là một tập hợp các phiên bản của các đơn vị cấu hình có quan hệ logic chặt chẽ với nhau tạo thành một trạng thái sản phẩm và được phê duyệt.

Thời điểm baseline được xác định căn cứ vào các giai đoạn thực hiện dự án. Ví dụ về baseline:

Bảng 3.51. Danh sách các baseline ID

Baseline ID	Giai đoạn
STARTUP	Khởi tạo dự án
SRS	Phân tích và lập kế hoạch dự án
CODE	Hoàn thành code
PRODUCT	Bàn giao cho khách hàng

#### 3.7.4 Lưu trữ cấu hình

Có ít nhất 3 loại thư mục với quyền truy xuất phù hợp.

- Thư mục phát triển dùng để phát triển sản phẩm.
- Thư mục kiểm soát dùng để lưu các phiên bản của cấu hình.
- Thư mục lưu trữ lưu các cấu hình.

# 3.7.5 Quyền truy xuất

Bảng 3.52. Quyền truy xuất trong hệ thống của nhân viên

Nhân viên	Quyền truy xuất	Ðọc	Chèn	Thay thế	Xóa
Lập trình viên (Huỳnh Thanh Nhàn, Dương Huỳnh Mỹ Hạnh)	Thư viện phát triển	Y	Y	Y	Y
	Thư viện tổng thể	N	N	N	N
	Thư viện lưu trữ	N	N	N	N
Người quản lý cấu hình (Trần Hoàng Luân)	Thư viện phát triển	Y	Y	Y	Y
	Thư viện tổng thể	Y	Y	N	N

Nhân viên	Quyền truy xuất	Ðọc	Chèn	Thay thế	Xóa
	Thư viện lưu trữ	Y	N	N	N

# 3.8 Kế hoạch quản lý dữ liệu

- Lập danh sách tài liệu theo dự án.
- Lập kế hoạch kiểm tra tài liệu theo Quy trình kiểm tra.
- Lập kế hoạch lưu trữ tài liệu theo Quy định quản lý cấu hình.
- Tuân thủ Quy trình quản lý thay đổi.

## 3.9 Kế hoạch quản lý thay đổi

- Các thành viên sẽ cập nhật các nội dung vào báo cáo và lưu lại lịch sử thay đổi.

Bảng 3.53. Lịch sử thay đổi

Người thực hiện	Ngày thực hiện	Nội dung	Phiên
			bản
Đinh Minh Chí	26/10/2018	Tạo tài liệu, cập nhật phần xác	1.0.0
		định mục tiêu và phạm vi.	
Dương Huỳnh	27/10/2018	Cập nhật phần Lập bảng mô tả	1.0.1
Mỹ Hạnh		công việc.	
Đinh Minh Chí	28/12/2018 đến	Cập nhật phần Lập đề cương	1.0.2
	29/12/2018	và kế hoạch chi tiết.	
Đinh Minh Chí +	30/10/2018 đến	Cập nhật phần Phân tích và xác	1.0.3
Dương Huỳnh Mỹ	09/11/2018	định yêu cầu, lập kế hoạch	
Hạnh		thực hiện, viết báo cáo.	

Dương Huỳnh Mỹ	10/11/2018 đến	Thiết kế logic.	1.0.4
Hạnh	11/11/2018		
Dương Huỳnh Mỹ	12/11/2018	Cập nhật phần Thiết kế giao	1.0.5
Hạnh		diện và trang chủ.	
Đinh Minh Chí	13/11/2018	Cập nhật phần Thiết kế chức	1.0.6
		năng tìm tên đồ uống, tạo	
		phiếu nhập kho, thêm đồ uống.	
Dương Huỳnh Mỹ	14/11/2018 đến	Cập nhật phần chức năng: tạo	1.0.7
Hạnh	17/11/2018	phiếu xuất kho, cập nhật và in	
		bảng giá, lập báo cáo, xem	
		thông tin khách hàng, xem chi	
		tiết đơn hàng, quản lý tồn kho,	
		quản lý nhà cung cấp.	
Đinh Minh Chí +	19/11/2018	Cập nhật phần lập báo cáo thiết	1.0.8
Dương Huỳnh Mỹ		kế.	
Hạnh			
Đinh Minh Chí	20/11/2018 đến	Cập nhật phần Thiết kế cơ sở	1.0.9
	24/11/2018	dữ liệu: tạo sơ đồ lớp, tạo các	
		bảng dữ liệu và vẽ sơ đồ ERD,	
		tạo các ràng buộc, lập báo cáo	
		về CSDL.	
Dương Huỳnh Mỹ	25/11/2018 đến	Cập nhật phần Lập trình: cài	1.0.10
Hạnh	01/12/2018	đặt môi trường, quản trị hệ	
		thống nhân viên, khách hàng.	
Đinh Minh Chí +	02/12/2018 đến	Cập nhật phần Lập trình: xử lý	1.0.11
Dương Huỳnh Mỹ	11/12/2018	chức năng tìm tên đồ uống, tạo	
Hạnh		phiếu nhập kho, thêm đồ uống,	

		tạo phiếu xuất kho, lập báo	
		cáo, xem thông tin khách hàng	
Dương Huỳnh Mỹ	12/12/2018 đến	Cập nhật phần kiểm thử	1.0.12
Hạnh	19/12/2018		
Đinh Minh Chí +	20/12/2018 đến	Cập nhật phần nghiệm thu	1.0.13
Dương Huỳnh Mỹ	24/12/2018		
Hạnh			
Đinh Minh Chí	25/12/2018 đến	Cập nhật phần chuyển giao +	1.0.14
	27/12/2018	bảo trì	
Đinh Minh Chí +	27/12/2018	Cập nhật phần hỗ trợ	1.0.15
Dương Huỳnh Mỹ			
Hạnh			

# 3.10 Kế hoạch quản lý các bên liên quan

- Sau khi nhận đơn đặt hàng:
  - Lập bảng có liên quan đến dự án (trực tiếp và gián tiếp).
  - O Gán vai trò và mô tả trách nhiệm của từng vai trò.
  - o Lấy thông tin liên hệ.
- Lưu danh sách nhân sự lên issue đặt chương trình.
- Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có thay đổi về nhân sự thì cập nhật theo Quy trình quản lý thay đổi và baseline tài liệu theo Quy định quản lý cấu hình.

# 3.11 Kế hoạch kết thúc dự án

## 3.11.1 Kế hoạch hỗ trợ dự án: hỗ trợ UAT, hỗ trợ sau golive

Bảng 3.54. Kế hoạch hỗ trợ dự án

STT	Nội dung	Thời gian hỗ trợ
1	Hỗ trợ nghiệp vụ trong quá	Thời gian UAT
	trình UAT	
	Hỗ trợ cài đặt source UAT	
2	Hỗ trợ xử lý lỗi sau triển	1 tuần sau triển khai
	khai	

# $3.11.2~{ m K\'e}$ hoạch hỗ trợ kỹ thuật theo khoảng thời gian bảo hành được ghi nhận trong hợp đồng

Bảng 3.55. Kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật

STT	Nội dung	Thời gian hỗ trợ
1	Hỗ trợ xử lý lỗi phát sinh	1 năm sau khi triển khai
	trong quá trình sử dụng	
2	Hỗ trợ chỉnh sửa thông số	1 năm sau khi triển khai
	hệ thống	

# 3.11.3 Kế hoạch bảo trì sau khi đóng dự án

Bảng 3.56. Kế hoạch bảo trì

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Sửa lỗi và chỉnh sửa thông	Theo hợp đồng bảo trì chung
	số hệ thống	


#### 3.11.4 Giao diện chương trình

- Giao diện đăng nhập: nhập tên đăng nhập, mật khẩu.




Hình 3.57. Giao diện đăng nhập

Giao diện chính




Hình 3.5. Giao diện chính

- Giao diện Admin thống kê doanh thu




Hình 3.59. Giao diện Admin thống kê doanh thu

- Giao diện Admin thêm/xóa/sửa đồ uống




Hình 3.60. Giao diện Admin thêm/xóa/sửa đồ uống

Giao diện Admin thêm/xóa/sửa loại đồ uống



Hình 3.61. Giao diện Admin thêm/xóa/sửa loại đồ uống

- Giao diện Admin thêm bàn



Hình 3.62. Giao diện Admin thêm bàn

#### 3.11.5 Tổng kết dự án

## a) Lý do phát triển dự án

- Dự án xây dựng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng trong lĩnh vực bán hàng.
- Giúp cho hoạt động kinh doanh của các cửa hàng trở nên thuận lợi hơn.

# b) Những kết quả đã đạt được

Dự án đã hoàn thành theo mục tiêu đề ra và đi vào hoạt động:

- Bước đầu đáp ứng mục tiêu bán hàng của khách hàng và tiếp theo sẽ mở rộng đa dang hơn về các lĩnh vực khác.
- Đáp ứng cơ bản những nhu cầu của khách hàng.

 Qua việc thực hiện dự án, các thành viên trong dự án rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân như kinh nghiệm làm việc nhóm, nhiều kiến thức hữu ích, khả năng tự học hỏi và làm việc nhóm một cách chuyên nghiệp có quy trình.

#### c) Đánh giá và kết quả của dự án

Bảng 3.58. Đánh giá dự án

Mô tả	Dự kiến ban đầu	Thực tế	Kết luận
Thời gian	70 ngày	62 ngày	Dự án hoàn thành
hoàn thành dự án	(trừ Chủ nhật) (26/10/2018 đến	(26/10/2018 đến 27/12/2018)	đúng dự kiến.
	3/1/2018)	21/12/2010)	
Chi phí cho	135.000.000 VNĐ	134.000.000	Du 1.000.000 VNĐ
dự án		VNÐ	

#### d) Đánh giá về nhân lực

- Các thành viên nhóm hoạt động chăm chỉ, và hoàn thành công việc tốt.
- Nhân lực còn hạn chế nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn được giao.
- Các thành viên đảm bảo làm việc theo đúng quy trình và thời gian đã giao.

#### 3.11.6 Ưu điểm của dự án

- Các thành viên có nhiệt huyết trong việc làm dự án.
- Sự lãnh đạo nhiệt tình của quản lý giúp cho dự án thành công như mong đợi.
- Các thành viên tuy ít kinh nghiệm làm việc nhóm nhưng vào dự án được vài tuần đầu và nhờ sự dẫn dắt của lãnh đạo nên kỹ năng làm việc cũng như lối tư duy logic được lên trình giúp cho các công tác làm việc nhanh và hiệu quả.
- Sự chịu khó làm việc với áp lực thời gian và môi trường của các thành viên trong tổ dự án cũng giúp dự án triển khai và kết thúc đúng tiến độ.

- Trong quá trình thi công không gặp những bất lợi lớn vì thế dự án được thành công như mong đợi.
- Sự hỗ trợ và thái độ chịu hợp tác nhiệt tình của khách hàng giúp cho việc xác định
   và thực hiện dự án thuận tiện hơn rất nhiều.

#### 3.11.7 Nhược điểm của dự án

- Các thành viên do mới làm dự án còn chưa có nhiều kinh nghiệm.
- Một số vấn đề khó cần trợ giúp từ công cụ tìm kiếm google.com.
- Dự án chưa phải lớn, chưa có áp lực nhiều.
- Các thành viên bận công việc hoặc học tập khác.

#### 3.11.8 Bài học kinh nghiệm

- Rút kinh nghiệm để tránh những rủi ro không đáng có trong dự án.
- Biết cách tính toán, quản lý thời gian, chi phí, phạm vi của dự án hiệu quả hơn.
- Người quản lý dự án sẽ quản lý sát sao hơn các nguồn nhân lực đang có.
- Cần có những yếu tố để khích lệ tinh thần làm việc của các thành viên hơn nữa.
- Chưa phát huy hết khả năng của các thành viên trong dự án, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên.
- Phân bổ đều số lượng công việc để các thành viên làm việc không bị áp lực quá mức.

#### **3.11.9** Kết luận

Sau một thời gian nhóm em bắt tay vào nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo *Huỳnh Đức Huy*, nhóm chúng em đã hoàn thành đề tài "Triển khai phần mềm quản lý quán cà phê Will Coffee". Qua đây, bản thân em cũng như các thành viên trong nhóm đã học hỏi được rất nhiều điều về công việc, cách thức tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích một vấn đề nào đó. Đặc biệt là đã giúp cho chúng em có khả năng làm việc theo nhóm tốt hơn.

Tuy nhiên trong quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống do thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên chắc chắn trong báo cáo

này không tránh khỏi thiếu sót và những chỗ xử lý vấn đề chưa được tối ưu. Chúng em rất mong nhận được những nhận xét, đánh giá từ phía Thầy về báo cáo của chúng em.

# 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Giáo trình quản lý dự án Thầy Nguyễn Đức Lưu
- [2]. A guide to the project managerment body of knowledge Pmbook guide fourth edition
- [3]. Quản lý dự án cntt- đại học quốc gia thành phố hồ chi minh
- [4]. Website google.com.vn.

# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc Lập - T	Cự Do -	Hạnh	Phúc
-------------	---------	------	------

TD IIA	\ T \	41 /	_	
TP. HCI	VI. ngav.	tháng.	nam	

# NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐỔ ÁN MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đó án: Dự án xây dựng hệ thông qua	an ly quan ca phe Will Coffee.
Nhóm SV thực hiện:	Cán bộ hướng dẫn:
1. Đinh Minh Chí – 15520063	Huỳnh Đức Huy
2. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh – 155201	196
Đánh giá báo cáo đồ án	
1. Về cuốn báo cáo:	
Số trang:	Số chương:
Số bảng số liệu:	Số hình vẽ:
Số tài liệu tham khảo:	Sản phẩm:
Một số nhận xét về hình thức cuốn báo c	
1. Về nội dung báo cáo:	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Về chương trình ứng dụng:	
4. Về thái độ làm việc của sinh viên:	
Đánh giá chung:	
Điểm từng sinh viên:	
1. Đinh Minh Chí – 1550063:/10.	
2. Dương Huỳnh Mỹ Hạnh – 15520196:	/10.
	Người nhận xét
	(Ký tên và ghi rõ họ tên

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
